



EXPEDIENTE
27/06/23

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

OFÍCIO Nº 331/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 19 de maio de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSVALDO CÉSAR DA SILVA
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 171/2023
Protocolo: 0005843/2023

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento 171/2023 de autoria dos Vereadores Pedro Américo de Almeida e Osvaldo César da Silva, encaminhar a documentação solicitada, referente a Escola Municipal Nilce Moreira.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,


Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

23-Jun-2023 14:47:06.618-1/2

 GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº: 241/2023	CI
		DATA: 16/05/2023	FL.:1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente	PARA: Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete <i>Gabinete do Prefeito</i>
--	--


ASSUNTO: Resposta ao requerimento nº 171/2023
--

Prezada,


Com sinceros e cordiais cumprimentos, valemo-nos do presente para apresentar as seguintes considerações das solicitações recebidas.

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Cláudio Quirino Custódio, em resposta ao ofício acima supracitado, declara que a empresa Sênior Engenharia Ltda está finalizando os últimos ajustes da planilha para empenho e instalação da Caixa D'água e readequação da parte inferior da tela. No fechamento da quadra a empresa já está ciente que precisa executar a abertura do acesso no alambrado para que os alunos possam ter um melhor acesso. Seguem em anexo a medição do fechamento da escola (que não está incluso o ajuste da parte inferior) e a medição do alambrado da quadra.

Desde já agradecemos.



Cláudio Quirino Custódio
Secretário de Obras e Meio Ambiente



Luísa Cássia da Silva



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	12/04/2023	
NOME DA OBRA:	FECHAMENTO LATERAL NILCE MOREIRA		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	SÊNIOR ENGENHARIA LTDA		DESC. SINAPI:	14,21%	
Nº CONTRATO:	056/2022		DESC. SEINFRA:	14,21%	
OBJETO:	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS				
Nº AE	924/2023		Nº NE:	2571/2023	
REFERÊNCIA:	2022/04_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2022/05_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	27/2023	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA),	1,0000	R\$ 18.782,7692	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA),	1,0000	R\$ 119.079,6573	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 137.862,43	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisa Silva Engenheira Civil		 Thalison Hugo Barla Fernandes Sênior Engenharia		 Daniele da Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Cláudio Quirino Custódio			



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME DA OBRA:		Niterói Moreira - Fechamento lateral									
SETOR RESPONSÁVEL:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Nº CONTRATO:		071/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 189/2021 - SÊNIOR ENGENHARIA - 056/2022									
OBJETO:		Fechamento lateral Niterói Moreira									
REFERÊNCIA:		2022/03 SETOR TESTE COM DESONERAÇÃO 2022/05 SINAPI MG DESONERADO									
Nº AE		024/2023		Nº NE 12571/2023							
		ORDEN DE SERVIÇO									
		27/2023									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM B.O.E E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
1	SINAPI	7762	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3 x 1 MM (10 BVG), MALHA 5 X 5 CM, h = 2 M	m²	607,50	507,50		R\$ 70,59	R\$ 36.026,05	507,50	100,00%
2	SINAPI	21148	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA Ø = 3,81 MM, SCHEDULE 40, 3,43 KG/M	m	494,40	494,40		R\$ 161,95	R\$ 80.070,24	494,40	100,00%
3	SENERA	ED-50895	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 x 1/2"	m²	26,00	26,00		R\$ 541,89	R\$ 14.089,21	26,00	100,00%
4	SINAPI	611018unio	SERRALHEIRO	h	64,00	64,00		R\$ 18,58	R\$ 1.189,26	64,00	100,00%
4	SINAPI	26228unio	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (2 ALUP)	h	128,00	128,00		R\$ 14,00	R\$ 1.792,12	128,00	100,00%
5	SENERA	ED-46222	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDO CERÂMICO LAMINADO, 18 FURTOS, ESP 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	18,00	18,00		R\$ 135,15	R\$ 2.432,76	18,00	100,00%
7	SENERA	ED-60731	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO	m²	36,00	36,00		R\$ 12,93	R\$ 465,43	36,00	100,00%
8	SENERA	ED-60781	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1,28 CIMENTO, CAL E AREIA, ESP 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	36,00	36,00		R\$ 30,67	R\$ 1.114,83	36,00	100,00%

Niterói
27/07/2023

Niterói

Niterói

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
3	SEINFRA	EO-59701	CÁPIA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE BASTELAMENTO E QUEIMA	m²	50,00	50,00			R\$ 1 17	R\$ 58,34	50,00	100,00%
10	SEINFRA	EU-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m³	0,20	0,20			R\$ 3 110,53	R\$ 622,11	0,20	100,00%
SUBTOTAL:									R\$ 137.862,43			
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:									R\$ 137.862,43			
PERCENTUAL EXECUTADO:									100,00%			
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:									R\$ 137.862,43			
SALDO									R\$			
FISCALIZAÇÃO:										RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS:										SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Lúcia Silva Engenheiro Civil										Thaíssch Hugo Faria Fernandes Sênior Engenheira		
Claudie Quinto Custódio										Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D		
Prof. Albano										07/03/2023		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPARO E REVESTIMENTO LATERAL NÍVELO MODELO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

02/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. / PERÍMETRO		LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)				(m²)	(m³)	(kg)	(kg/m³)	(km)	(unit)	(h)		
1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LUSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M														507,50	M²
	Fechamento lateral		250,00		2,03			507,50					1,00		507,5000	
2	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2", E = 3,91 MM, SCHEDULE 40, 5,43 KG/M														484,40	m
	Fechamento lateral		250,00		2,50								94,00		484,4000	
3	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"														26,00	m²
	Fechamento lateral		5,00		2,50			12,50					2,00		26,0000	
4	SERROALHEIRO														64,00	h
	Fechamento lateral		64,00										64,0000		64,0000	
5	AJUDANTE DE SERROALHEIRO (2 AJUD)														128,00	h
	Fechamento lateral												2,00	94,0000	128,0000	
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAIADO, 18 Furos, esp. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO														18,00	m²
	Fechamento lateral		45,00		0,40			18,00							18,0000	
7	CRÁFISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICAÇÃO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESPERDADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO														36,00	m²
	Fechamento lateral		45,00		0,40			18,00					2,00		36,0000	
8	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO														36,00	m²
	Fechamento lateral		45,00		0,40			18,00					2,00		36,0000	
9	CAPIXA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA														50,00	m²
	Fechamento lateral		50,00										1,00		50,0000	
10	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMADURA, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA														0,20	m³
	Fechamento lateral		0,1400	0,140				0,0392	0,0050				4,00		0,2000	




Imara Alves

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PLANILHA RESUMO DE 2ª MEDIÇÃO

RESPONSÁVEL:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	16/03/2023	
NOME DA OBRA:	QUADRA NILCE MOREIRA		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	SÊNIO ENGENHARIA LTDA		DESC. SINAPI:	14,21%	
Nº CONTRATO:	056/2022		DESC. SEINFRA:	14,21%	
OBJETO:	Execução Alamedado Quadra				
Nº AC	459/2023		Nº NE:	1148/2023	
REFERÊNCIA:	2022/06_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2022/05_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEN DE SERVIÇO	014/2023	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1.0000	R\$ 68.258.4283	R\$ 68.258.4283
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA)	1.0000	R\$ 391.7050	R\$ 391.7050
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$	68.650,13
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisa Silva Engenheira Civil		 Thalisson Hugo Faria Fernandes Sênior Engenharia		 Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 258.530/D	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS:		SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Cláudio Quirino Custódio.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
REPARO NA QUADRA DA ESCOLA NILCE MOREIRA
MEMORIA DE CALCULO DA MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. / PERIMETRO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO VÃO (m2)	AREA (m2)	VOLUME (m3)	PESO (kg)	DENSIDADE (kg/m3) (t/m3)	DMT (KM)	QUANTIDADE (unit)	HORA h	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")													139,01	m
	Longitudinal		95,90											95,90000	
	Transversal		43,11											43,11000	
2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM													23,00	mxmês
	QUADRA		45,00									1,00		23,00000	
3	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"													8,57	m2
	QUADRA			2,8900	3,00		8,67					1,00		8,67000	
4	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M														U
	QUADRA														
5	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)													10,00	U
	QUADRA											20,00		10,00000	
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA														m3
	PERFURAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS			5,0000								1,00		5,00000	

[Assinatura]
Luisa Silva



Relatório nº	1
Data do relatório	26/01/2023
Dia da semana	Quinta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	1 dias
Prazo a vencer	22 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira
Local	Bairro Morro da Miha
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete
Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)

Execução da base para fechamento Lateral.

Em Andamento


Galeria de Fotos (2)



[Assinatura]

Assinatura

Assinatura



Relatório n°	2
Data do relatório	27/01/2023
Dia da semana	Sexta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	2 dias
Prazo a vencer	21 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira
Local	Bairro Morro da Mina
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagarte
Responsável	Eng. Daniele Silva


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)

Execução base para fechamento Lateral,

Em Andamento

Galeria de Fotos (2)



Assinatura

Assinatura



Relatório n°	3
Data do relatório	30/01/2023
Dia da semana	Segunda-feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	5 dias
Prazo a vencer	18 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	Fechamento Lateral Milce Moreira		
Local	Bairro Morro da Mina		
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução base para fechamento Lateral,	Em Andamento
--	--------------

Galeria de Fotos (1)



Assinatura

Assinatura



Relatório nº	4
Data do relatório	31/01/2023
Dia da semana	Terça-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	6 dias
Prazo a vencer	17 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira		
Local	Bairro Morro da Mina		
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução base para fechamento Lateral.	Em Andamento
--	--------------

Galeria de Fotos (1)

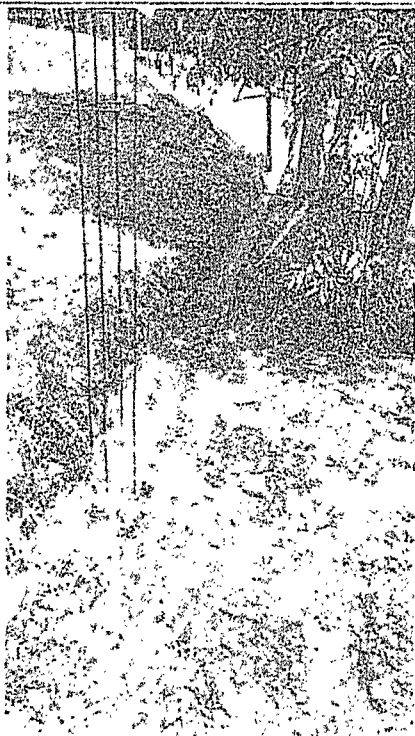

Assinatura

Assinatura



Relatório nº	5
Data do relatório	01/02/2023
Dia da semana	Quarta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	7 dias
Prazo a vencer	16 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Nilce Morgira		
Local	Bairro Morro da Mina		
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução para base fechamento Lateral.	Em Andamento
--	--------------

Galeria de Fotos (1)

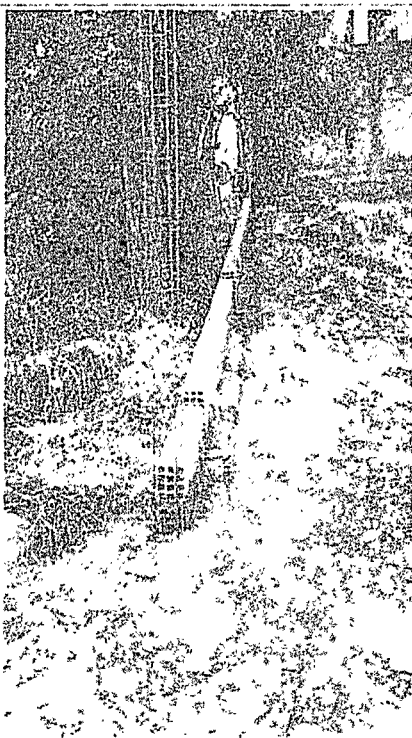

Assinatura

Assinatura



Relatório nº	6
Data do relatório	02/02/2023
Dia da semana	Quinta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	8 dias
Prazo a vencer	15 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira		
Local	Bairro Morro da Mina		
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução base para fechamento lateral	Em andamento
---------------------------------------	--------------

Galeria de Fotos (1)

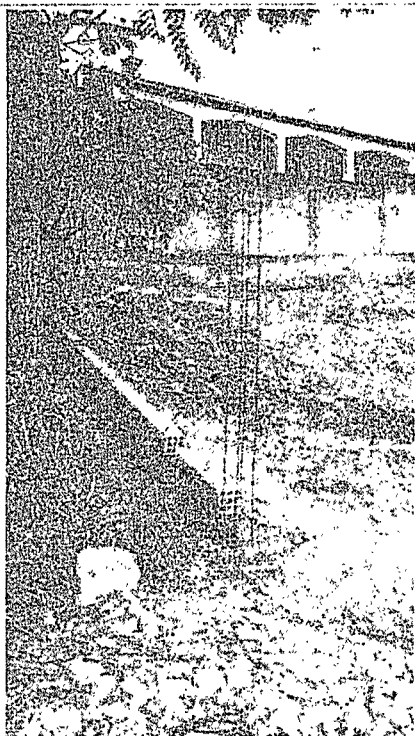

Assinatura

Assinatura.

		Relatório n°	7		
		Data do relatório	03/02/2023		
		Dia da semana	Sexta-Feira		
		Relatório Diário de Obra (RDO)			
Obra	Fachamento Lateral Nilce Moreira		Prazo contratual	23 dias	
Local	Bairro Morro da Mina		Prazo decorrido	9 dias	
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagatele	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo a vencer	14 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
Execução fechamento Lateral	Em Andamento

Galeria de Fotos (1)	
	



Assinatura

Assinatura

				Relatório nº	8
				Data do relatório	06/02/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	Fechamento Lateral Nilce Morêira			Prazo contratual	23 dias
Local	Bairro Morro da Mina			Prazo decorrido	12 dias
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo a vencer	11 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Execução fechamento Lateral,	Em Andamento

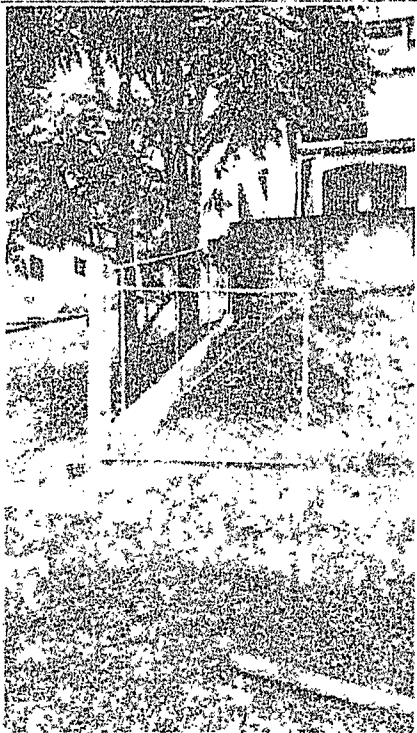Galeria de Fotos (1)	
	


Assinatura

Assinatura

		Relatório nº	9		
		Data do relatório	07/02/2023		
		Dia da semana	Terça-Feira		
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira		Contrato		
Local	Bairro Morro da Mina		Prazo contratual	23 dias	
Contratante	Prefeitura Congonhal	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo decorrido	13 dias
				Prazo a vencer	10 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Execução fechamento Lateral.	Em Andamento

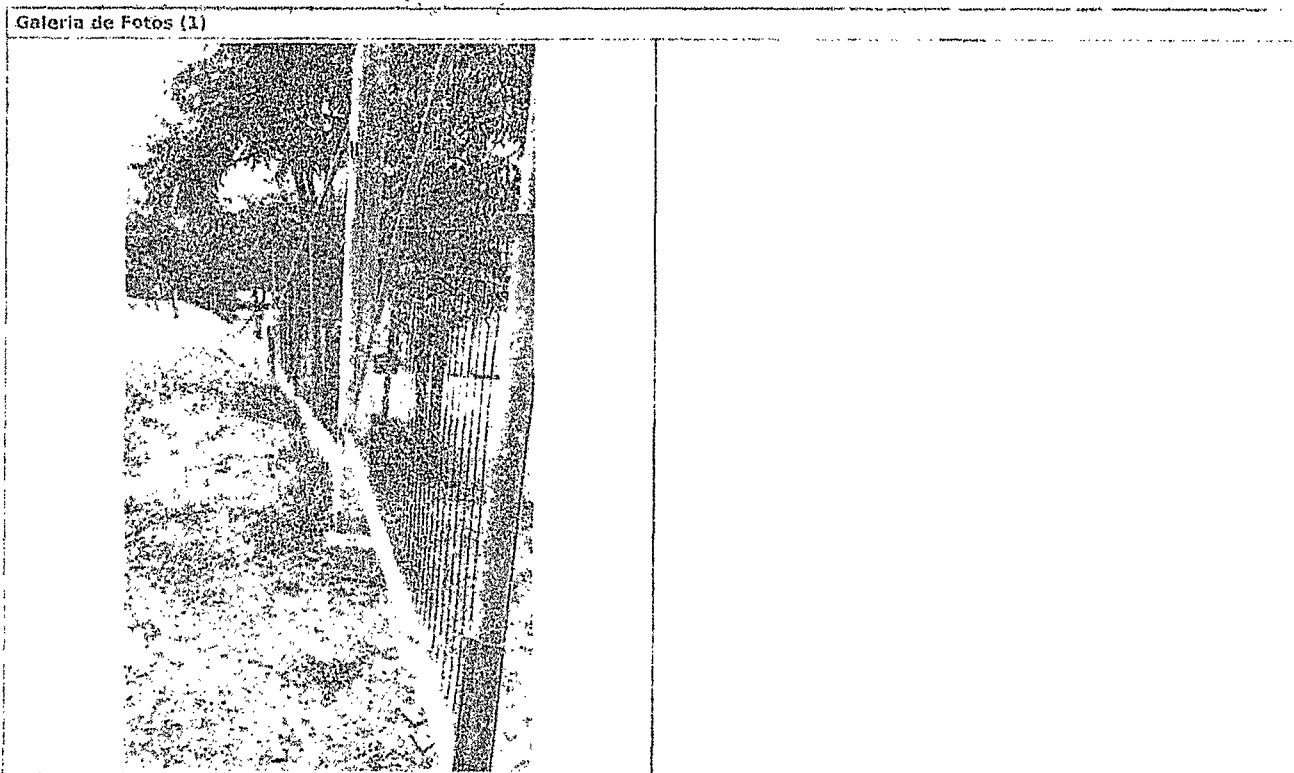


Assinatura

Assinatura

		Relatório nº	10		
		Data do relatório	08/02/2023		
		Dia da semana	Quarta-Feira		
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira		Contrato		
Local	Bairro Morro da Mina		Prazo contratual	23 dias	
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoa	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo decorrido	14 dias
				Prazo a vencer	9 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Atividades (1)	
Execução fechamento Lateral.	Em Andamento

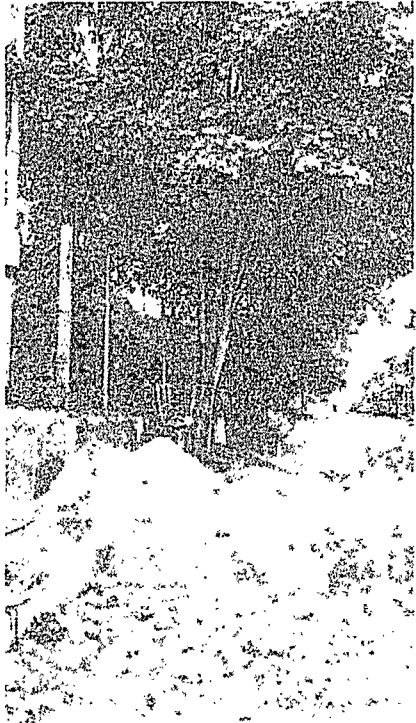Galeria de Fotos (1)	
	



Assinatura


Assinatura

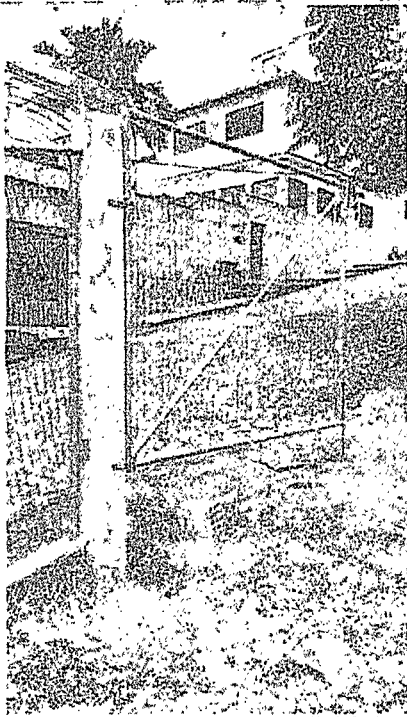

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura

		Relatório nº	11		
		Data do relatório	09/02/2023		
		Dia da semana	Quinta-Feira		
		Relatório Diário de Obra (RDO)			
Obra	Fechamento Lateral Nilcé Moreira		Contrato		
Local	Bairro Morro da Mina		Prazo contratual	23 dias	
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo decorrido	15 dias
				Prazo a vencer	8 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)
Execução fechamento Lateral, Em Andamento




Assinatura

Assinatura



Relatório nº	12
Data do relatório	10/02/2023
Dia da semana	Sexta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	16 dias
Prazo a vencer	7 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira			Prazo contratual	23 dias
Local	Barro Morro da Mina			Prazo decorrido	16 dias
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagarte	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo a vencer	7 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução fechamento Lateral.	Em Andamento
------------------------------	--------------

Galeria de Fotos (2)

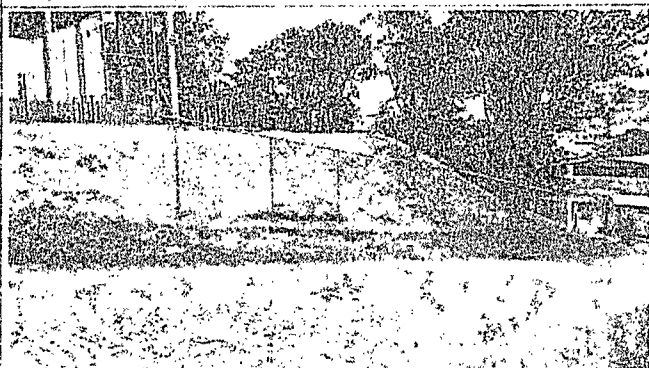

Assinatura

Assinatura



Relatório nº	13
Data do relatório	13/02/2023
Dia da semana	Segunda-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	19 dias
Prazo a vencer	4 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira
Local	Bairro Morro da Mina
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete
Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução fechamento Lateral.	Em Andamento
------------------------------	--------------

Galeria de Fotos (2)

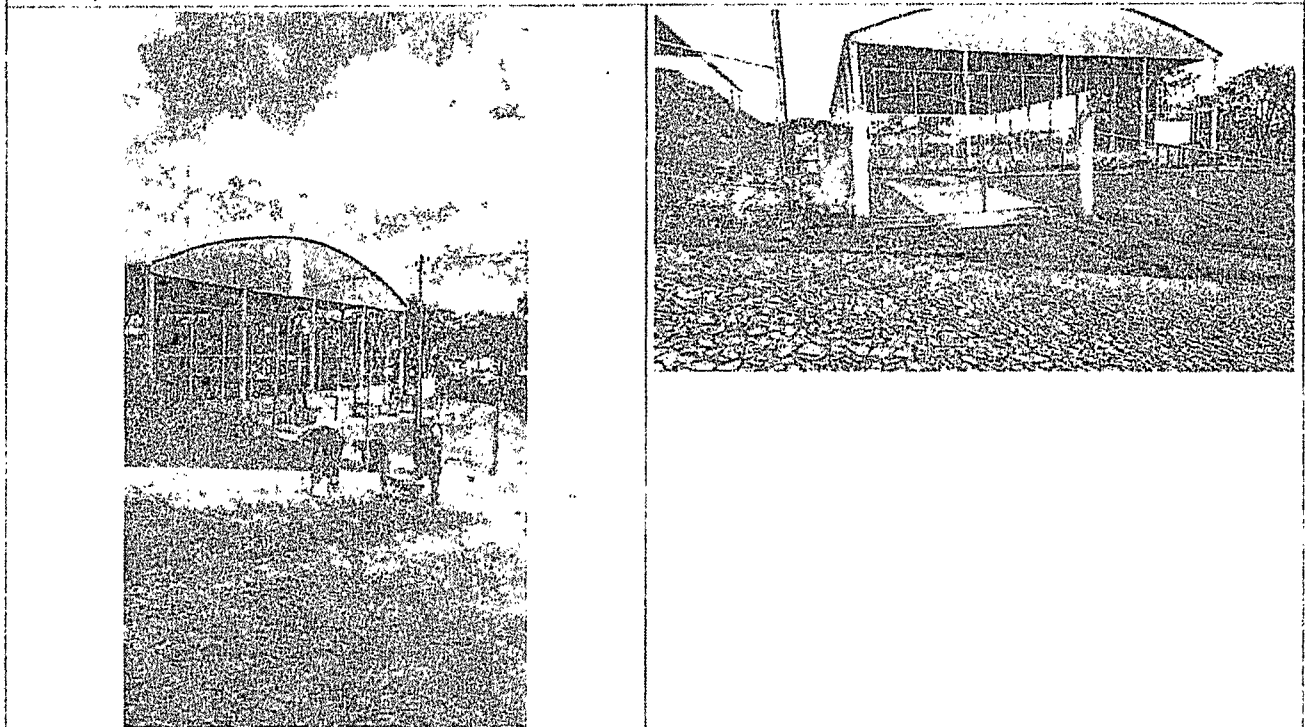

Assinatura

Assinatura



Relatório n°	14
Data do relatório	14/02/2023
Dia da semana	Terça-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira		Prazo contratual	23 dias	
Local	Bairro Morro da Mina		Prazo decorrido	20 dias	
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagarte	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo a vencer	3 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)


Execução fechamento Lateral.	Em Andamento
------------------------------	--------------

Galeria de Fotos (2)

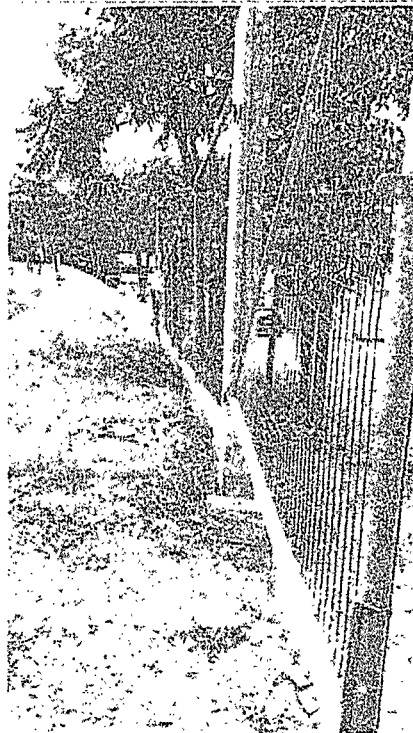


Assinatura

Assinatura

		Relatório n°	15		
		Data do relatório	15/02/2023		
		Dia da semana	Quarta-Feira		
		Contrato			
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Fechamento Lateral Nilce Moreira		Prazo contratual	23 dias	
Local	Bairro Morro da Mina		Prazo decorrido	21 dias	
Contratante	Prefeitura Conselheiro Lagoaete	Responsável	Eng. Daniele Silva	Prazo a vencer	2 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
Execução fechamento Lateral.	Em Andamento

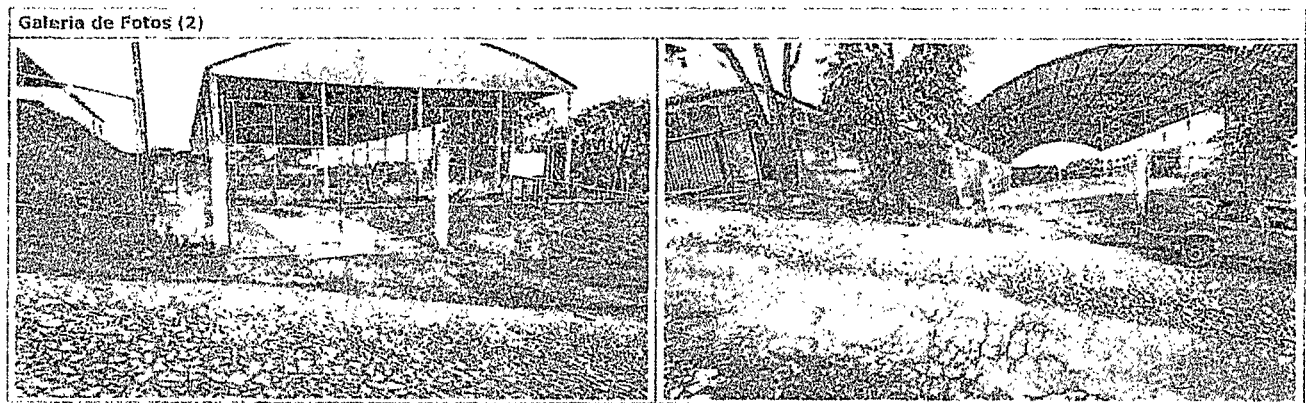


Assinatura

Assinatura



Relatório n°	16
Data do relatório	16/02/2023
Dia da semana	Quinta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	23 dias
Prazo decorrido	22 dias
Prazo a vencer	1 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)


Obra	Fechamento Lateral Níce Moreira
Local	Bairro Morro da Mina
Contratante	Prefeitura Conselheira Lagoaete
Responsável	Eng. Daniele Silva

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)

Execução fechamento lateral finalizado.	Em andamento
---	--------------

Galeria de Fotos (6)

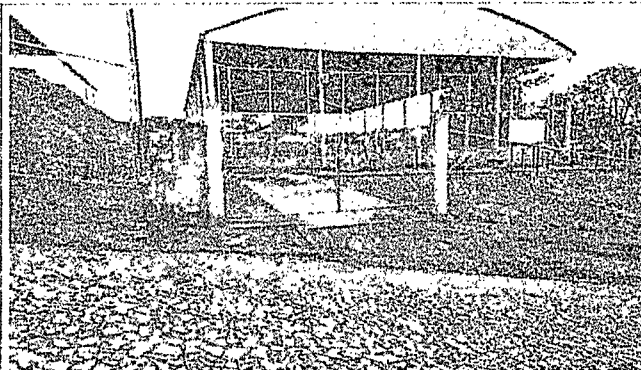







Relatório Diário de Obra (RDO)		Relatório nº	4
		Data do relatório	06/02/2023
		Dia da semana	Segunda-Feira
		Contrato	
		Prazo contratual	44 dias
		Prazo decorrido	22 dias
		Prazo a vencer	22 dias
Obra	QUADRA ESPORTIVA NILCE MOREIRA		
Local	PISCINA NILCE MOREIRA		
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIÊTE	Responsável	DANIELE SILVA, T-4 ASSOCIADO FERNANDES


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☼ Claro	Parcial
Tarde	☼ Claro	Parcial

Mão de Obra (8)		Mão de Obra Direta (5)
Ajudante 3	Pedreiro 2	
Engenheiro 1	Serralheiro 2	Mão de Obra Indireta (3)



Atividades (1)	100% - Concluída
Quadra Finalizada	

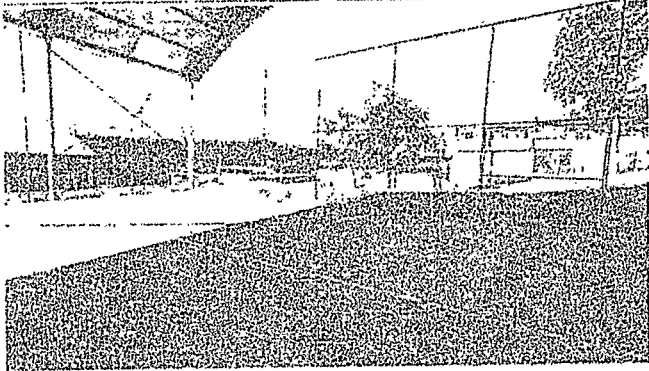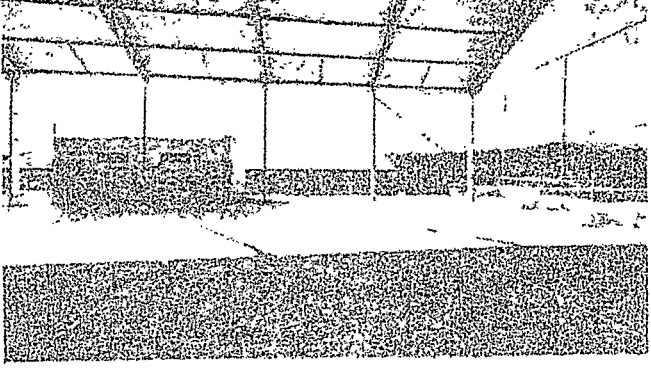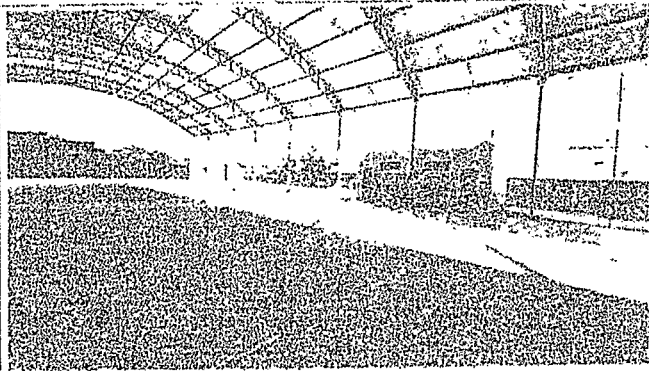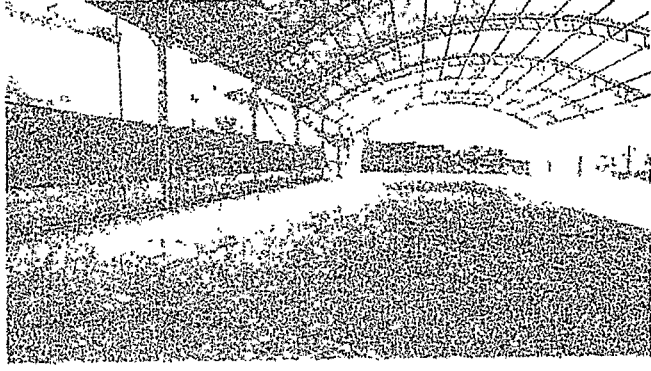Galeria de Fotos (10)	
	
Quadra	Quadra
	
Quadra	Quadra


Handwritten signatures and initials.

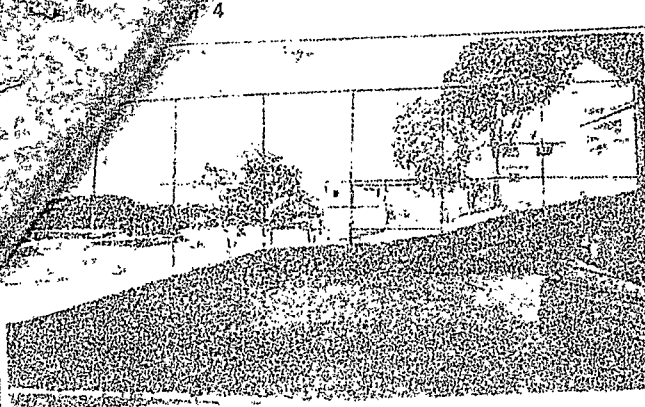


Quadra

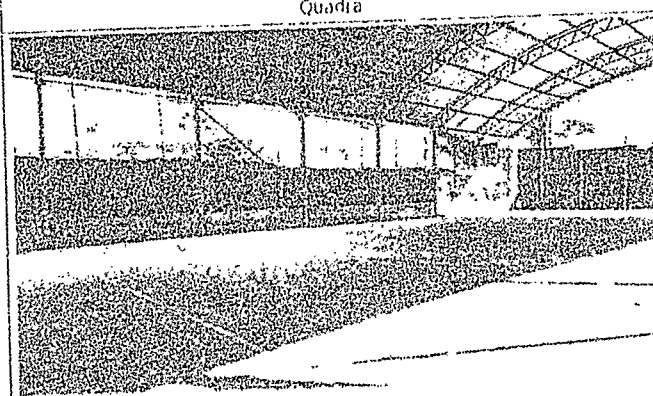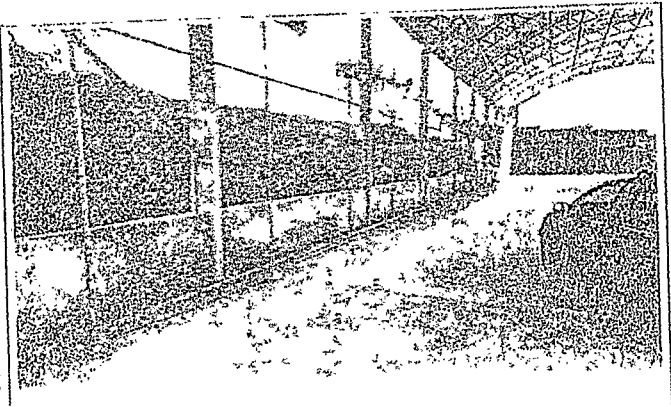


Quadra

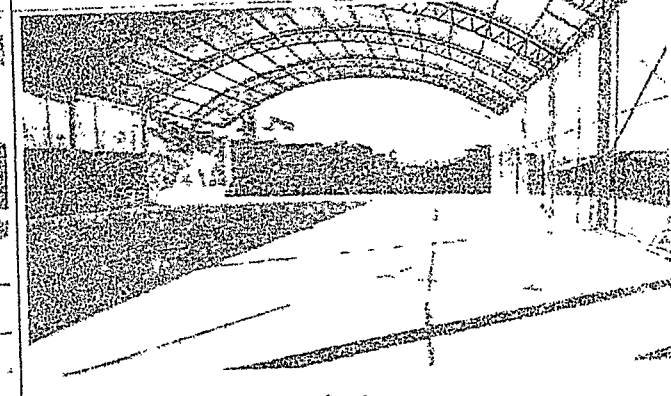



Quadra

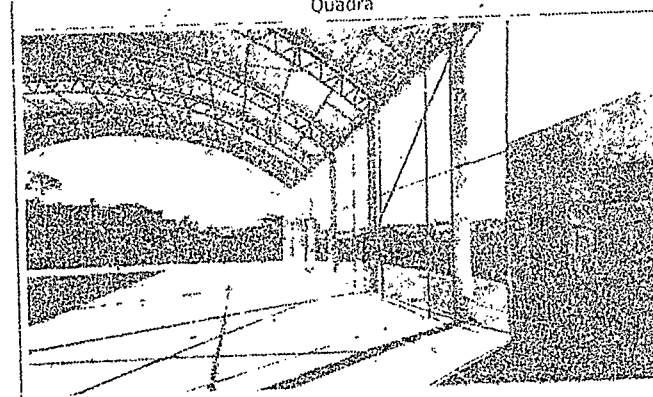

Quadra

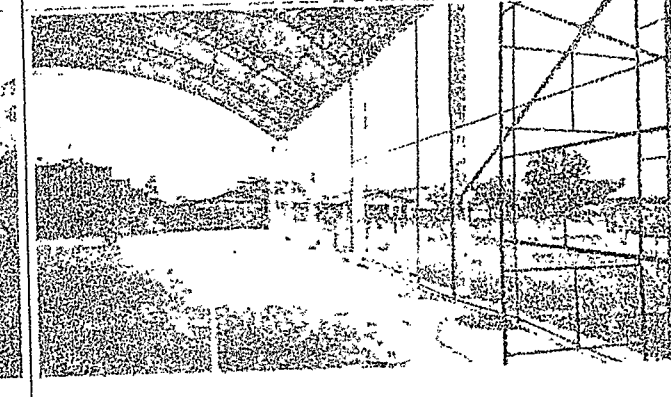


Assinatura


Assinatura
