



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 174/2024

CI

DATA: 10/04/2023

FL.:1/10

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ASSUNTO: Resposta ao requerimento nº 61/2024

Prezados,

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Adjunto de Obras e Meio Ambiente Kildare Bittencourt Dutra, em resposta ao requerimento supracitado, apresenta as medições, onde constam os relatórios de obra, número de ordens de serviço e empenho. As medições originais e completas foram entregues na secretaria responsável.

Apresenta também o relatório entregue no dia 10 de outubro de 2023, em resposta ao requerimento nº496/2023.

Gratos pela atenção,

Secretaria de Obras e Meio Ambiente

-10-Abr-2024-16:45-051974-1/2

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG



**Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota	202200000000069
Emissão	15/12/2022 13:28:41
Código de Verificação	B7DB-EDCA

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: SENIOR ENGENHARIA LTDA
 CPF/CNPJ: 41.751.431/0001-77
 Endereço: BARBARA DA FONSECA 162 APT 202 - CENTRO - CEP: 35498000
 Município: 3135407 - JECEABA/MG
 Inscrição Municipal: 0000000000000004395
 Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
 CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
 Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA 10 - CENTRO - CEP: 36400001
 Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
 E-mail:
 CEI:
 Inscrição Municipal:
 Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

CÓPIA

REFORMA DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTRO

QUADRA JK.

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município

Data: _____/_____/20__

Luisa Cassia de Silva - 46.16.670.938
 Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Este é a exatidão da presente Nota Fiscal que está em termos de ser paga

Dotação Orçamentária: _____
 Atribuição: _____

Cons. Lafaiete de _____ de 20__
Alcides 55541
 Secretária Municipal de Obras e Meio Ambiente

Dados Bancários
 Agência: 0179
 C/C: 61165-9
 Scredit

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)
 CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	18.071,86	Deduções	0,00	PIS / PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00
CSLL	0,00	Base de Cálculo	18.071,86	Aliquota	0,00	Desc. Incondicionado	0,00	Desc. Condicionado	0,00	Outras Retenções	0,00
ICMS	0,00	IPI	0,00	IOF	0,00	CIDE	0,00	ISS Retido	0,00	Valor Líquido NFS-e	18.071,86
Exigibilidade do ISS	02 - Não Incidência									Valor de ISS	0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(0,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		DATA:	14/12/2022	
NOME DA OBRA:	QUADRA BAIRRO JK		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	SÊNIOR ENGENHARIA LTDA		DESC. SINAPI:	14,21%	
Nº CONTRATO:	056/2022		DESC. SEINFRA:	14,21%	
OBJETO:	Reparo alambrado e pintura na quadra de esportes do bairro JK				
Nº AE	3447/2022		Nº NE:	8130/2022	
REFERÊNCIA:	2022/06_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2022/05_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEN DE SERVIÇO	69/2022	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS-SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 5.088,07	R\$ 5.088,07
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 12.983,79	R\$ 12.983,79
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$	18.071,86
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
 Luisa Silva Engenheira Civil		 Thalisson Hugo Faria Fernandes Sênior Engenheira	 Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D		
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS:	SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:		
		 Cláudio Quirino Custódio	 Prof. Albano Tibúrcio		



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME DA OBRA: QUINDÁ JK

SETOR RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Nº CONTRATO: 7/1/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 189/2021 - SÊNIOR ENGENHEIRA - 056/2022

OBJETO: Reparo alvenaria e pintura na quadra de esportes do bairro JK

REFERÊNCIA: 2022/03_SINAPI_TESTE_COM_DESONERAÇÃO
2022/05_SINAPI_MG_DESONERAÇÃO

Nº AE: 3407/2022

Nº ME: 6130/2022

ORDEN DE SERVIÇO

69/2022

ITEM	REP	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
						1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO				
1	SEINFRA	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REPOZIÇÃO DE TINTA	m2	128,00	0,00			RS 2,86	RS 0,00	0,00	0,00%
2	SEINFRA	ED-9904	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMEIR EPOXI	m2	375,00	0,00			RS 46,19	RS 0,00	0,00	0,00%
3	SEINFRA	ED-50499	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃO, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	50,00	0,00			RS 18,55	RS 0,00	0,00	0,00%
4	SEINFRA	ED-13285	CAMADA DE REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	375,00	0,00			RS 29,21	RS 0,00	0,00	0,00%
5	SINAPI	6110nsuno	SERRALHEIRO	h	80,00	80,00			RS 18,58	RS 1.486,45	80,00	100,00%
6	SINAPI	252nsuno	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (2 AJUD)	h	160,00	160,00			RS 14,00	RS 2.240,00	160,00	100,00%
7	SINAPI	11902nsuno	ELETROBO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	13,50	13,50			RS 66,75	RS 901,12	13,50	100,00%
8	SINAPI	44455nsuno	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 108 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	u	5,00	5,00			RS 39,17	RS 195,85	5,00	100,00%
9	SINAPI	7158nsuno	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWC), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	130,00	86,50			RS 45,37	RS 3.652,38	80,50	61,92%
10	SEINFRA	ED-51019	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 78 X 18 X 3M	U	90,00	90,00			RS 27,99	RS 2.519,08	90,00	100,00%
11	SINAPI	90021013nsuno	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (27), E = 3,00 MM, 4,40' M	M	50,00	50,00			RS 90,16	RS 4.507,96	50,00	100,00%
12	SEINFRA	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	45,00	45,00			RS 8,42	RS 378,69	45,00	100,00%
13	SEINFRA	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODIZOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mmls	45,00	45,00			RS 21,61	RS 972,24	45,00	100,00%
14	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	128,00	0,00			RS 30,97	RS 0,00	0,00	0,00%
15	SEINFRA	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO	m2	128,00	0,00			RS 11,48	RS 0,00	0,00	0,00%

Luana Silva

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	MEDIÇÕES			VALOR UNITARIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
						1ª MEDIÇÃO PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO PERÍODO:				
16	SENFRA	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRAO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (80X210CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG-12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	1,00	1,00			R\$ 1.218,06	R\$ 1.218,06	1,00	100,00%
17	SENFRA	ED-30451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃO, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m2	128,00	0,00			R\$ 14,07	R\$ 0,00	0,00	0,00%
18	SENFRA	ED-30491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSSO	m2	182,00	0,00			R\$ 31,79	R\$ 0,00	0,00	0,00%
									SUBTOTAL	R\$ 18.071,86		
									TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 18.071,86		
									PERCENTUAL EXECUTADO:	29,03%		
									TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO	R\$ 62.246,19		
									SALDO TOTAL	R\$ 44.174,33		
FISCALIZAÇÃO:				CONTRATADA:				RESPONSÁVEL TÉCNICA:				
Luisa Silva Engenheira Civil SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS:				Thaisson Faria Fernandes Sênior Engenheira SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Daniela de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D 1412/2022				
Cláudio Quinto Custódio				Prof. Albano Tiburcio								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

REPARO NA QUADRA DO JK
MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

14/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP J	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)												
1	LIXAMENTO MÃNUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA		50,00				40,00					2,00		80,0000	m ²
			30,00				24,00					2,00		48,0000	
2	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPOXI		25,00	15,0000	50,00		375,00							375,0000	m ²
3	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM											1,00		50,0000	m
4	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP: 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO														m ²
5	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE		25,00	15,0000	0,05		375,00							375,0000	h
6	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (2 AJUD)											1,00	80,0000	160,00	h
7	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM														kg
8	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 "														u
	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE						5,00							5,00	u

[Handwritten signature]

Luiza Sousa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

				Relatório n°	2
				Data do relatório	06/12/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Quadra JK			Contrato	
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete			Prazo contratual	58 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Daniela Silva / Thalisson Fernandes	Prazo decorrido	2 dias
				Prazo a vencer	56 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável


Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1					Mão de Obra Indireta (3)

Equipamentos (0)





Atividades (1)
Reparo tela de alambrado
Concluída

Ocorrências (0)


Comentários (0)

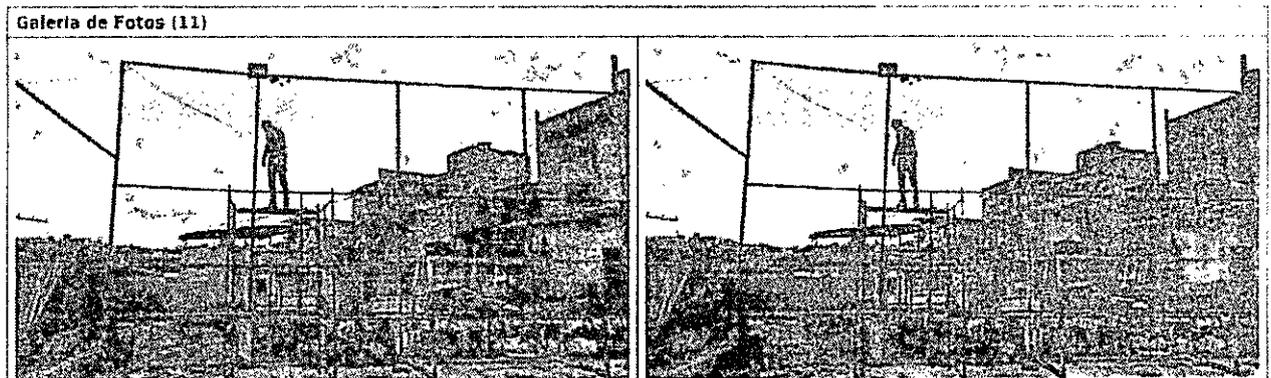


[Handwritten signature]

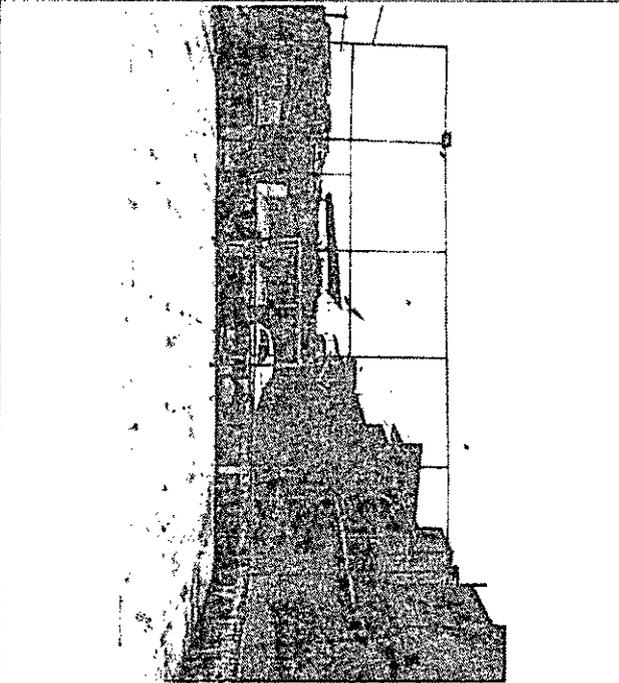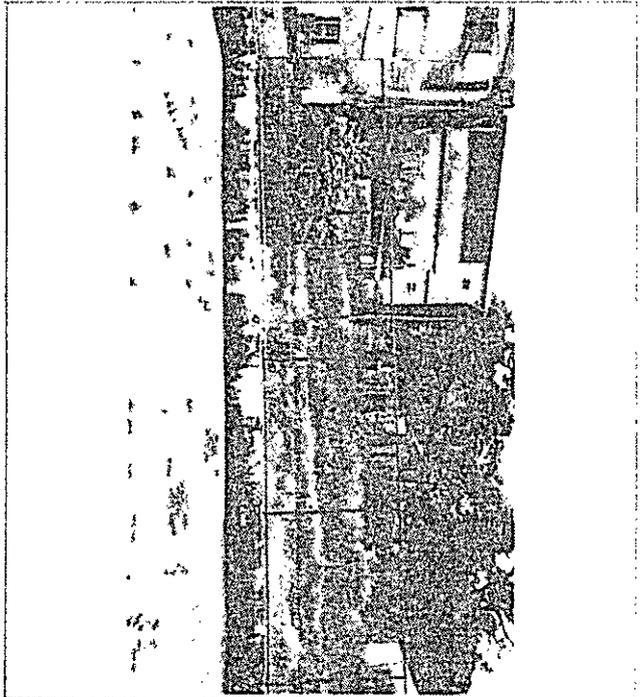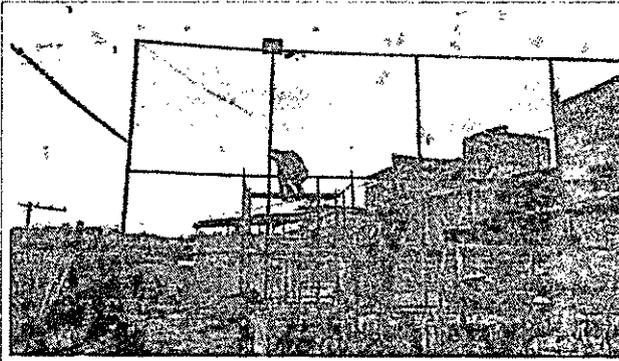

[Handwritten signature]

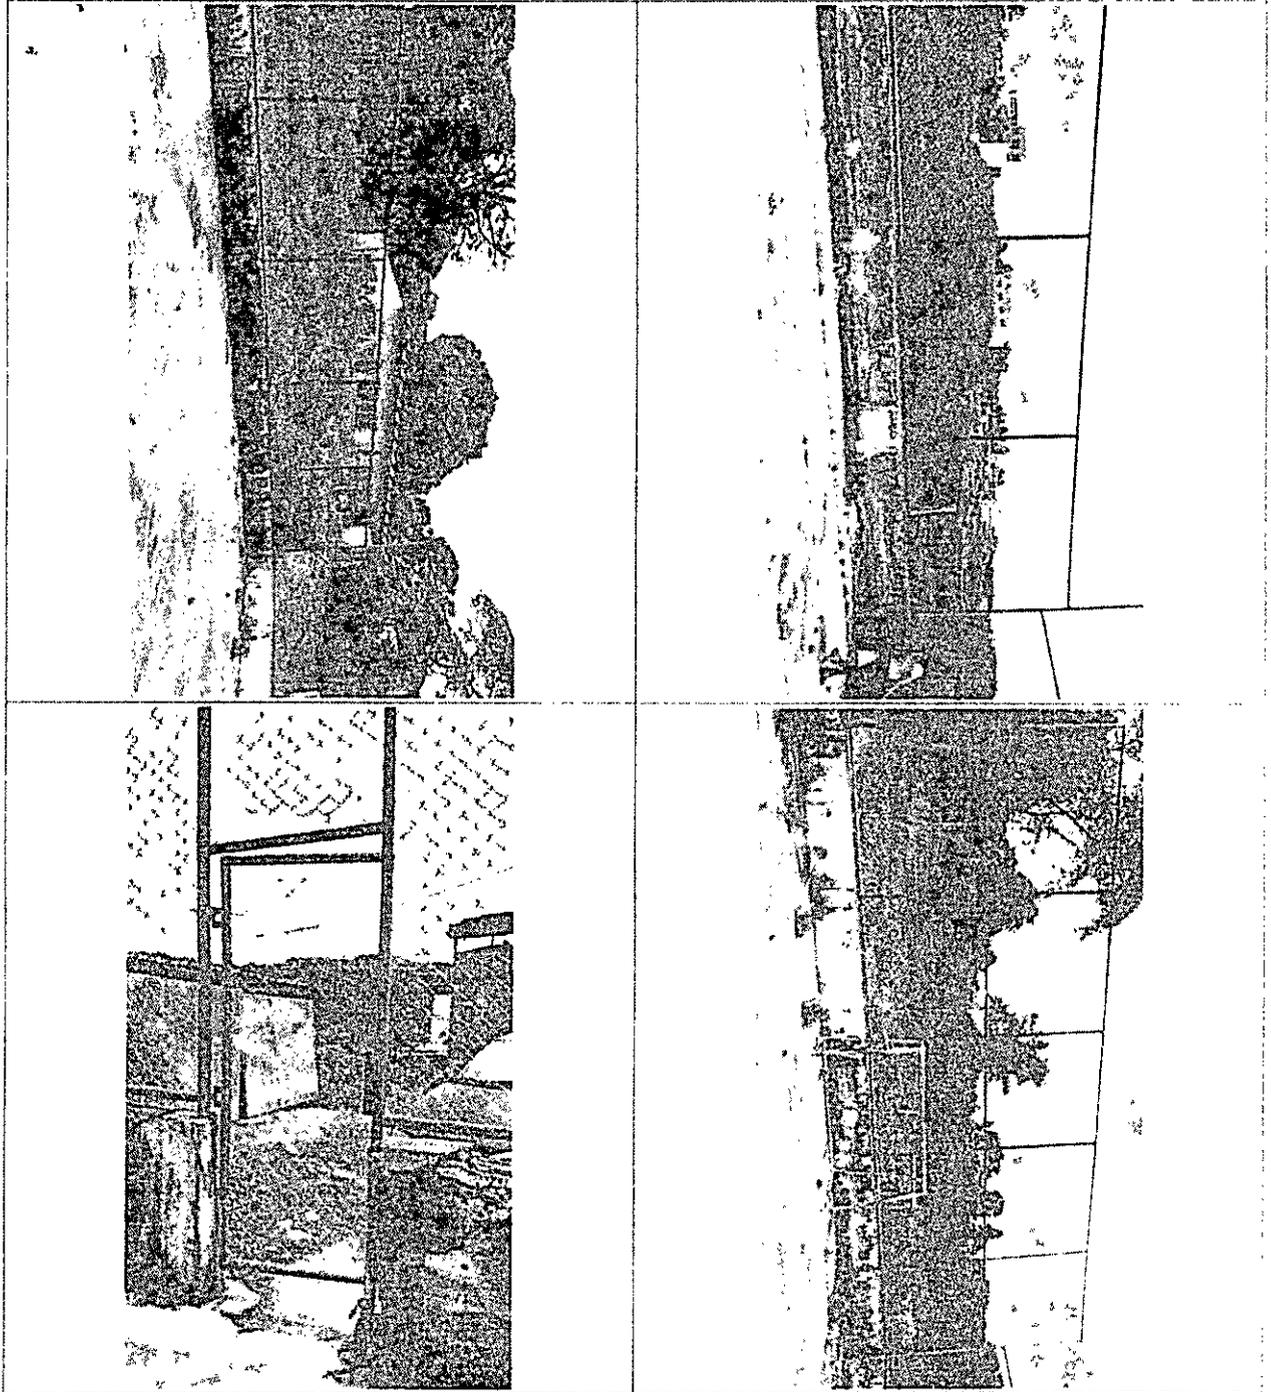

[Handwritten signature]

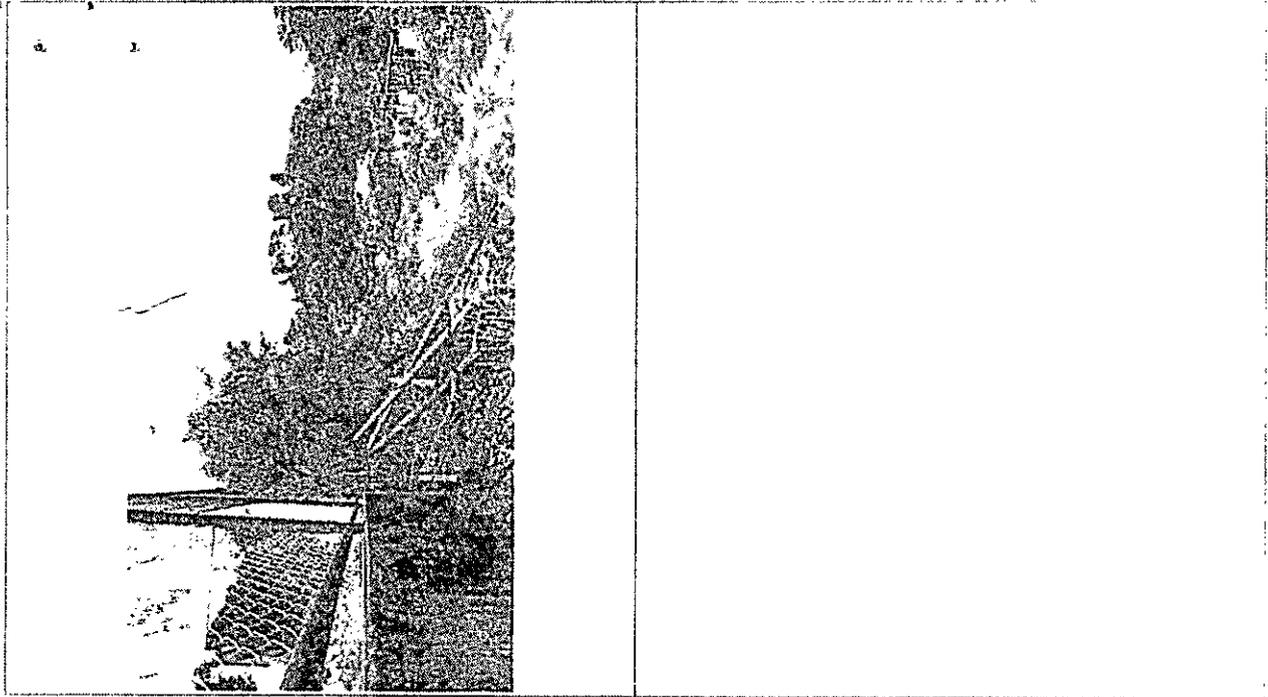

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura



ORDEM DE SERVIÇO Nº 69/2022

Solicitação de fornecimento: 3447/2022

Nota de empenho: 8130/2022

CÓPIA

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 19.718.360/0001-51, autoriza à partir desta data, a empresa SÊNIOR ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Bárbara da Fonseca, nº 162, Centro, na cidade de Jeceaba/MG, CEP 35.498-000, Tel. (31) 98518-0219 ou 99999-2850, e-mail senioreng.civil@gmail.com, inscrita no CNPJ nº 41.751.431/0001-77, celebrado entre as partes através do Processo Licitatório 189/2021, Concorrência Pública 006/2021, a dar início aos serviços, objeto do contrato acima, referente à adequação e reparos na Quadra Esportiva localizada no JK, neste município. O prazo para término dos serviços é até dia 31/01/2023. Em anexo cópias da planilha orçamentária junto a memória de cálculo.

Conselheiro Lafaiete - MG, 06 de dezembro de 2022.

Cláudio Quirino Custódio
Secretário Municipal de Obras

Luísa Silva
Engenheira Civil

Albano Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação e Esporte

Ciente,

SÊNIOR ENGENHARIA LTDA.



**Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota	2023000000000001
Emissão	10/01/2023 12:52:46
Código de Verificação	3614-6061

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **SENIOR ENGENHARIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **41.751.431/0001-77**
 Endereço: **BARBARA DA FONSECA 162 APT 202 - CENTRO - CEP: 35498000**
 Município: **3135407 - JECEABA/MG**
 Inscrição Municipal: **0000000000000004395**
 Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
 CPF/CNPJ: **19.718.360/0001-51**
 Endereço: **AV PREF MARIO PEREIRA 10 - CENTRO - CEP: 36400001**
 Município: **3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG**
 E-mail:
 CEI:
 Inscrição Municipal:
 Inscrição Estadual: **Isento**

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PORCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE – DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS – DESONERADA).

REFORMA DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTRO

QUADRA ESPORTIVA JK

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município

Data: _____/_____/_____

Rosa Vinícius Silva
Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

CÓPIA

Atesto a exatidão da presente Nota Fiscal que está em termos de ser paga

Dotação Orçamentária _____

Atividade _____

Cont. L. Trib. _____ + 30

Roberto 93547

Secretário Municipal de Finanças e Administração

Dados Bancários
 Agência: 0179
 C/C: 61165-9
 Sicredi

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)
 CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
29.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	29.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,72
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(0,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





PLANILHA RESUMO DE 2ª MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		DATA:	28/12/2022	
NOME DA OBRA:	QUADRA BAIRRO JK		BDI:	25,92%	
CONTRATADA:	SÊNIOR ENGENHARIA LTDA		DESC. SINAPI:	14,21%	
Nº CONTRATO:	056/2022		DESC. SEINFRA:	14,21%	
OBJETO:	Reparo alamedado e pintura na quadra de esportes do bairro JK				
Nº AE	3447/2022		Nº NE:	8130/2022	
REFERÊNCIA:	2022/06_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2022/05_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	69/2022	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 29.819,72	R\$ 29.819,72
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$	29.819,72
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
 Lulsa Silva Engenheira Civil		 Thalisson Hugo Faria Fernandes Sênior Engenharia	 Danilo de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D		
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS:	SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:		
		 Cláudio Quirino Custódio	 Prof. Albano Tibúrcio		



PLANILHA DE 2ª MEDIÇÃO

NOME DA OBRA:	QUADRA JK
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº CONTRATO:	71/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 189/2021 - SENIOR ENGENHEIRA - 056/2022
OBJETO:	Reparo alvenaria e pintura na quadra de esportes do bairro JK
REFERÊNCIA:	2022/03_STOP_LISTE_COM_RESONÂNCIA 2022/05_SINAPI_MG_DESONERADO
Nº AE	3447/2022
Nº NF	8130/2022
ORDEN DE SERVIÇO	69/2022



ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM IBI E DESCONTO	VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
						1ª MEDIÇÃO PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO PERÍODO:				
1	SEINFRA	ED-60605	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	128,00	0,00	128,00		R\$ 2,66	R\$ 340,15	128,00	100,00%
2	SEINFRA	ED-9834	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOXI	m2	375,00	0,00	350,00		R\$ 46,19	R\$ 16.167,31	350,00	93,33%
3	SEINFRA	ED-60690	PINTURA EPOXI EM FAXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMAOS, FAXA COM LARGURA DE 5 CM	m	50,00	0,00	50,00		R\$ 18,55	R\$ 927,41	50,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-13286	CANADA DE REGULIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 19MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO	m2	375,00	0,00	0,00		R\$ 29,21	R\$ 0,00	0,00	0,00%
5	SINAPI	6110Insumo	SERRALHEIRO	h	80,00		80,00		R\$ 18,58	R\$ 0,00	80,00	100,00%
6	SINAPI	252Insumo	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (2 AJUD)	h	160,00		160,00		R\$ 14,00	R\$ 0,00	160,00	100,00%
7	SINAPI	11002Insumo	ELETRODO REVESTIDO AVS - E9013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	13,50	13,50	0,00		R\$ 66,75	R\$ 0,00	13,50	100,00%
8	SINAPI	44483Insumo	DISCO DE CORTI PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 108 X 34" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	u	5,00	5,00	0,00		R\$ 39,17	R\$ 0,00	5,00	100,00%
9	SINAPI	7158Insumo	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	130,00	80,50	0,00		R\$ 45,37	R\$ 0,00	80,50	61,92%
10	SEINFRA	ED-51019	BARRA CHATA DE ALUMINIO 78" X 108" X 3M	U	90,00	90,00	0,00		R\$ 27,99	R\$ 0,00	90,00	100,00%
11	SINAPI	0002101Insumo	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2", E = 3,00 MM, 4,40" M	M	50,00	50,00	0,00		R\$ 90,16	R\$ 0,00	50,00	100,00%
12	SEINFRA	ED-9077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	45,00	45,00	0,00		R\$ 8,42	R\$ 0,00	45,00	100,00%
13	SEINFRA	ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mmts	45,00	45,00	0,00		R\$ 21,61	R\$ 0,00	45,00	100,00%
14	SEINFRA	ED-60767	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECANICO	m2	128,00	0,00	128,00		R\$ 30,97	R\$ 3.964,33	128,00	100,00%
15	SEINFRA	ED-60726	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENICILA, PREPARO MECANICO	m2	128,00	0,00	128,00		R\$ 11,48	R\$ 1.469,95	128,00	100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO				
16	SEINFRA	ED-26409	PORTA PARA ALAMBRAO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, ENTELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVAMENTE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	1,00	1,00	0,00	R\$ 1.218,06	R\$ 0,00	1,00	100,00%
17	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDES, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/COORIDA (PVA)	m2	128,00	0,00	128,00	R\$ 14,07	R\$ 1.800,33	128,00	100,00%
18	SEINFRA	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADROS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	162,00	0,00	162,00	R\$ 31,79	R\$ 5.160,35	162,00	100,00%
SUBTOTAL:								R\$ 29.819,72			
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:								R\$ 29.819,72			
PERCENTUAL EXECUTADO:								76,94%			
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO								R\$ 62.246,19			
SALDO SETOP								R\$ 12.108,75			
SALDO SINAPI								R\$ 2.245,87			
SALDO TOTAL								R\$ 14.354,61			
RESPONSÁVEL TÉCNICA:											
FISCALIZAÇÃO:				CONTRATADA:							
 Lúcia Silva Engenheira Civil SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS:				 Thaisson Haddad Faria Fernandes Snyder Engenheira SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				 Dantão de Oliveira Silva Eng. Civil / CREM: 258530/D 23/12/2022			
 Claudio Quirino Custódio				Prof. Albano Tiburcio							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
REPARO NA QUADRA DO JK
MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

28/12/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. / PERÍMETRO		LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)												
1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA		50,00			0,80		40,00					2,00		80,0000	m ²
			30,00			0,80		24,00						2,00		48,0000
2	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPOXI.		25,00		14,0000			350,00							350,00	m ²
																350,0000
3	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS; FAIXA COM LARGURA DE 6 CM												1,00	80,0000	50,00	m
	ALAMBRAO SUPERIOR LATERAL				50,00										90,0000	
4	CAMADA DE REGULAGEM COM ARGAMASSA, TRACO 13 (CEMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO														350,00	m ²
	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE		25,00		14,0000			350,00							350,0000	
5	SERRALHEIRO												1,00	80,0000		h
	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE															
6	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (2 AJUD)															h
	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE									180,0000						
7	ELETRODO REVESTIDO AWS, E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM												5,00			kg
	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE															
8	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)							5,00								u
	REPARO ALAMBRAO EXISTENTE															

Luiza Silva

				Relatório n°	6
				Data do relatório	28/12/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Quadra JK			Prazo contratual	58 dias
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete			Prazo decorrido	24 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Daniele Silva / Thalisson Fernandes	Prazo a vencer	34 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável


Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheira 1					Mão de Obra Indireta (3)

Equipamentos (0)


Atividades (3)	
Reparo quadra Pintura portão e alambrado quadra, Reboco interno e externo	55% - Em Andamento
Primeira demão tinta. Continuação reboco	65% - Em Andamento
Quadra finalizada	100% - Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

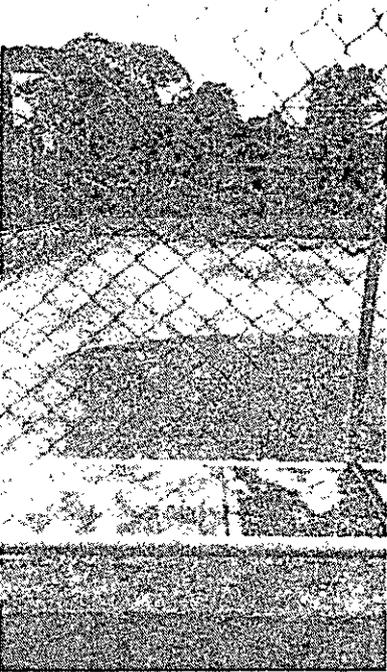Galeria de Fotos (4)	
	



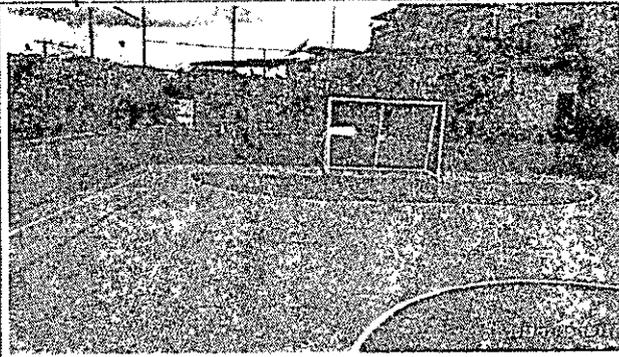

Assinatura



Assinatura

			Relatório n°	5	
			Data do relatório	27/12/2022	
			Dia da semana	Terça-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	Quadra JK			Prazo contratual	58 dias
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete			Prazo decorrido	23 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Daniele Silva / Thalisson Fernandes	Prazo a vencer	35 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☼ Claro	Praticável
Tarde	☼ Claro	Praticável



Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1					Mão de Obra Indireta (3)

Equipamentos (0)


Atividades (2)	
Reparo quadra Pintura portão e alambrado quadra. Reboco interno e externo	55% - Em Andamento
Primeira demão tinta. Continuação reboco	65% - Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

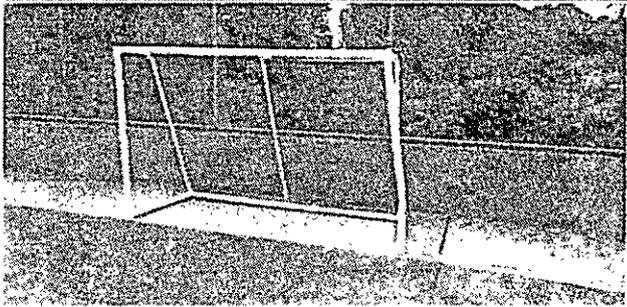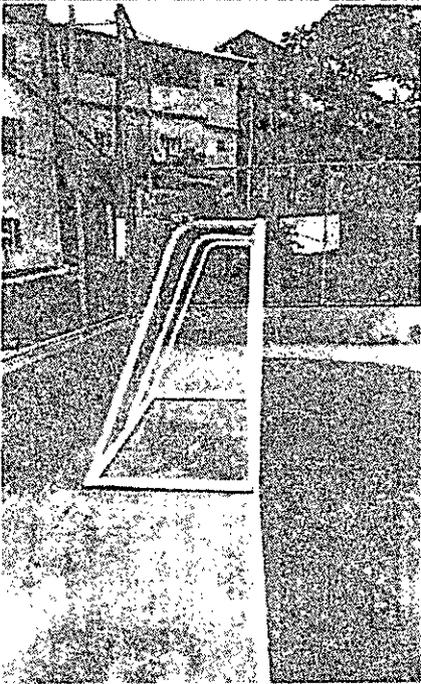Galeria de Fotos (3)	
	

Handwritten signature

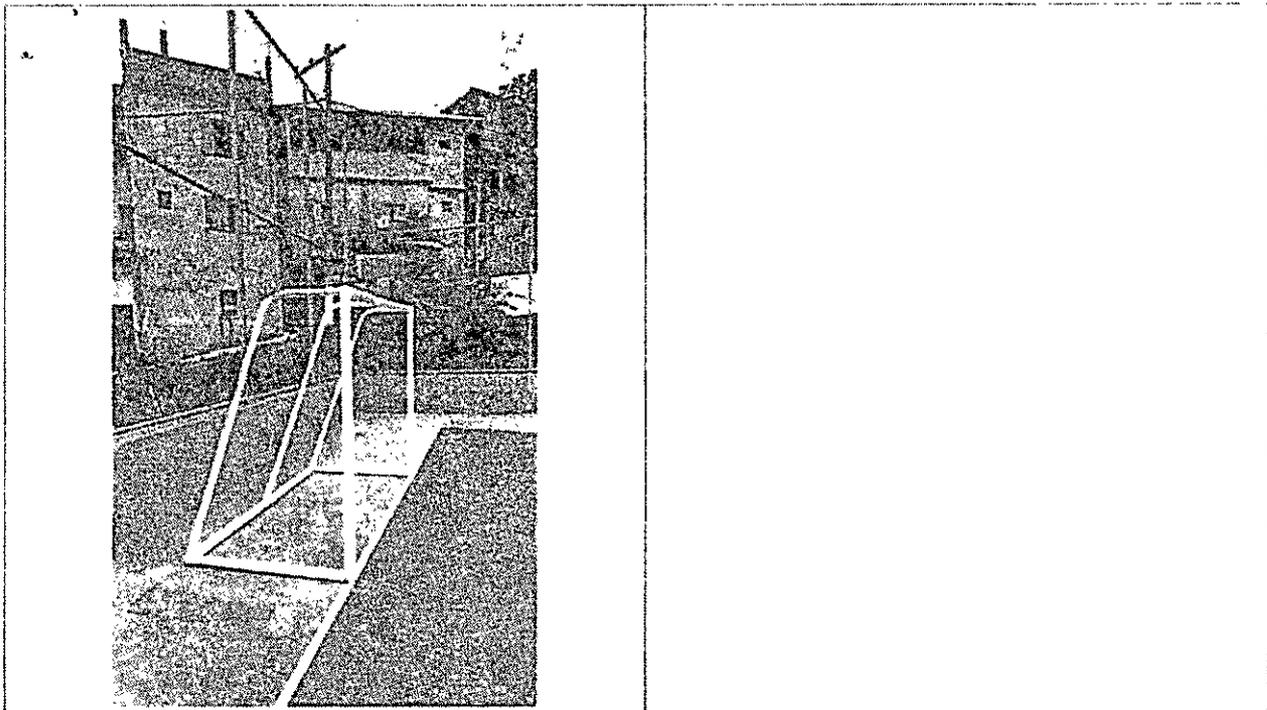

Assinatura



Assinatura

			Relatório n°	4	
			Data do relatório	26/12/2022	
			Dia da semana	Segunda-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Quadra JK		Contrato		
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete		Prazo contratual	58 dias	
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Daniele Silva / Thalison Fernandes	Prazo decorrido	22 dias
				Prazo a vencer	36 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável



Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1					Mão de Obra Indireta (3)

Equipamentos (0)




Atividades (2)	
Reparo quadra Pintura portão e alçobrado quadra. Reboco interno e externo	55% - Em Andamento
Primeira demão tinta. Continuação reboco	65% - Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

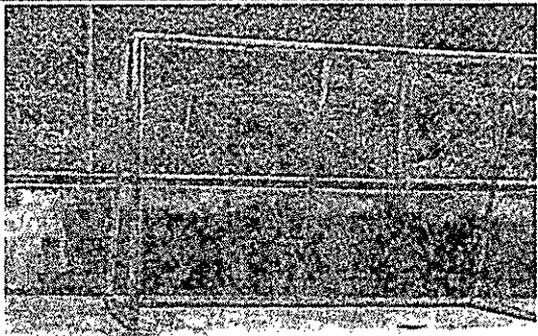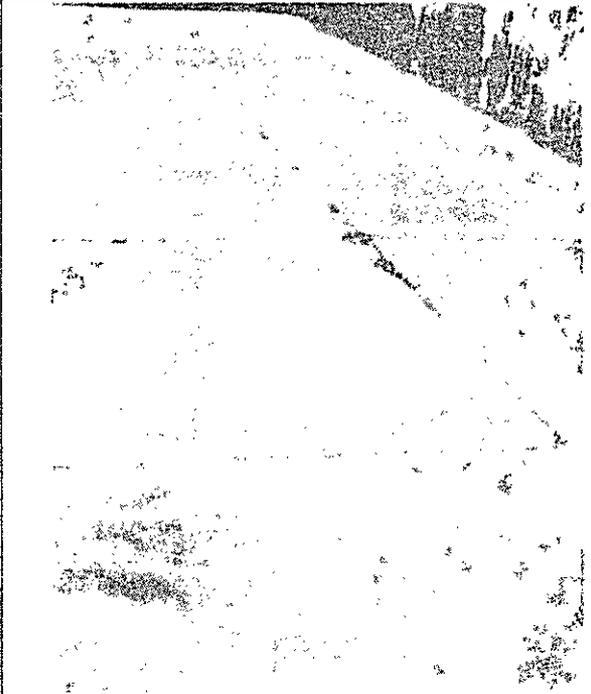Galeria de Fotos (5)	
	

Handwritten signature

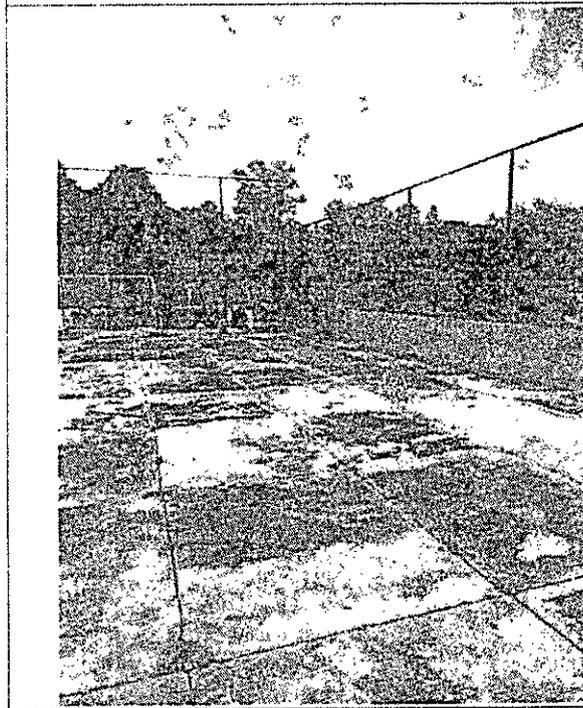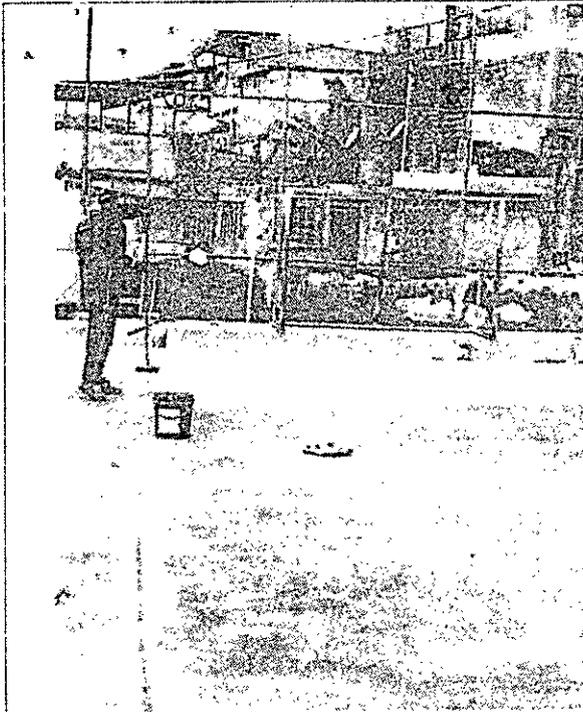

Assinatura



Assinatura



**Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota
202300000000053
Emissão
14/06/2023 08:10:24
Código de Verificação
5A66-7EC1

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **SENIOR ENGENHARIA LTDA**
CPF/CNPJ: **41.751.431/0001-77**
Endereço: BARBARA DA FONSECA 162 APT 202 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG
Inscrição Municipal: 0000000000000004395
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: **19.718.360/0001-51**
Endereço: AV PREF MARIO PEREIRA 10 - CENTRO - CEP: 36400001
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
E-mail:
CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual: Isento

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO QUADRA JK

Dados Bancários
Agência: 0179
C/C: 61165-9
Sicredi

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 14 de 06 de 2023

Luiza Cassiada Silva
Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

CÓPIA
Atestamos a existência da presente Nota Fiscal, a qual está em termos de ser paga.
Inscrição Orçamentária:
Adição:
Cont. Lafaiete 14 de 06 de 2023
55541
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
28.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	28.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,64
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(0,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	DATA:	13/06/2023	
NOME DA OBRA:	QUADRA DO BAIRRO JK	BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	SÊNIOR ENGENHARIA LTDA	DESC. SINAPI:	14,21%	
Nº CONTRATO:	056/2022	DESC. SEINFRA:	14,21%	
OBJETO:	Reparos na Quadra do JK			
Nº AE	1617/2023	Nº NE:	3377/2023	
REFERÊNCIA:	2022/04_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2022/05_SINAPI_MG_DESONERADO	ORDEM DE SERVIÇO	33/2023	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 28.974,64
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$ 28.974,64
FISCALIZAÇÃO:	CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
 Luisa Silva Engenheira Civil	 Thaisson Hugo Farla Fernandes Sênior Engenheira	 Danilo de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.630/D		
	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS:	SECRETÁRIO MUNIC. DE ESPORTES:		
	 Cláudio Quirino Custódio	Prof. Albano de Souza Tibúrcio		



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME DA OBRA: Quadra do bairro JK
SETOR RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE ESPORTES
Nº CONTRATO: 71/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 189/2021 - SENHOR ENGENHARIA - 056/2022
OBJETO: Reparos na Quadra do JK

REFERÊNCIA: 2022/03_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO
 2022/05_SINAPL_MG_DESONERADO
Nº AE: 1617/2023

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)	
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO					3ª MEDIÇÃO PERÍODO
1	SEINFRA	ED-4842	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m3	90,00	45,00		R\$ 134,95	R\$ 6.072,75	45,00	50,00%	
2	SEINFRA	ED-4837	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m3	13,50	6,75		R\$ 589,43	R\$ 3.971,90	6,75	50,00%	
3	SEINFRA	ED-9934	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE	m2	350,00	350,00		R\$ 47,23	R\$ 16.530,50	350,00	100,00%	
4	SEINFRA	ED-51144	PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO	m2	18,00	18,00		R\$ 72,20	R\$ 1.299,60	18,00	100,00%	
5	SEINFRA	ED-9925	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	90,00	45,00		R\$ 20,13	R\$ 905,85	45,00	50,00%	
6	SEINFRA	ED-50469	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TABUAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	18,00	18,00		R\$ 10,78	R\$ 194,04	18,00	100,00%	
								SUBTOTAL:	R\$ 28.974,64			

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$	28.974,64
PERCENTUAL EXECUTADO:		50,66%
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO	R\$	103.026,05
SALDO	R\$	50.828,44

FISCALIZAÇÃO:
 Luísa Silva
 Luísa Silva
 Engenheira Civil
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS:

CONTRATADA:
 Thalisson Augusto Faria Fernandes
 Sênior Engenheira
 SECRETARIO MUN. DE ESPORTES
 Prof. Albano de Souza Tibúrcio

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
 Danièle de Oliveira Silva
 Eng. CIVIL / CREA: 256530/D
 13/06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

REPARO NA QUADRA DO BAIRRO JK

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./ PERÍMETRO	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VAG	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ²)	(m ³)	(kg)	(kg/m ³) (t/m ³)	(KtM)	(unit)	h		
1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO													45,00	m ³
	PISO DESNIVELADO EXISTENTE		25,00	1,8000	0,00		45,00							45,0000	
2	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA "CONTROLE" B, COM FCK 20 MPA, BRITA Nº 1 (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)													6,75	m ³
	PISO NOVO		25,00	1,8000	0,15									6,7500	
3	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃO(S) INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPOXI													350,00	m ²
	TODA QUADRA		25,00	14,0000										350,0000	
4	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA													18,00	m ²
	PASSEIO EXTERNO		12,00	1,5000			18,00							18,0000	
5	PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPOXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPOXI													45,00	m ²
	PISO NOVO		25,00	1,8000										45,0000	
6	PINTURA AGRÍCOLA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃO(S)													18,00	m ²
	PASSEIO EXTERNO		12,00	1,5000										18,0000	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


lúcia líbia

				Relatório nº	7
				Data do relatório	22/05/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Quadra JK			Contrato	
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete			Prazo contratual	58 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Danlele Silva / Thalisson Fernandes	Prazo decorrido	58 dias
				Prazo a vencer	-111 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1					Mão de Obra Indireta (3)

Atividades (1)	
Reforma quadra	55% - Em Andamento

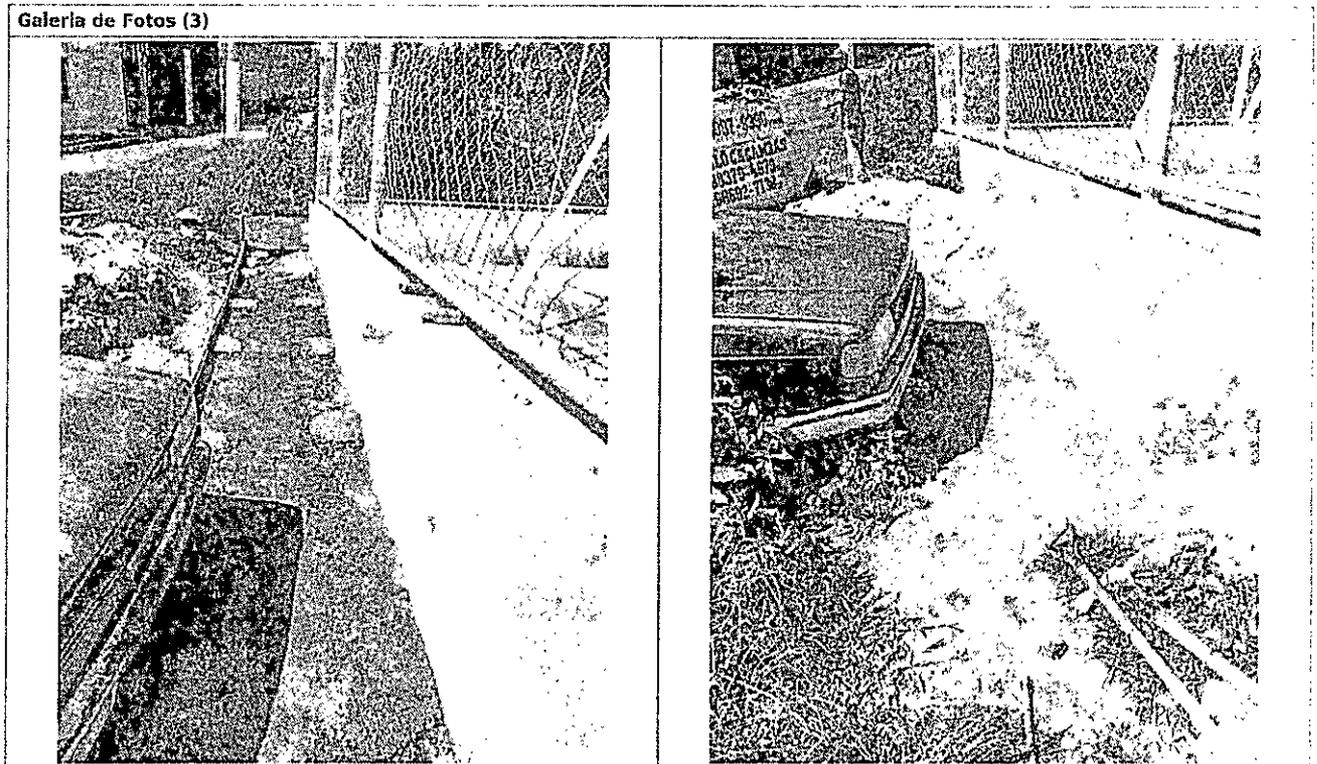

Dyf

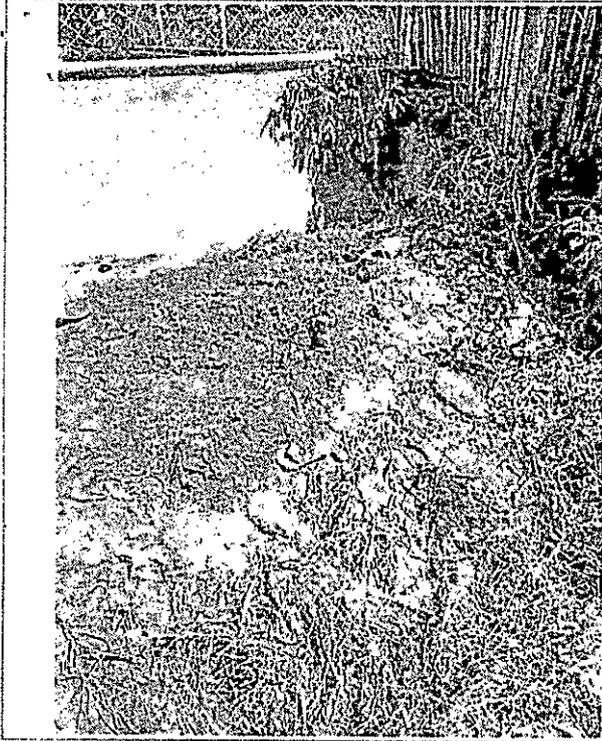

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura




				Relatório nº	8	
				Data do relatório	23/05/2023	
				Dia da semana	Terça-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	Quadra JK			Prazo contratual	58 dias	
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaete			Prazo decorrido	58 dias	
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaete	Responsável	Daniele Silva / Thalisson Fernandes		Prazo a vencer	-112 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (5)					
Ajudante					Mão de Obra Direta (2)
2	Serralheiro				Mão de Obra Indireta (3)
Engenheiro	1				
2					

Atividades (1)	
Reforma quadra	55% - Em Andamento

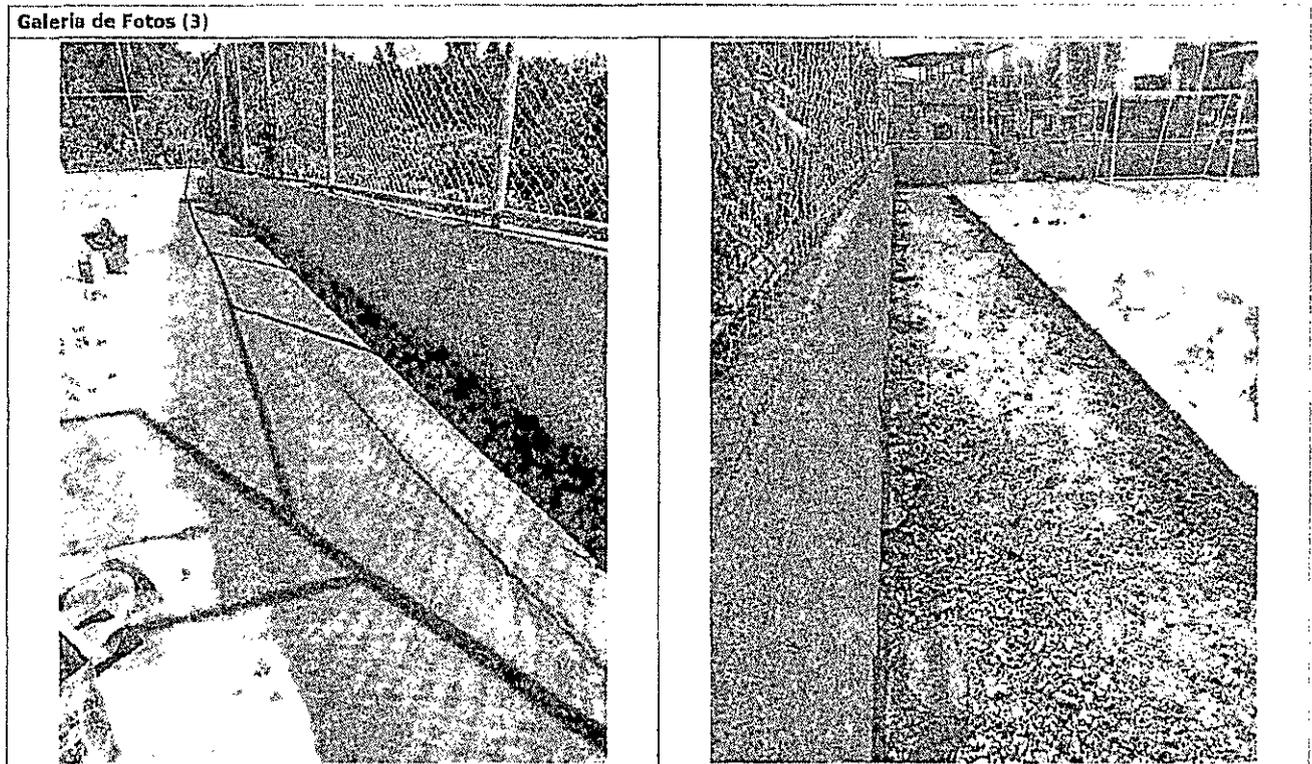

Duf

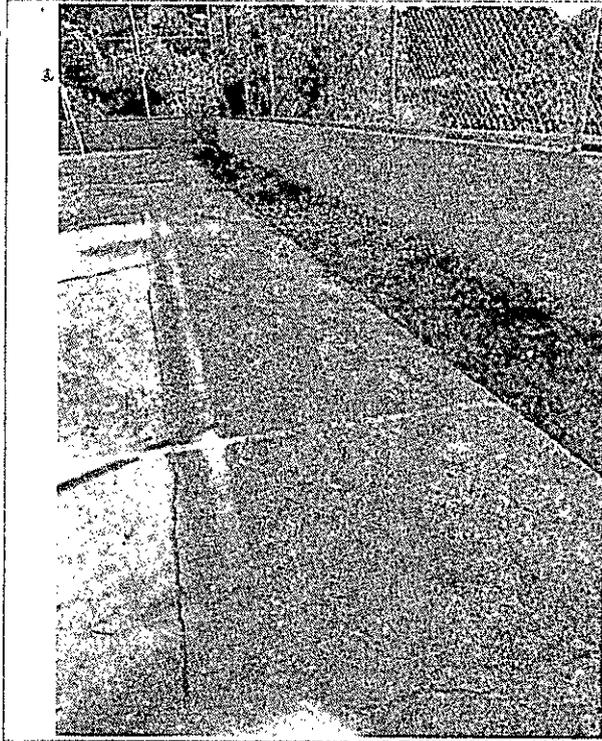

[Handwritten signature]

Assinatura


Assinatura

			Relatório nº	9	
			Data do relatório	24/05/2023	
			Dia da semana	Quarta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Quadra JK		Contrato		
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete		Prazo contratual	58 dias	
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Daniele Silva / Thalisson Fernandes	Prazo decorrido	58 dias
				Prazo a vencer	-113 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1					Mão de Obra Indireta (3)

Atividades (1)	
Reforma quadra	55% - Em Andamento

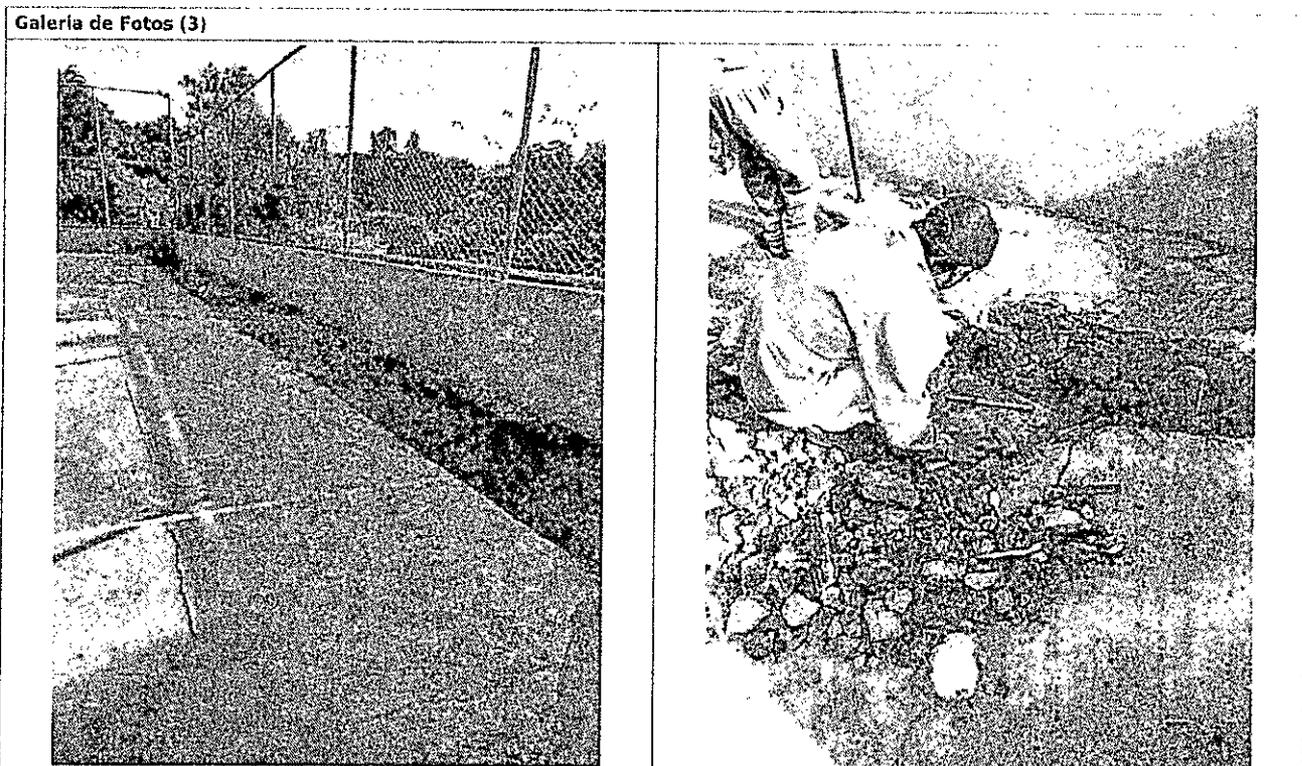

Handwritten signature

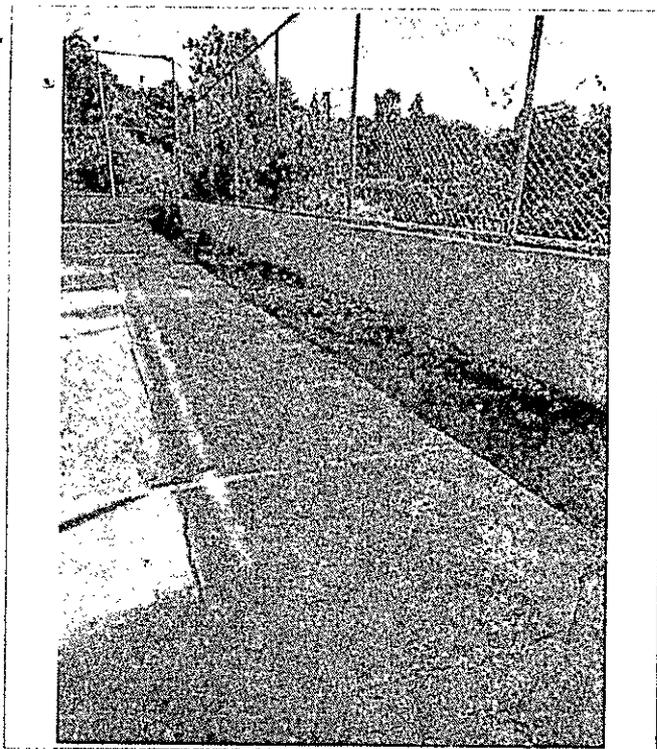

[Handwritten signature]

Assinatura


Assinatura

				Relatório n°	10
				Data do relatório	25/05/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	Quadra JK			Contrato	
Local	Bairro JK, Conselheiro Lafaiete			Prazo contratual	58 dias
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Dantele Silva / Thalsson Fernandes	Prazo decorrido	58 dias
				Prazo a vencer	-114 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (5)					
Ajudante 2					Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1				Mão de Obra Indireta (3)

Atividades (1)	
Reforma quadra	55% - Em Andamento

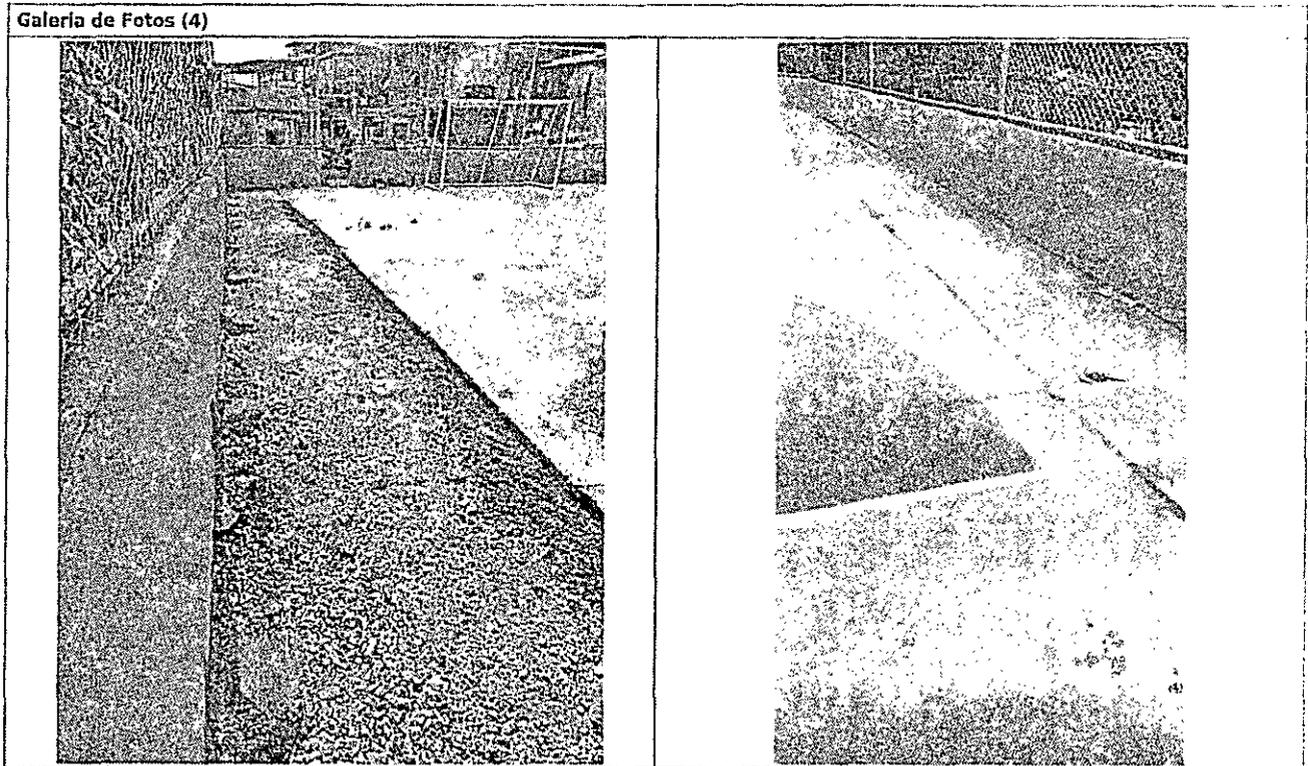

[Handwritten signature]

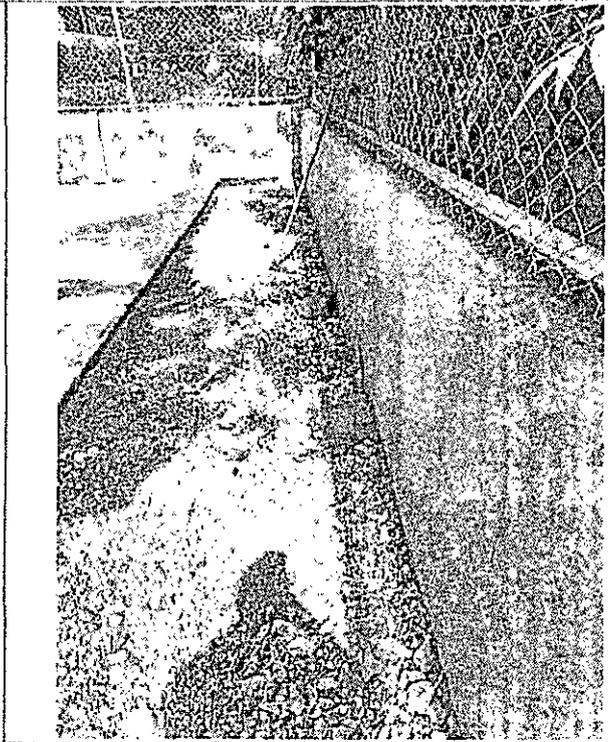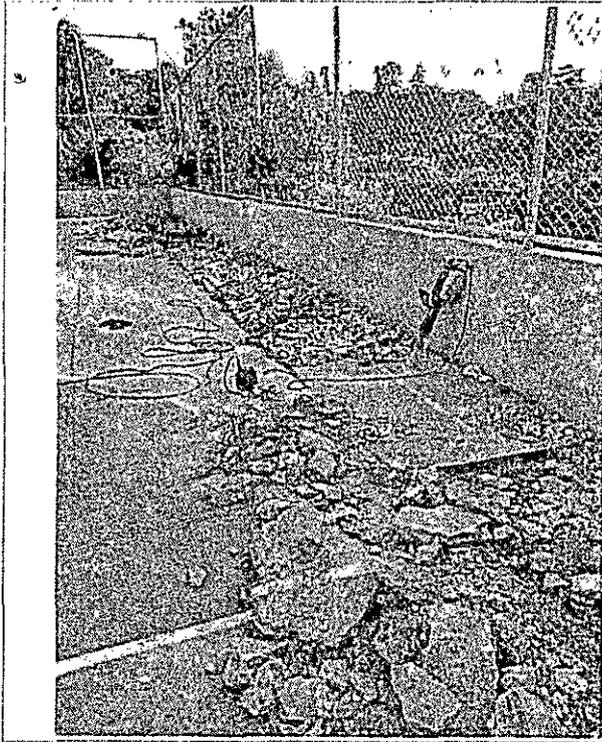

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura



Relatório n°	11
Data do relatório	26/05/2023
Dia da semana	Sexta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	58 dias
Prazo decorrido	58 dias
Prazo a vencer	-115 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	Quadra JK		
Local	Bairro JK , Conselheiro Lafaiete		
Contratante	Prefeitura municipal de Conselheiro Lafaiete	Responsável	Daniel Silva / Thailsson Fernandes

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Mão de Obra (5)						
Ajudante 2						Mão de Obra Direta (2)
Engenheiro 2	Serralheiro 1					Mão de Obra Indireta (3)

Atividades (1)	
Reforma quadra	55% - Em Andamento

Galeria de Fotos (1)

Assinatura

Assinatura


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Gestor do Contrato: null

 AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
 CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
 E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
 Nr.: 1617/2023

 Processo Administrativo: 189/2021
 Contrato: 21/2023
 Nº da Licitação: 196/2021
 Modalidade: Concorrência
 Data da Contratação: 08/02/2023
 Data da Solicitação: 22/05/2023
 Sequencial do Contrato: 1525

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA

Data da tramitação: 22/05/2023

3377

22/05

Fornecedor: SENIOR ENGENHARIA LTDA

Telefone(s): 3187250977

CPF/CNPJ: 41.751.431/0001-77

Endereço: R BARBARA DA FONSECA, 162, 162, Centro - null-null, JECEABA - MG

E-mail: eng.danielecivil@gmail.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020340010140101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Condição de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 30 - Dias

Local de Entrega: CENTRAL

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Observações: RIMS 045/2023: AQDEQUAÇÃO E RAPAROS NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO JK.

Empenho:

Despesas:


680 - 34.001.27.813.0026.2110.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER/ESPORTES

Desdobramento:

Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	SV	68922	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES		39.924,5985	39.924,60
						Total Geral:	39.924,60

Conselheiro Lafaiete/MG, 22 de Maio de 2023

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA


Assinatura e Carimbo do Responsável



ORDEM DE SERVIÇO Nº 33/2023

Solicitação de fornecimento: 1617/2022

Nota de empenho: 3377/2022

A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 19.718.360/0001-51, autoriza à partir desta data, a empresa SÊNIOR ENGENHARIA LTDA., com sede na Rua Bárbara da Fonseca, nº 162, Centro, na cidade de Jeceaba/MG, CEP 35.498-000, Tel. (31) 98518-0219 ou 99999-2850, e-mail senioreng.civil@gmail.com, inscrita no CNPJ nº 41.751.431/0001-77, celebrado entre as partes através do Processo Licitatório 189/2021, Concorrência Pública 006/2021, a dar início aos serviços, objeto do contrato acima, referente à readequação de reparos na Quadra Esportiva localizada no JK, neste município. O prazo para término dos serviços é até dia 15/06/2023. Em anexo cópias da planilha orçamentária junto a memória de cálculo.

Conselheiro Lafaiete - MG, 23 de maio de 2023.

Cláudio Quirino Custódio
Secretário Municipal de Obras

Luísa Silva
Engenheira Civil

Albano Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação e Esporte

Ciente,

SÊNIOR ENGENHARIA LTDA.

COPIA



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 508/2023

CI

DATA: 10/10/2023

FL.:1/10

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete


ASSUNTO: Resposta ao requerimento nº 496/2023

Prezados,

CÓPIA


A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Cláudio Quirino Custódio, em resposta ao ofício acima supracitado, informa que aconteceram reparos de manutenção na quadra do bairro JK. Parte dos reparos foi feita pela empresa Sênior Engenharia, através do contrato de manutenção predial, e parte foi feita por mão de obra própria do município. Na primeira visita, a quadra se encontrava em situação crítica, conforme imagens a seguir. A Figura 1 apresenta uma visão mais ampla da quadra.

Figura 1-Quadra JK visita inicial

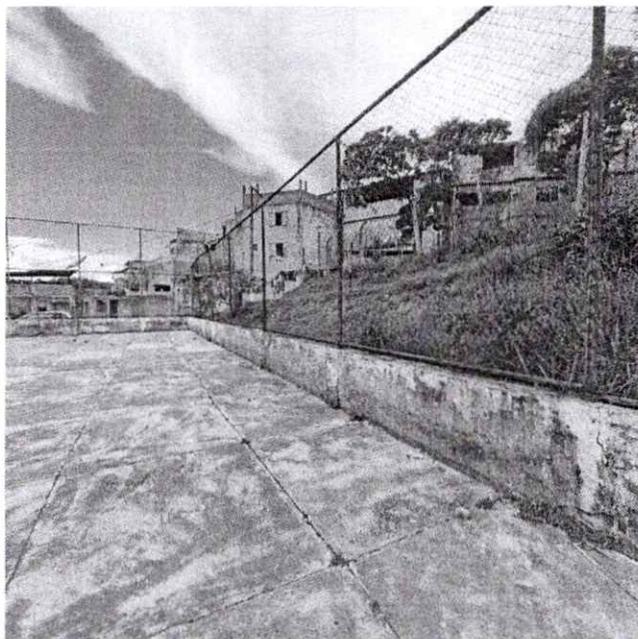


Na Figura 2 percebe-se a trave fora do lugar, o alambrado com partes estragadas, bem como o piso e o muro.

Figura 2 - Quadra JK

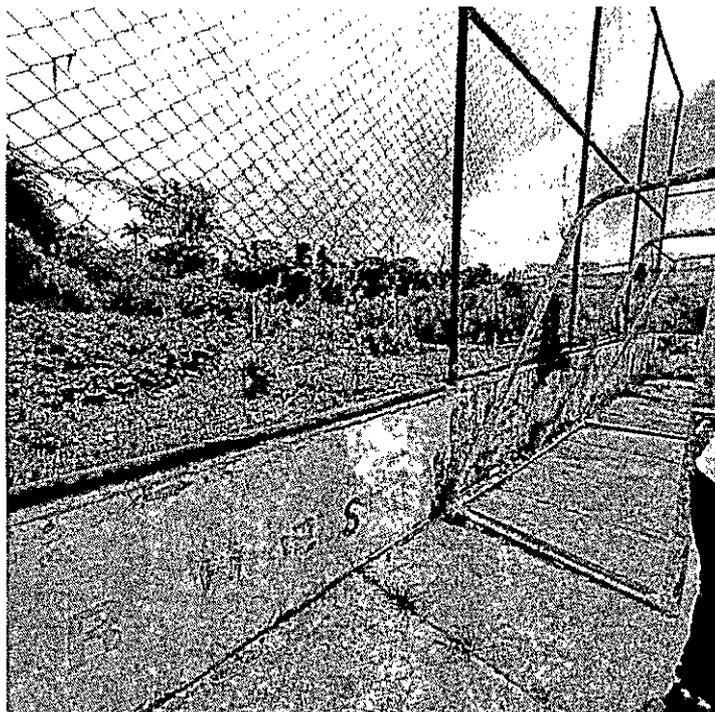

Além dos problemas estruturais, havia muito lixo e mato nascendo dentro da quadra, conforme apresenta a Figura 3.

Figura 3 - Lixo na quadra

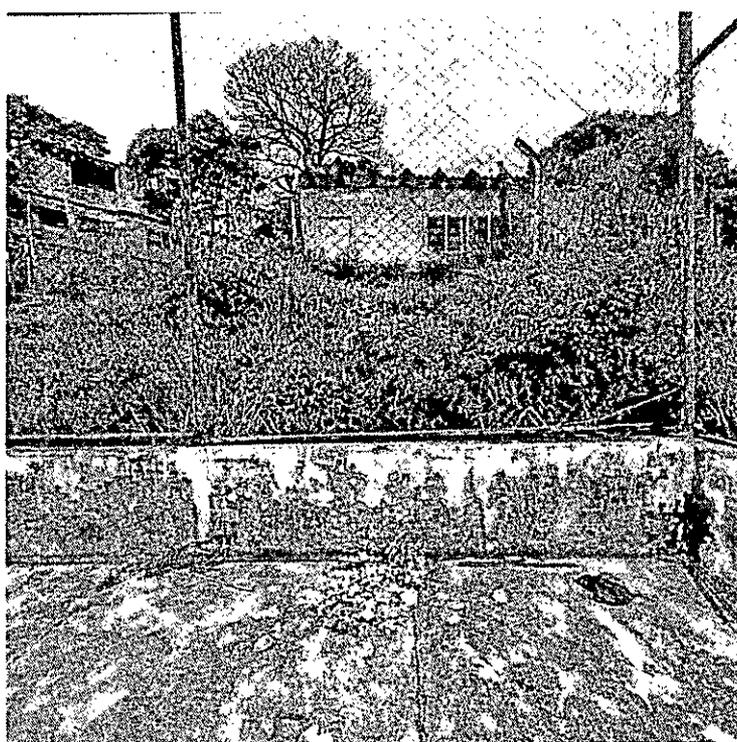

Foi feito um levantamento, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, dos reparos necessários a serem executados pela empresa de manutenção predial. Durante a execução dos reparos, a quadra esteve em constante uso, conforme percebe-se pela Figura 4 e Figura 5.

Figura 4 - Pintura da quadra



Figura 5 - Pintura da parede da quadra




A primeira planilha contava com os itens do Anexo I. Durante a execução, percebeu-se que havia um desnivelamento do piso da quadra do lado direito, o que uma camada de regularização de 15 mm (item 4 da planilha) não resolveria o problema. Sendo assim, realizou-se uma nova planilha, do Anexo II, para reparo posterior. Vale ressaltar que a empresa recebe apenas os itens que forem executados.

Figura 6 - Passeio de fora da quadra pintado



Figura 7 - Reparo no alambrado da quadra

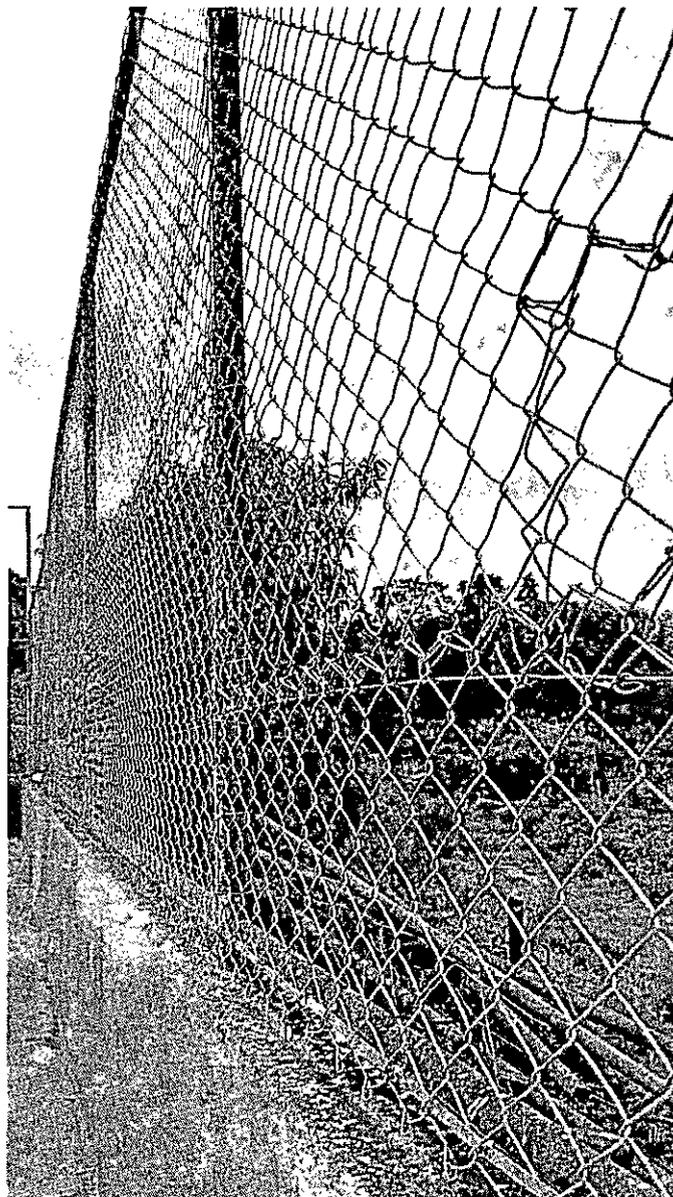

Além dos reparos, solicitamos a empresa de iluminação pública que iluminasse a quadra para que pudesse ser utilizada também na parte da noite. Ao fim dos reparos a quadra ganhou um paisagismo e um passeio maior na parte da frente.

Figura 8 - Paisagismo da Quadra

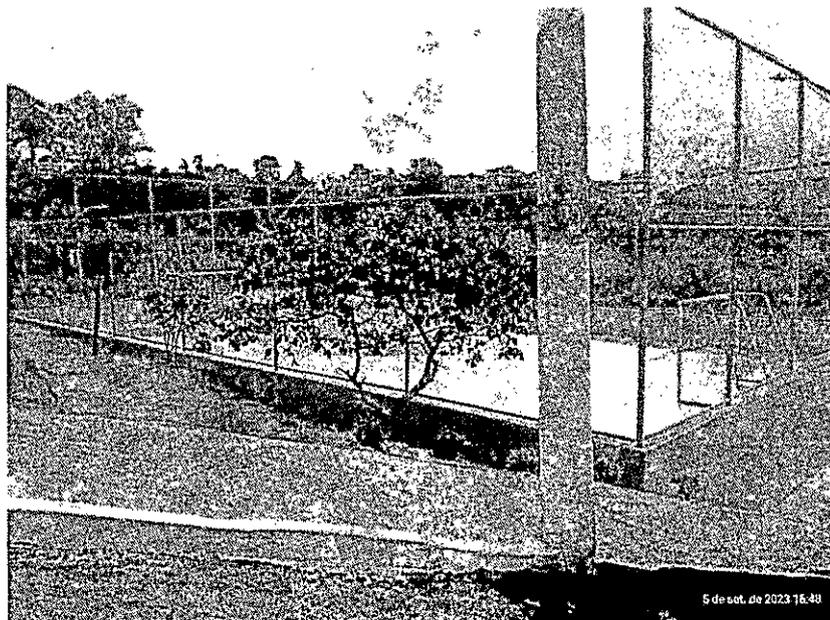


Figura 9 - Quadra JK reparada

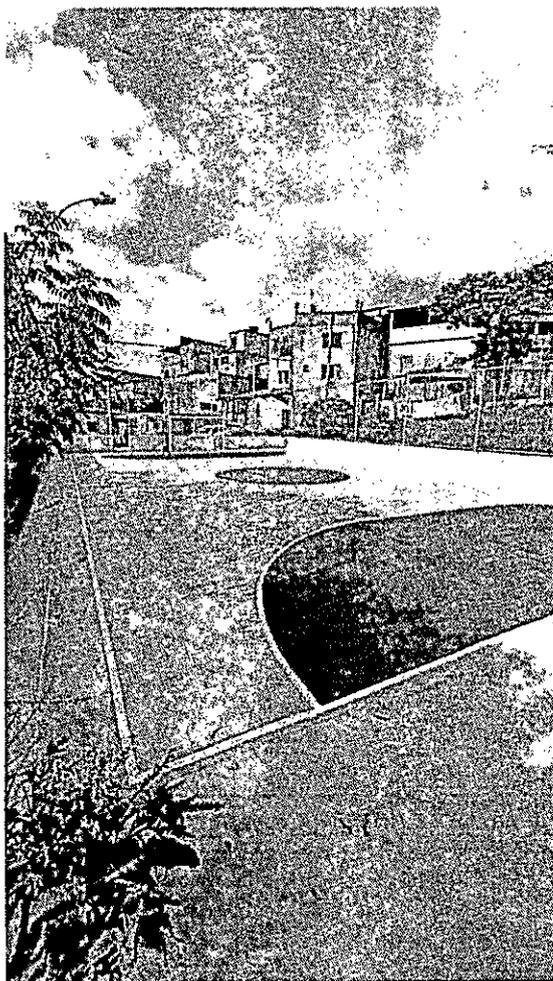


Figura 10 - Quadra JK e paisagismo


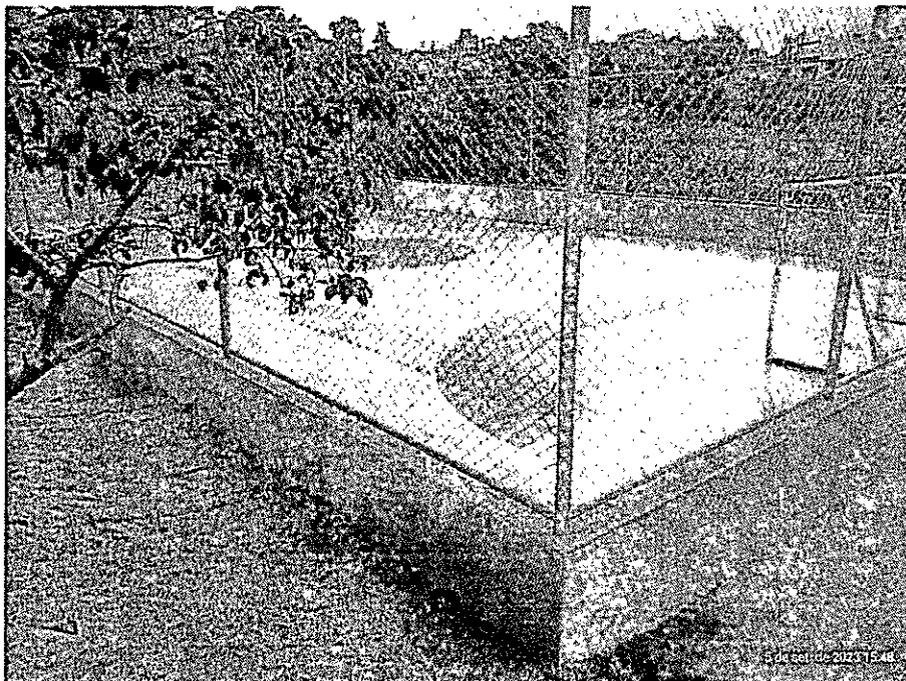


Figura 11 - Passeio Quadra JK



A quadra já vem sendo utilizada para realizar eventos na comunidade, conforme Figura 12, onde é possível observar a presença de bandeiras amarradas no alambrado, trave removida do lugar e usada para amarrar brinquedos.

Figura 12 - Evento na Quadra JK

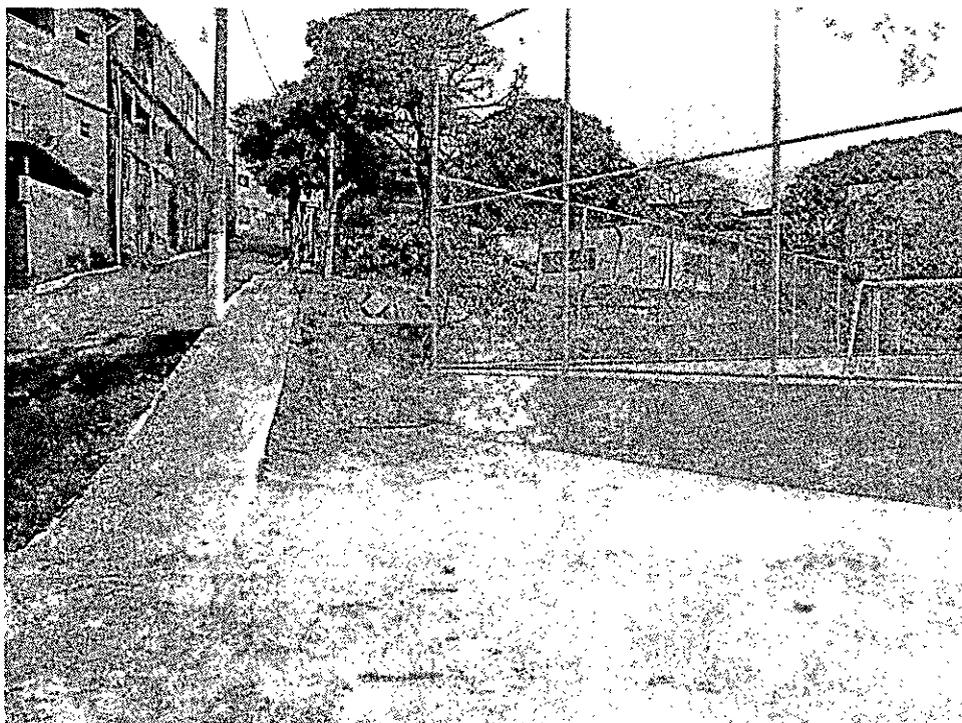

Estamos a disposição caso exista alguma dúvida em relação ao que foi realizado no local.

Desde já agradecemos.

Cláudio Quirino Custódio
Secretário de Obras e Meio Ambiente
