

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conselheiro Lafaiete, 07 de agosto de 2024.

Ofício Gerência Administrativa nº: 781/2024

Ref. Resposta ao requerimento nº 344/2024

Prezado,

O Secretário Municipal de Educação, Prof. Albano de Souza Tibúrcio, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 865/2023, vem à presença de Vossa Senhoria em resposta ao requerimento nº 344/2024, esclarecer o que segue;

Encaminhamos anexo notas fiscais com os relatórios de obras executadas no ano de 2024 através do Projeto atividade 2057 – Manutenção da Rede Física, conforme quadro a seguir:

EMPENHO	UNIDADE ESCOLAR	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR PAGO	PAGO TOTAL DE NOTAS	RESTOS A PAGAR
588	E.M ESPERIDIÃO PEREIRA	R\$ 78.135,00	R\$ 72.529,61		R\$ 72.529,61	R\$ 5.605,39
589	E.M PADRE JOSE LOBO DA SILVEIRA	R\$ 96.850,68	R\$ 51.148,96	R\$ 34.954,87	R\$ 86.103,83	R\$ 10.746,85
590	E.M SEBASTIÃO PEREIRA DA FONSECA	R\$ 71.383,32	R\$ 34.267,62	R\$ 32.782,24	R\$ 67.049,86	R\$ 4.333,46
591	CEI MONSENHOR ANTONIO JOSE FERREIRA	R\$ 62.406,63	R\$ 57.348,28		R\$ 57.348,28	R\$ 5.058,35
1379	E.M SEBASTIÃO PEREIRA DA FONSECA	R\$ 10.091,24	R\$ 10.091,24		R\$ 10.091,24	R\$ 0,00
1380	E.M ROMEU GUIMARÃES	R\$ 11.412,59	R\$ 7.428,27		R\$ 7.428,27	R\$ 3.984,32
1381	E.M ESPERIDIÃO PEREIRA	R\$ 5.611,26	R\$ 3.359,98		R\$ 3.359,98	R\$ 2.251,28
1382	E.M PADRE JOSE LOBO DA SILVEIRA	R\$ 46.386,54	R\$ 11.764,38		R\$ 11.764,38	R\$ 34.622,16
1383	CREMEI JUQUITA VIEIRA	R\$ 245.844,11	R\$ 166.301,30	R\$ 79.542,80	R\$ 245.844,10	R\$ 0,01
2984	CREMEI JUQUITA VIEIRA	R\$ 94.558,16	R\$ 6.838,69		R\$ 6.838,69	R\$ 87.719,47



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Informamos que encaminhamos ofício gerência administrativa nº 719/2024 à Secretaria de Obras solicitando que seja realizado levantamento técnico (planilha de serviços) para manutenção e reforma das escolas relacionadas abaixo, para execução no ano de 2025, tendo em vista valor destinado de R\$ 1.557.600,00 (Hum milhão quinhentos e cinquenta sete mil e seiscentos reais) no orçamento de 2025.

E.M Jair Noronha

E.M Luiz Carlos Gomes Beato

E.M Romeu Guimarães

CEI Ricardo Mediolli

E.M Napoleão Reis

E.M Ver. Alfredo Mafuz

E.M Marinho Fernandes

E.M Julia Miranda Nogueira

E.M Dr. Rui Pena - CAIC

Referente a reforma na E.M Napoleão Reis, informamos que foi expedido empenho nº 3591/2024 e 1904/2024, anexos, para execução de obras na referida escola no ano de 2024, segundo semestre, conforme projetos anexos. Tão logo a obra seja concluída, encaminharemos as notas fiscais.

Antecipamos agradecimentos e colocamos nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários

Atenciosamente,


Adão Roberto Meirelles
Gerente Administrativo


Prof. Albano de Souza Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação

A Sr.^a
Vereadora Damires Rinarlly Oliveira Pinto
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 344/2024

EXPEDIENTE

Pl. Flávia


Exmo. O Sr. Presidente da Câmara Municipal,

A Vereadora infra assinada, nos termos do art.196, inciso I, do Regimento Interno, requer, para a Casa, que seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Mário Marcus, solicitando orientações acerca da manutenção dos prédios escolares, sendo elas:

- Considerando que no Plano Plurianual foi previsto na ação 2057 – Manutenção da Rede Física o valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para reforma das escolas públicas municipais no ano de 2024, questiona-se quanto foi efetivamente gasto até a presente data e em quais escolas? Indicar individualmente os valores investidos em cada escola e quais os melhoramentos feitos.
- Considerando que no Plano Plurianual foi previsto na ação 2057 – Manutenção da Rede Física o valor de R\$1.057.600,00 (um milhão, cinquenta e sete mil e seiscentos reais) para reforma das escolas públicas municipais no ano de 2025, questiona-se quais escolas estão previstas para receber reformas? Encaminhar documento de planejamento de despesas da referida previsão orçamentária.
- Considerando que no Plano Plurianual foi previsto na ação 2057 – Manutenção da Rede Física o valor total de R\$3.538.242,77 (três milhões, quinhentos e trinta e oito, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) para reforma das escolas públicas municipais, questiona-se quanto foi investido para reforma da Escola Municipal Napoleão Reis? Quais melhoramentos foram realizados?

SALA DAS SESSÕES 21 DE JUNHO DE 2024

VEREADORA DAMIRES RINARLLY OLIVEIRA PINTO



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Nat. Despesa	Núm. Baixa	Conta	Recurso	Processo	SF/Ano	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
Credor - CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA													
19/02 EMP.		1877	588/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	263/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	568.358,24	14.093,87	554.264,37
19/02 EMP.		1878	589/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	264/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	72.529,61	2.175,89	70.353,72
19/02 EMP.		1879	590/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	265/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	51.148,96	1.534,47	49.614,49
19/02 EMP.		1880	591/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	268/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	34.267,62	1.028,03	33.239,59
06/03 EMP.		2641	589/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	264/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	57.348,28	1.720,45	55.627,83
06/03 EMP.		2642	590/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	265/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	34.954,87	1.048,64	33.906,23
14/03 EMP.		3291	1383/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	675/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	32.782,24	983,46	31.798,78
01/04 EMP.		3866	1381/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	673/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	166.301,30	4.989,04	161.312,26
01/04 EMP.		3867	1379/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	671/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	3.359,98	0,00	3.359,98
04/04 EMP.		4108	1383/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	675/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	10.091,24	0,00	10.091,24
04/04 EMP.		4109	1380/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	672/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	79.542,80	0,00	79.542,80
04/04 EMP.		4111	1382/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	674/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	7.428,27	0,00	7.428,27
14/05 EMP.		6322	2984/24	3.3.90.39.99		5022-9	1.500.000.1001	90/2023	1334/2024	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	11.764,38	388,22	11.376,16
Total Geral :											568.358,24	14.093,87	554.264,37

RIMS - REQUISIÇÃO INTERNA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

N° 151/2024

Conselheiro Lafaiete, 29 de fevereiro de 2024

SETOR:	Secretaria Municipal de Educação		
SOLICITANTE:	Setor Gerencia Administrativa		
CONTATO:	Adão Roberto Meireles	EMAIL:	adaro@semede@controlefiscal.mg.gov.br
PARA:	COMPRAS	COMPRA DIRETA	PROC. LICITATÓR ☒ X

PROCESSO LICITATÓRIO:	23/2023	TOMADA DE PREÇOS	003/2023			
FICHA:	101	FONTE DE RECURSO:	1.500.000.1001	CONTA:	TIPO DE ENTREGA:	Parcial

JUSTIFICATIVA. Contratação de empresa especializada para execução de obras de prevenção e combate a Incêndio (SPCI) na E.M NAPOLEÃO REIS

[illegible]

INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES PARA O ORÇAMENTO (EM CASO DE COMPRA DIRETA)			
ITEM	EMPRESA	TELEFONE	PESSOA CONTATO
1			
2			
3			

LOCAL DE ENTREGA:

FACILITADOR:

Adão Roberto Malpica
Gerente Administrativo

APROVADO POR:

Prof. Albano de Souza Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação

ENTREGA - SETOR DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO/SECRETARIA	
RECEBIDO EM	POR:	RECEBIDO:	ASS. RESP.:
01-03-24			
		JUSTIFICATIVA:	

RIMS - REQUISICÃO INTERNA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

N° 301/2024

Conselheiro Lafaele, 07 de maio de 2024

SETOR:	Secretaria Municipal de Educação		
SOLICITANTE:	Setor Gerencia Administrativa		
CONTATO:	Adão Roberto Meireles	EMAIL:	orgaosistemasde@conselhosfideleis.mg.gov.br
PARA:	COMPRAS	COMPRA DIRETA	PROC. LICITAÇÃO X

PROCESSO LICITATÓRIO:	23/2023	TOMADA DE PREÇOS	003/2023			
FICHA:	101	FONTE DE RECURSO:	2.500.000.1001	CONTA:	TIPO DE ENTREGA:	Parcial

JUSTIFICATIVA: Contratação de empresa especializada para execução de obras de prevenção e combate a Incêndio (SPCI) na E.M NAPOLEÃO REIS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

[illegible]

INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES PARA O ORÇAMENTO (EM CASO DE COMPRA DIRETA)			
ITEM	EMPRESA	TELEFONE	PESSOA CONTATO
1			
2			
3			

LOCAL DE ENTREGA:

FACILITADOR:

Adão Roberto Malfeles
Gerente Administrativo

APROVADO POR:

Prof. Albano de Souza Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação

ENTREGA - SETOR DE COMPRAS				DEVOLUÇÃO/SECRETARIA			
RECEBIDO EM	07/05/2014	TPOR:	<i>Jussara</i>	RECEBIDO:		ASS. RESP.:	
				JUSTIFICATIVA:			

 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033 E-mail: licitalafaiete@conselhoirlafaiete.mg.gov.br Site: www.	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 757/2024	
	Processo Administrativo: 23/2023 Contrato: 53/2024 Nº da Licitação: 24/2023 Modalidade: Tomada de Data da Contratação: 19/02/2024 Data da Solicitação: 01/03/2024 Sequencial do Contrato: 7005	

AUTORIZADA por GABRIELA FERNANDA MELLILO

Data da tramitação: 01/03/2024

1904 07/03

Fornecedor: ANA LARA DA FONSECA SANTIAGO REYS SILVA

Telefone(s): 3137370979

CPF/CNPJ: 38.756.278/0001-66

Endereço: IPE MIRIM, 130, Jardim Eldorado - 36402-072, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

E-mail: contato@4company.net.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Condição de Pagamento: CONFORME CONTRATO

Prazo de Entrega: Em data fixada na ordem de início de serviços

Local de Entrega: SECRETARIA DE SAUDE

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA A

Observações: RIMS 151/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (SPCI) NA E.M. NAPOLEÃO REIS.

Empenho:

Despesas:

101 - 25.001.12.361.0012.1163.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL

Desdobramento:

Recurso: 1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
17	0,363358	VB	73637	Contratação de empresa para a Execução de Obras		313.016,6400	113.736,99

						Total Geral:	113.736,99
--	--	--	--	--	--	--------------	------------

Conselheiro Lafaiete/MG, 01 de Março de 2024

 GABRIELA FERNANDA MELLILO
 Assinatura e Carimbo do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete

CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033

E-mail: licitalafaiete@conselhoelafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1490/2024

Processo Administrativo: 23/2023
Contrato: 53/2024
Nº da Licitação: 24/2023
Modalidade: Tomada de
Data da Contratação: 19/02/2024
Data da Solicitação: 08/05/2024
Sequencial do Contrato: 2035

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA

Data da tramitação: 08/05/2024

NB 3591

13/05/24

Fornecedor: ANA LARA DA FONSECA SANTIAGO REYS SILVA

Telefone(s): 3137370979

CPF/CNPJ: 38.756.278/0001-66

Endereço: IPE MIRIM, 130, Jardim Eldorado - 36402-072, CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

E-mail: contato@4company.net.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Condição de Pagamento: CONFORME CONTRATO

Prazo de Entrega: Em data fixada na ordem de início de serviços

Local de Entrega: SECRETARIA DE SAUDE

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA A

Observações: RIMS 301/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (SPCI) NA E. M. NAPOLEÃO REIS.

Empenho:

Despesas:

101 - 25.001.12.361.0012.1163.4.4.90.51.00 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL

Desdobramento :


Recurso : 2.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
17	0,636642	VB	73637	Contratação de empresa para a Execução de Obras		313.016,6400	199.279,54

Total Geral: 199.279,54

Conselheiro Lafaiete/MG, 08 de Maio de 2024

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável

[illegible][illegible]

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DO PSC/P			
DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSC/P	

 MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS RUA JOÃO DE DEUS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS 13506-900 - SÃO CARLOS - SP	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDUCANDO ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDÊNCIA CONSELHEIRO JULIÃO DE MOURA GOMES	CONTEÚDO CURRICULAR	COEFICIENTE EDUCACIONAL
PLANTAL BARRA - BLOCO "A" - SUB NÍVEL 1	PROFESSOR	TRIMESTRE F-1
PROVA	UNIDADE DE CONTEÚDO CURRICULAR - CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 3 CONTEÚDO 4	PROVA
PROVA	PROVA	PROVA
PROVA	PROVA	PROVA

Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

2024000000000003

Emissão

05/02/2024 17:14:52

Código de Verificação

5177-69C4

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA**

CPF/CNPJ: **50.361.051/0001-17**

Inscrição Municipal:

0000000000000004547

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO -
CEP: 35498000

Inscrição Estadual:

Município: 3135407 - JECEABA/MG

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

CPF/CNPJ: **19.718.360/0001-51**

CEI:

Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026

Inscrição Municipal:

Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Inscrição Estadual:

E-mail:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA MUNICIPAL ESPIRIDIAO PEREIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS, CONFERIDOS E ACEITOS, ESTANDO EM CONDIÇÕES SENSACIONAIS PARA O MUNICÍPIO

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 29.011,84

BASE DE CALCULO MATERIAIS : 43.517,76

Dados Bancários

Agência: 3116

C/C: 39.069-0

Sicoob

Data 07/02/2024

Valor 588,00

Assinatura 55485

Doc. Identidade

Serviço Prestado

Doc. Identidade

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
72.529,61	72.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.529,61
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 Exigível					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00
- = ISS: R\$ 0,00(5,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



ESTADO DE MINAS GERAIS**PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE****Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO**

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete

CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033

E-mail: licitalafaiete@conselheirolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**Nr.: 263/2024**

Processo Administrativo: 90/2023

Contrato: 131/2023

Nº da Licitação: 98/2023

Modalidade: Concorrência

Data da Contratação: 09/11/2023

Data da Solicitação: 04/01/2024

Sequencial do Contrato: 1989

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Data da tramitação: 04/01/2024

388

25/01

Fornecedor: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA

Telefone(s): 3185180219

CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS, 617, Centro - 35498-000, JECEABA - MG

E-mail: contabilidadejeceaba@outlook.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Condição de Pagamento: CONFORME CONTRATO

Prazo de Entrega: 05 DIAS ÚTEIS DA ORDEM DE SERVIÇO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

Observações: RIMS 16/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NA E. M. ESPERIDIÃO PEREIRA.

Empenho:

Despesas:

102 - 25.001.12.361.0012.2057.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA

Desdobramento:

Recurso: 1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,033212	SV	73548	Serviço de engenharia - Prestação de serviços de		2.352.600,0000	78.135,00

Total Geral: 78.135,00

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Janeiro de 2024

DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Assinatura e Carimbo do Responsável



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Administração 2021/2024

ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL Nº 02/2024

Devido a necessidade de adequações na E.M. Espiridião Pereira, consequentemente, possível atraso do início do período letivo. Segundo o Termo de Referência (em anexo) do contrato vigente, que caracteriza **prestação de serviço de manutenções prediais preventiva e corretiva**, definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados à Contratante.

Tendo em vista a proximidade do início do período letivo escolar, a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 19.718.360/0001-51, autoriza a partir desta data, a empresa **CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA.**, celebrado entre as partes através do Processo Licitatório 090/2023, Concorrência Pública 007/2023, a dar início aos **serviços emergenciais**, objeto do contrato acima, referente as manutenções da Escola Municipal Espiridião Pereira, localizada em Mato Dentro, neste município.

Conselheiro Lafaiete - MG, 11 de janeiro de 2024.

Kildare Bittencourt Dutra
Secretário Adjunto de Obras e
Meio Ambiente

Secretaria Municipal de
Educação

Luísa Silva
Engenheira Civil

Ciente,

HUDSON DALMO FARIA
FERNANDES:09252216600

Assinado de forma digital por HUDSON
DALMO FARIA
FERNANDES:09252216600
Dados: 2024.02.07 09:01:52 -03'00'

CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente.

Administração 2021/2024

- **ORDENS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS:**— Definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE.

A Secretaria solicitante do serviço emergencial deverá apresentar ofício para a Secretaria de Obras e Meio Ambiente com justificativa para sua emergencialidade;

As ordens de serviços emergenciais deverão ser iniciadas em até 72 (setenta e duas) horas, a contar da sua emissão;

Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando minimizar os transtornos/prejuízos decorrentes. Para tanto, a CONTRATADA deverá providenciar, com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente nas áreas de hidráulica e eletricidade;

Após o início do atendimento de serviço emergencial, a CONTRATADA terá um prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar a planilha com os serviços a serem realizados.

É de responsabilidade da CONTRATADA zelar para que os serviços prestados emergencialmente estejam de acordo com as planilhas de referência (SEINFRA e SINAPI).

- **ORDENS DE SERVIÇOS COMUNS** – Definem-se como comuns os serviços que não necessitam de atendimento imediato devendo ser iniciados no prazo regulamentado de até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da OS.

A demora para dar início ou para concluir os atendimentos emergenciais e comuns por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional será comunicada pela Fiscalização de imediato à CONTRATADA, podendo gerar penalidades em caso de não atendimento satisfatório.

8. CAPACIDADE TÉCNICA

A execução será por empresa tecnicamente especializada. A comprovação se dará conforme segue, e a documentação constante da inscrição deve estar organizada, completa e apresentada na seguinte ordem com dispositivos separadores os mais claros possíveis:

a) Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Arquitetura (CAU), em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG, para assinatura do contrato.

b) Declaração indicando quais profissionais que serão os responsáveis técnicos pela empresa encarregados da execução do serviço;

c) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional(is) de nível superior, o(s) qual(is) será(ão) o(s) RT(s) da obra (conforme alínea b), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico), devidamente registrado(s), na entidade profissional competente, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços similares de construção civil e semelhantes ao objeto da presente licitação, que deverão estar, preferencialmente grifados, para melhor visualização quando da análise pela Comissão.

d) Prova de que os profissionais, designados como Responsáveis Técnicos pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 02/2024

CI

DATA: 03/01/2024

FL.: 1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Secretaria Municipal de Educação

A/C: Albano Tibúrcio

CÓPIA

ASSUNTO: Solicitação de Empenho

Prezado,

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Adjunto de Obras e Meio Ambiente Kildare Bittencourt Dutra, em atendimento a solicitação desta secretaria para reparos na Escola Municipal Espiridião Pereira, localizada nesta cidade, estamos encaminhando planilha de quantidades para empenho. Assim que estiver pronto, gentileza nos enviar.

Desde já agradecemos.

Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Recebido
04/01/24



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

Relatório de Visita – Manutenção Predial

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

DATA DA VISITA: 19/12/2023

Horário: Manhã

Local Visitado: Escola Municipal Espiridião Pereira

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Nome do funcionário da prefeitura que acompanhou: Carline

Serviços Solicitados:

- **TROCA DE VIDROS**
 - Banheiro professores - 40x20cm
 - Sala 2 – 80x20cm
 - Sala 3 – 80x20cm (3 vidros)
 - Sala 1- 30x30cm
 - Cantina – 1,18x40cm
- **PORTAS**
 - Sala dos professores – 80cm (Completa)
 - Sala 2 e 3 – Só fechadura
 - Sala 1 – 70 cm (completa)
 - Cozinha – 80cm (completa)
- **JANELAS**
 - Reparo em todas as grades
 - Sala 1 – Puxador
 - Cozinha - Puxador
- **REVESTIMENTOS**
 - Piso Cozinha – 6x2,40m
 - Parede Cozinha - 30,75m²
- **PÁTIO**
 - Reparar rejuntas
 - Guarda corpo – 18,35m
 - Portãozinho – 80cm

Assinatura

Fiscal de Contrato

Empresa

Secretaria Responsável

- Pintura em perfil do telhado (56,4m²)
- Pintura em madeira (7m²)
- **TELHADO COMPLETO**
 - Telha Galvanizada – 19 x 12m
 - Perfil metálico
- **VÁLVULA DE PIA INOX – COZINHA**
- **TAMPA CEGA**
- **FAIXA ANTIDERRAPANTE PARA RAMPA**
- **REPARO NO PORTÃO DE ENTRADA**
- **REBOCO GERAL – 40M²**
- **PINTURA GERAL COM BARRADO EM TINTA ESMALTE**

Não foi relatado nenhum problema com a parte elétrica!

Ischa

Fiscal de Contrato

Empresa

Secretaria Responsável

PLANILHA RESUMO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	DATA:	03/01/2024
NOME DA OBRA:	ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRIDIÃO PEREIRA - MATO DENTRO	BDI:	25,92%
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA	DESC. SINAPI:	25,45%
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023	DESC. SEINFRA:	21,58%
OBJETO:	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS		
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0	R\$ 99.636,5800	R\$ 78.135,0060
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:	R\$ 99.636,58	R\$ 78.135,01
------------------------------	---------------	---------------

OBS.:	Levantamento:	Conferência:
Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação.	ARROJADO LISBOA	 Lulsa Silva Eng. Civil





8	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																			8,00	hora
	REPARO PORTA COZINHA																			8,0000	
9	APLICAÇÃO DE FAIXA/FTA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO																			16,00	-M
	RAMPA																			16,0000	
10	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"x4" INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA																			1,00	un
	RAMPA																			1,0000	
11	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GUATEIA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAXILE/PERFIL																			0,47	M
	COZINHA																			0,4720	
12	VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 4" X 1 1/2"																			1,00	U
	COZINHA																			1,0000	
13	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO																			30,24	M
	COZINHA																			30,2400	
14	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO																			16,00	M
	COZINHA																			16,0000	
15	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA																			18,35	M
	PATIO																			18,3500	
16	PORTÃO DE GRADÉ COLOCADO COM CADIEADO																			1,04	M2
	PATIO																			1,04	
17	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO																			56,40	M2
	PATIO																			56,40	

Luísa Cássia da Silva
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA MG 347891



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	05/02/2024	
NOME:	ESCOLA MUNICIPAL ESPIRIDIÃO PEREIRA - MATO DENTRO		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPAROS INTERNOS E EXTERNOS				
Nº AE	263/2024		Nº NE:	588/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	02./2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 72.529,6108	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:		R\$ 72.529,61
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FAIUA Assinado de forma digital por HUDSON DALMO FAIUA em 05/02/2024 10:52:16-0500 FERNANDES:09252216600 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil e CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Adriano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRIDÃO PEREIRA - MATO DENTRO												
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
ARROJADO USBOA												
02/2023												
2023/08_SETOR_LESTE_COM_DESONERAÇÃO												
2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO												
263/2024												
Nº AE												
Nº MED: 588/2024												
ORDEN DE SERVIÇO												
02 / 2024												
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-48494	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	10,08	10,08			R\$ 7,90	R\$ 79,60	10,08	100,00%
2	SEINFRA	ED-51155	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHOPERFIL	um	0,64	0,00			R\$ 131,39	R\$ 0,00	0,00	0,00%
3	SEINFRA	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	2,00	2,00			R\$ 875,12	R\$ 1.750,24	2,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-49700	FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	2,00	2,00			R\$ 111,23	R\$ 222,46	2,00	100,00%
5	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	1,00	1,00			RS 349,26	R\$ 349,26	1,00	100,00%
6	SEINFRA	ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	1,00	1,00			RS 110,58	R\$ 110,58	1,00	100,00%
7	SEINFRA	ED-49697	DOBRAÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"x2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	3,00	0,00			RS 20,05	R\$ 0,00	0,00	0,00%
8	SEINFRA	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8,00	8,00			RS 26,77	R\$ 214,18	8,00	100,00%
9	SEINFRA	ED-50574	APLICAÇÃO DE FAIXA/FTTA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	16,00	0,00			RS 13,45	RS 0,00	0,00	0,00%
10	SEINFRA	ED-15781	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"x4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	1,00	0,00			RS 15,93	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11	SEINFRA	ED-51155	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA	um	0,47	0,00			RS 131,39	RS 0,00	0,00	0,00%

W. Silva

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIDAS				VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
12	SEINFRA	ED-50336	VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 4" X 1 1/2"	U	1,00	1,00			R\$ 99,13	R\$ 99,13	1,00	100,00%
13	SEINFRA	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	30,24	30,24			R\$ 69,45	R\$ 2.100,13	30,24	100,00%
14	SEINFRA	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	16,00	16,00			R\$ 87,08	R\$ 1.393,24	16,00	100,00%
15	SEINFRA	ED-32104	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESF. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESF. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M2	18,35	18,35			R\$ 700,63	R\$ 12.856,52	18,35	100,00%
16	SEINFRA	ED-50983	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	m2	1,04	0,00			R\$ 381,26	R\$ 0,00	0,00	0,00%
17	SEINFRA	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m2	56,40	0,00			R\$ 34,82	R\$ 0,00	0,00	0,00%
18	SEINFRA	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	7,00	7,00			R\$ 26,95	R\$ 188,62	7,00	100,00%
19	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESF. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	40,00	40,00			R\$ 31,93	R\$ 1.277,30	40,00	100,00%
20	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	310,91	310,91			R\$ 13,92	R\$ 4.327,73	310,91	100,00%
21	SEINFRA	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	207,08	207,08			R\$ 22,29	R\$ 4.616,81	207,08	100,00%
22	SEINFRA	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	228,00	221,79			R\$ 15,36	R\$ 3.407,24	221,79	97,28%


 22/08/2024

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
23	SEINFRA	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	221,79	221,79			R\$ 97,80	R\$ 21.690,53	221,79	100,00%
24	SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	806,40	700,00			R\$ 25,49	R\$ 17.846,04	700,00	86,81%
SUBTOTAL:										R\$ 72.529,61		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 72.529,61		
PERCENTUAL EXECUTADO:										92,83%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO									R\$	78.135,01		
SALDO									R\$	5.605,40		
FISCALIZAÇÃO:					CONTRATADA:				RESPONSÁVEL TÉCNICA:			
					Atividade de Serviço de Engenharia Hudson Dalmo Faria Fernandes CPF: 030.912.211-660 Insc. Estadual: 0202311660-0 Data: 30/03/2016 14:10:00 4779				 Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 255530/D 02/01/2024			
					 Luisa Silva Engenheiro Civil				 Kildare Bittencourt Dutra			
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS:					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
					Prof. Albano							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL ESPÍRIDIO PEREIRA

05/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. PERÍMETRO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO VÃO (m2)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	PESO (kg)	DENSIDADE (kg/m3)	DMT (KM)	QUANTIDADE (unit)	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLANTAMENTO													10,08	m2
	ESQUADRIAS													10,0800	
2	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL														M2
3	JANELAS		0,80	0,2000								4,00		0,0000	
	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO													2,00	U
	SALAS													2,0000	
4	FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES													2,00	UM
	SALA 2 - 3													2,0000	
5	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM													1,00	U
	COZINHA													1,0000	
6	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES													1,00	un
	PORTA - COZINHA													1,0000	
7	DOBRADEIRA DE FERRO, MEDIDAS (3"x2 1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO														un
	PORTA - COZINHA													0,0000	

vshg

[illegible]

12/1/52



~~1~~

11


ARROJADO LISBOA				Relatório n°	1
				Data do relatório	12/01/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

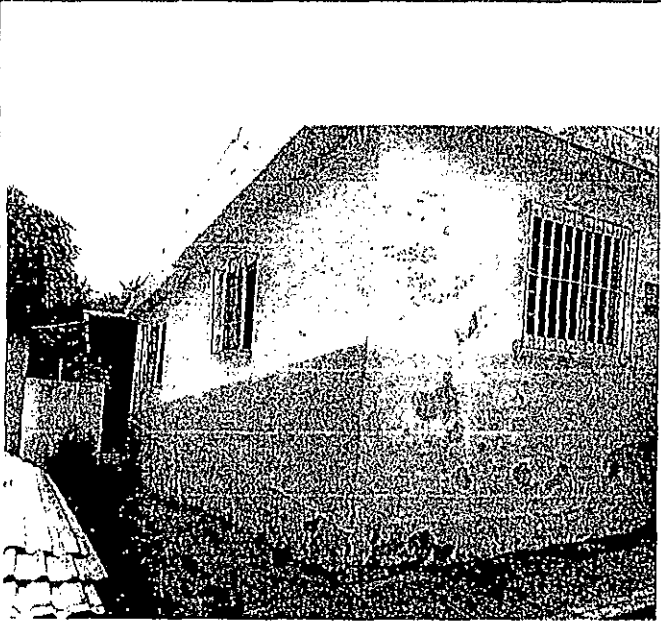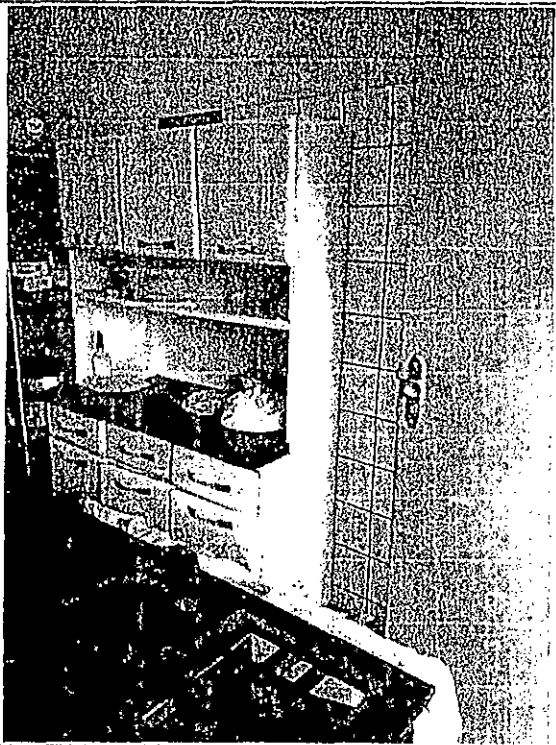Fotos (4)	
	



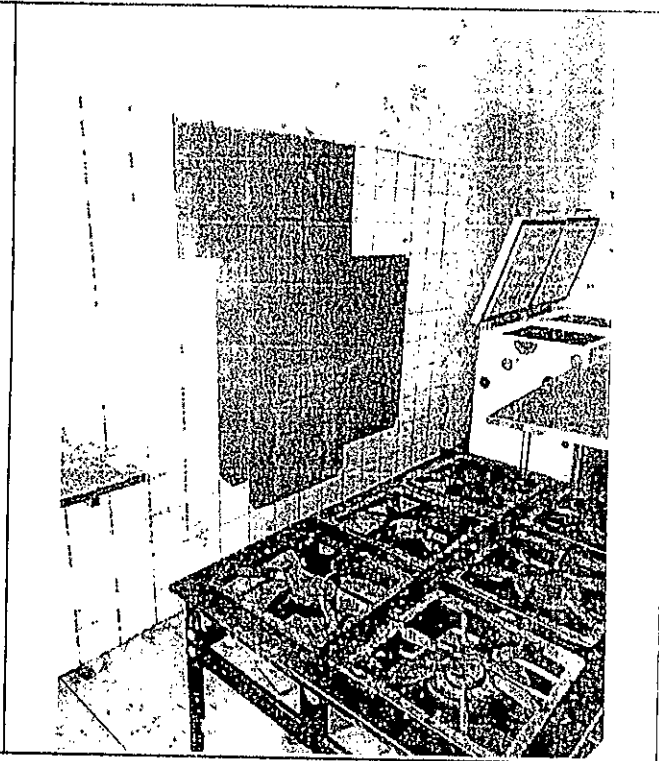


Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	2
				Data do relatório	15/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG, Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

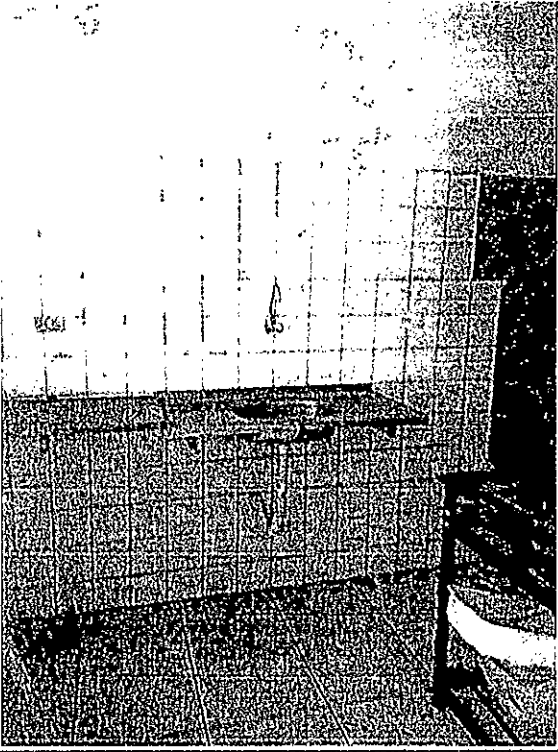Fotos (1)	
	

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA		Relatório n°	3		
		Data do relatório	16/01/2024		
		Dia da semana	Terça-Felra		
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato			
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA		Prazo contratual	21 dias	
Local			Prazo decorrido	0 dias	
Contratante		Responsável	ENG, Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (1)	
	

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	4
				Data do relatório	17/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (1)	
	

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	5
				Data do relatório	18/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (1)	
	

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA

Relatório nº	6
Data do relatório	19/01/2024
Dia da semana	Sexta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	21 dias
Prazo decorrido	0 dias
Prazo a vencer	21 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA
Local	
Contratante	
Responsável	ENG. Daniele silva


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)

INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA

Em Andamento

Fotos (2)

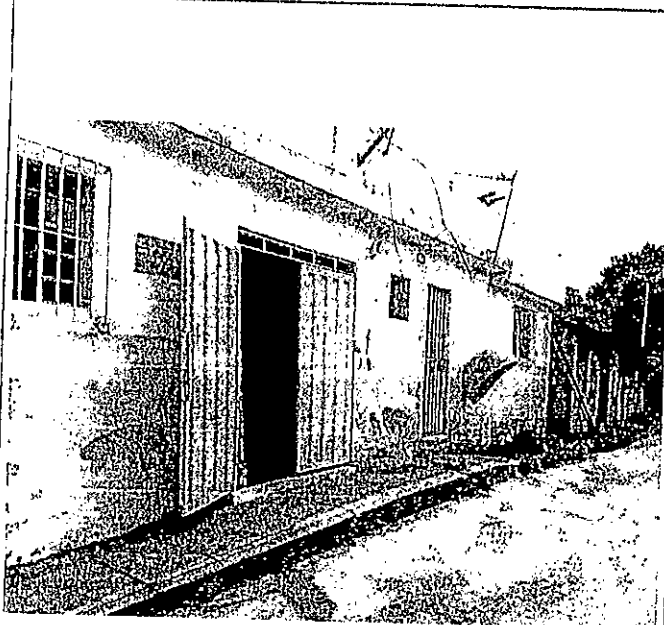

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	7
				Data do relatório	22/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento




Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	8
				Data do relatório	23/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

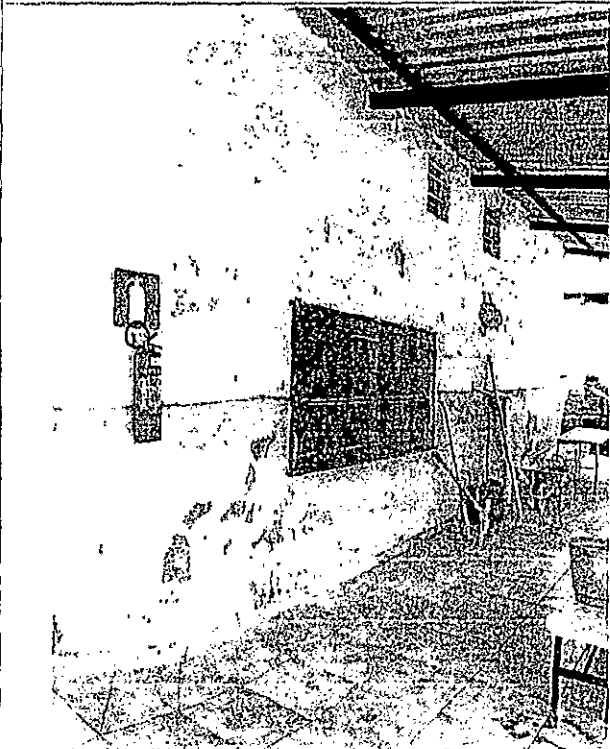Fotos (1)	
	


Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	9
				Data do relatório	24/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

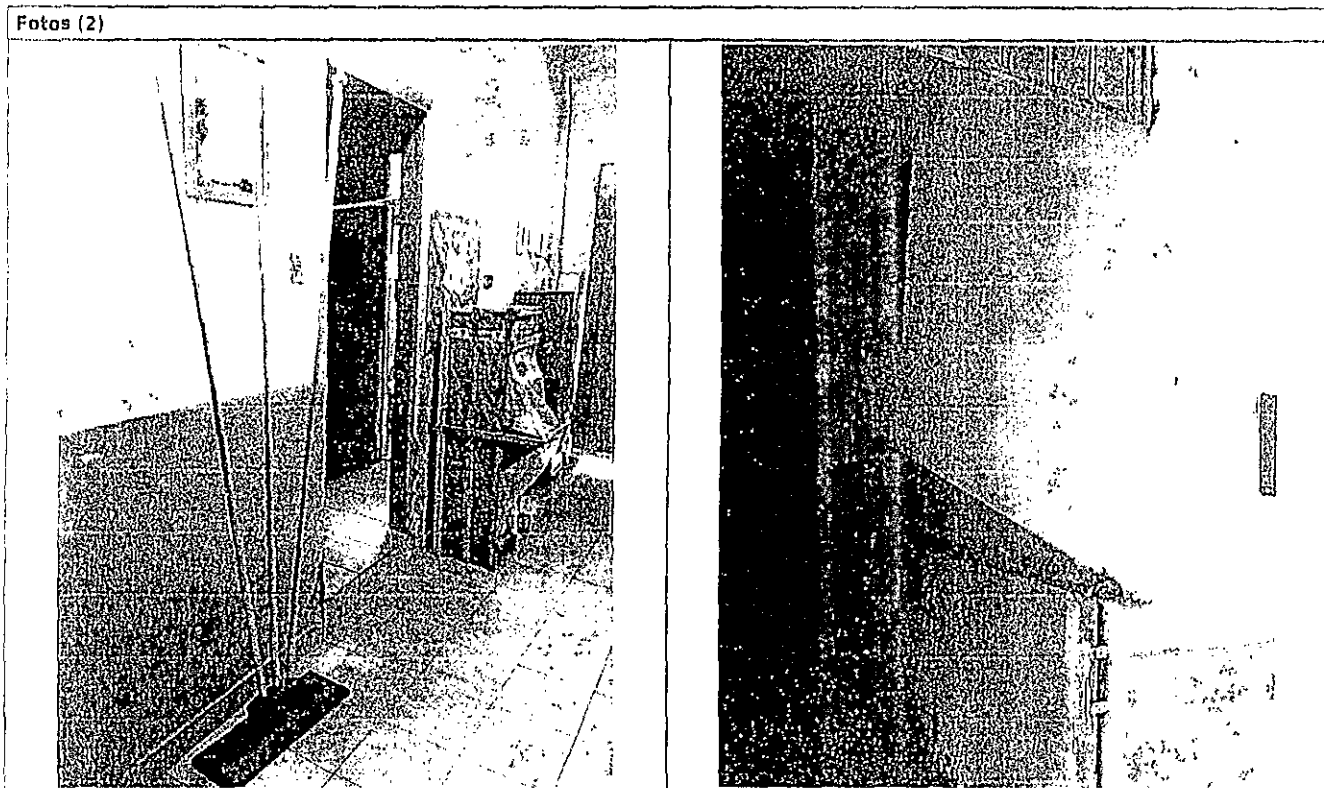


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	10
				Data do relatório	25/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

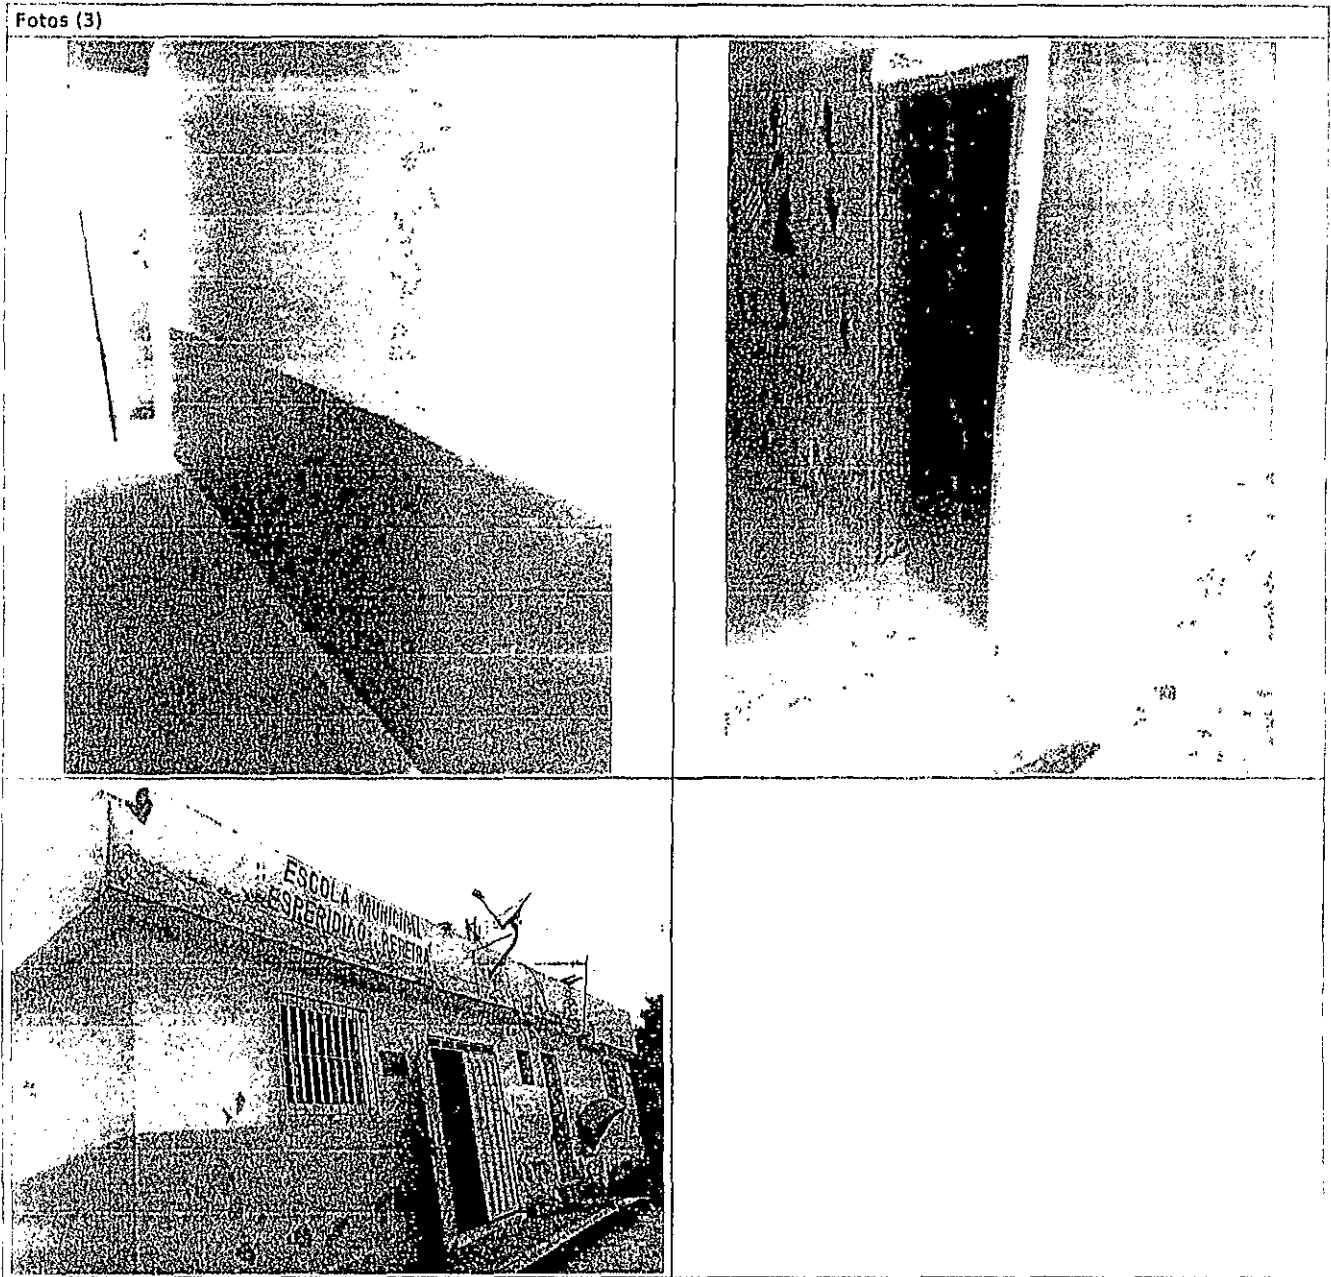

Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA

Relatório n°	11
Data do relatório	26/01/2024
Dia da semana	Sexta-Feira
Contrato	
Prazo contratual	21 dias
Prazo decorrido	0 dias
Prazo a vencer	21 dias

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA	
Local		
Contratante	Responsável	ENG. Daniele silva


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)


INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA

Em Andamento

Fotos (3)

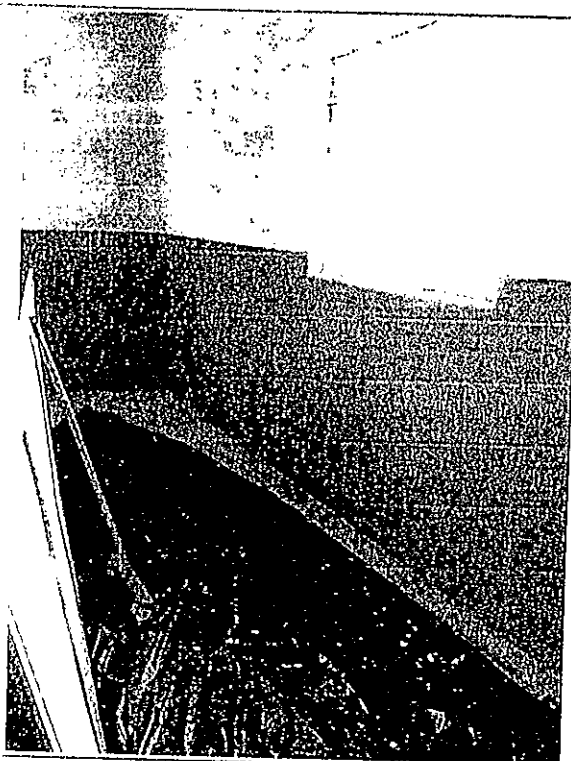

10/11

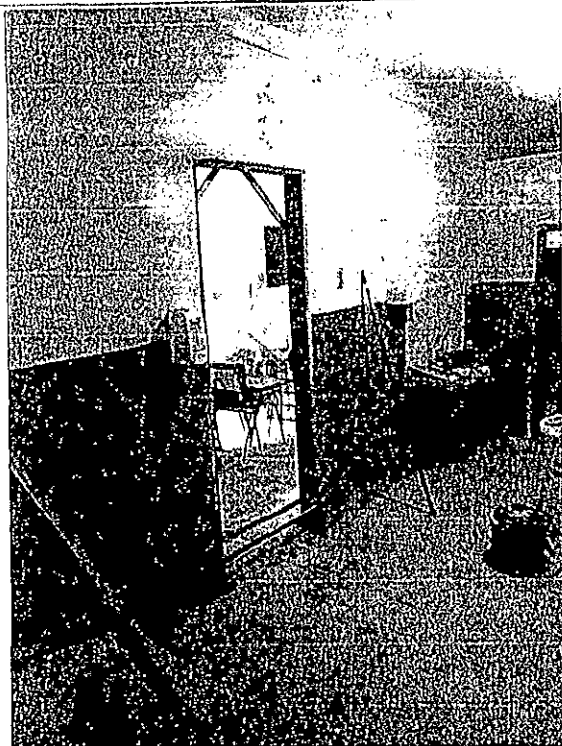


Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	12
				Data do relatório	29/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

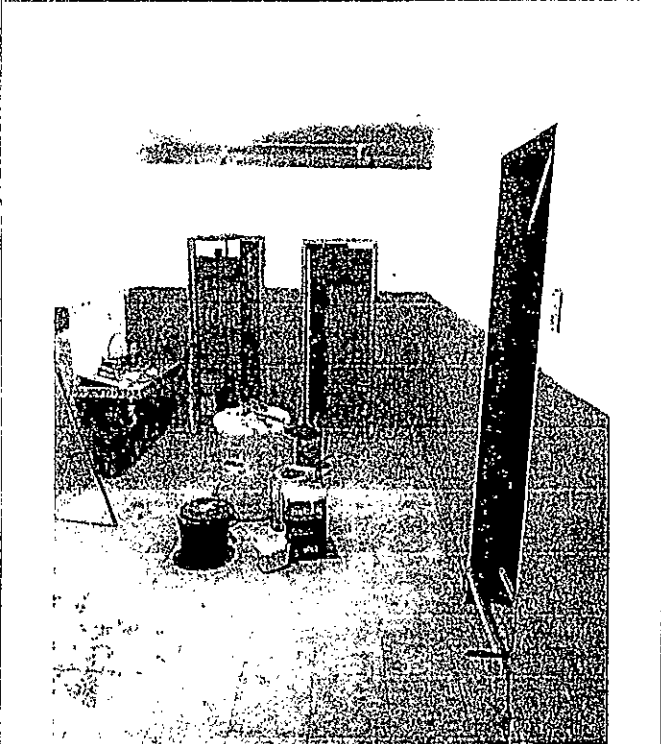Fotos (1)	
	

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	13
				Data do relatório	30/01/2024
				Dia da semana	Terça-feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (1)	
	


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	14
				Data do relatório	31/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

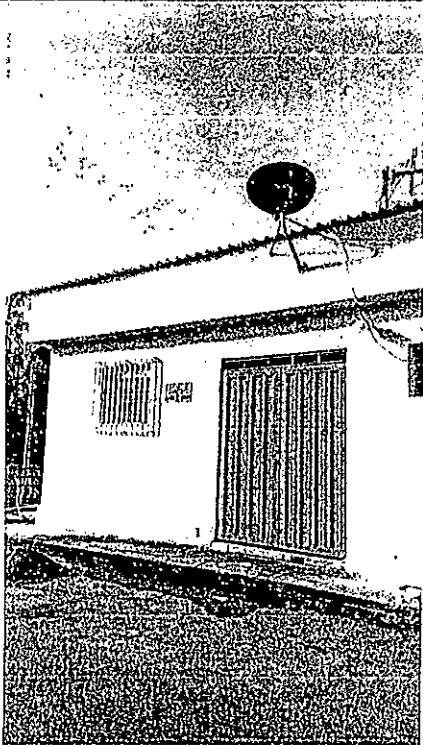Fotos (1)	
	

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	15
				Data do relatório	01/02/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (1)	
	


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	16
				Data do relatório	02/02/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIÃO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

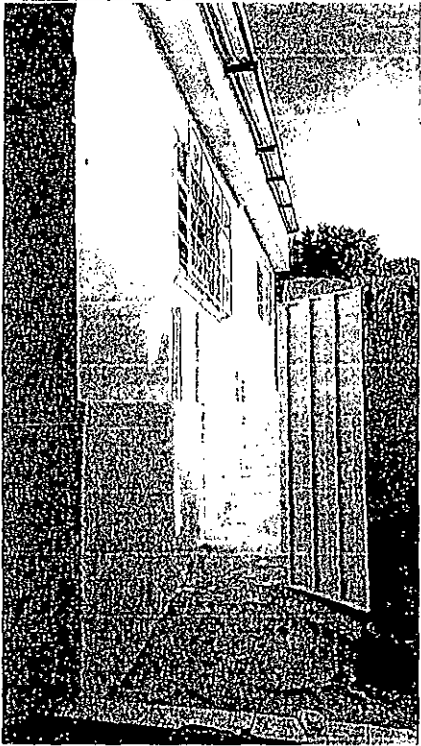Fotos (1)	
	



Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	17
				Data do relatório	03/02/2024
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

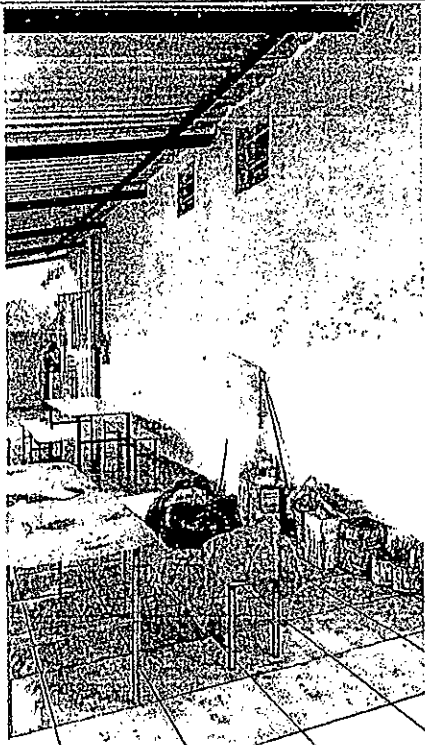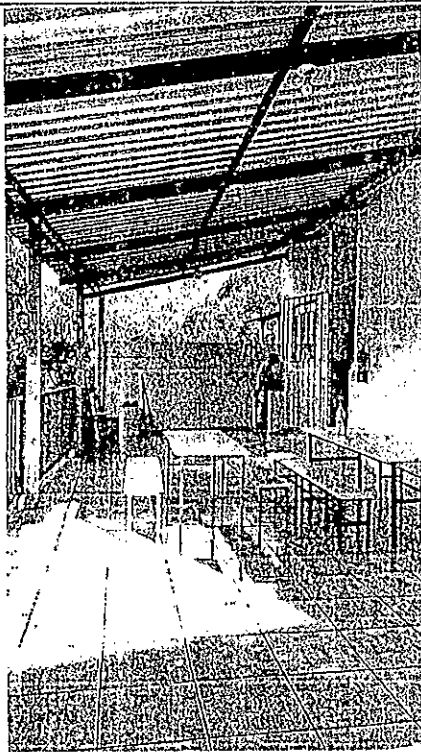Fotos (2)	
	

Assinatura

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório n°	18
				Data do relatório	04/02/2024
				Dia da semana	Domingo
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRÍDIO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável




Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento




Dy

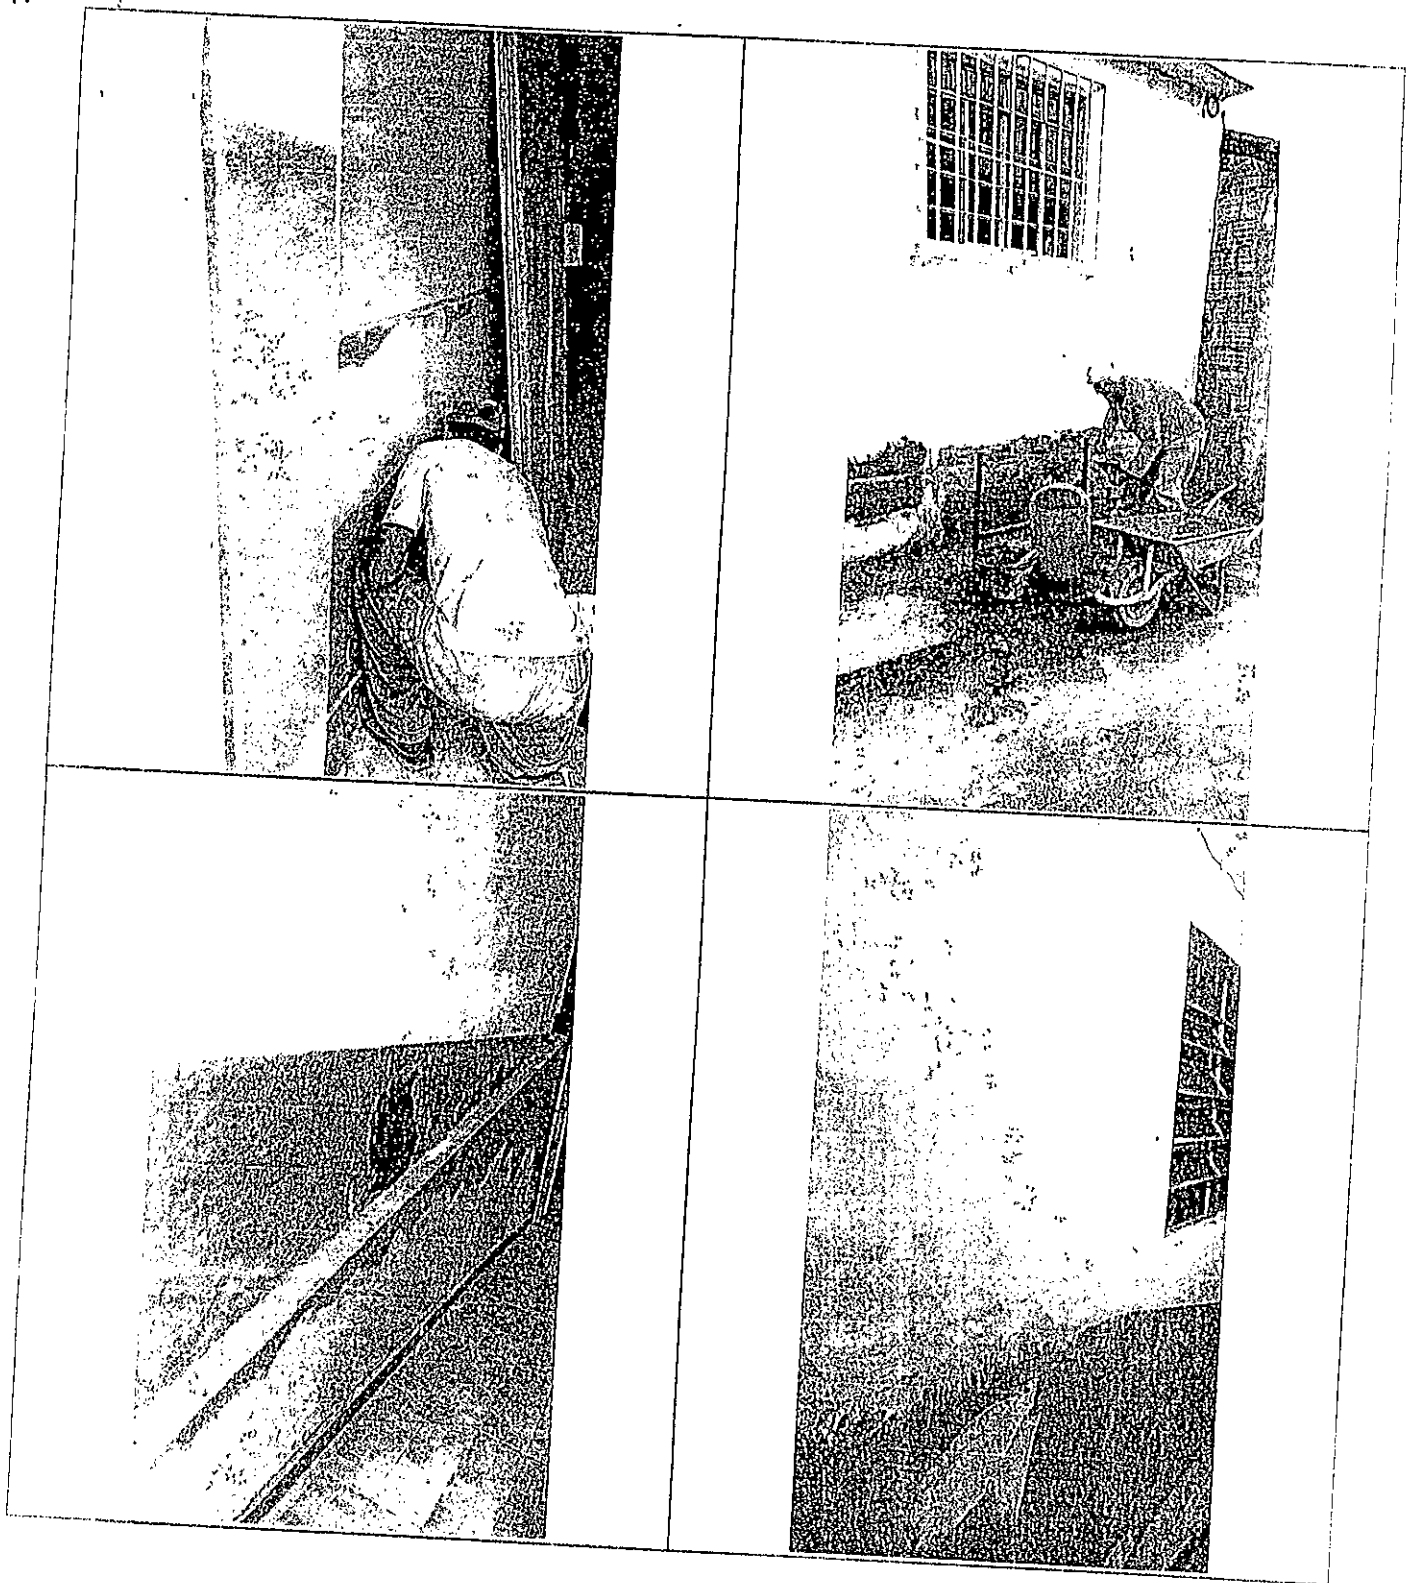

Handwritten signature

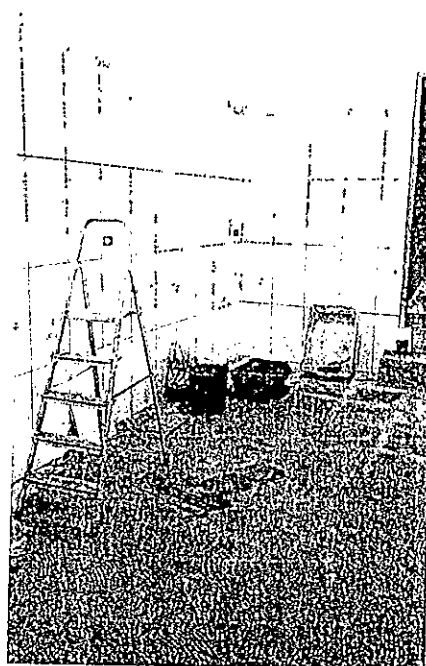
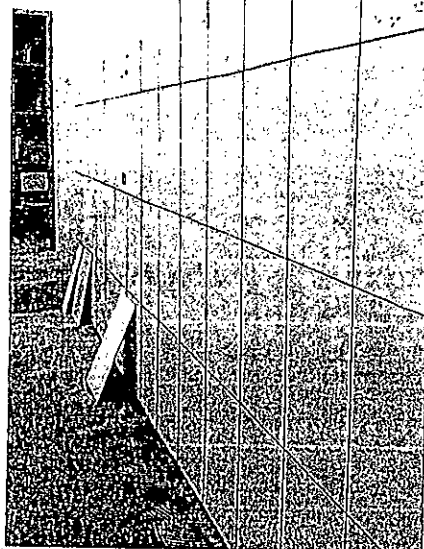


Handwritten signature or mark.




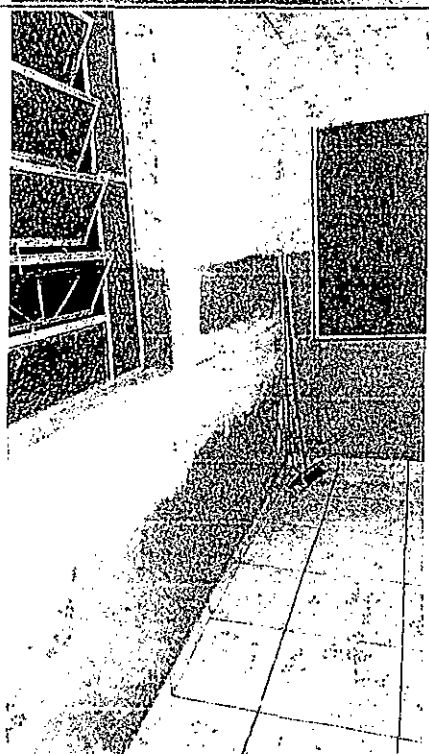


Assinatura






Assinatura

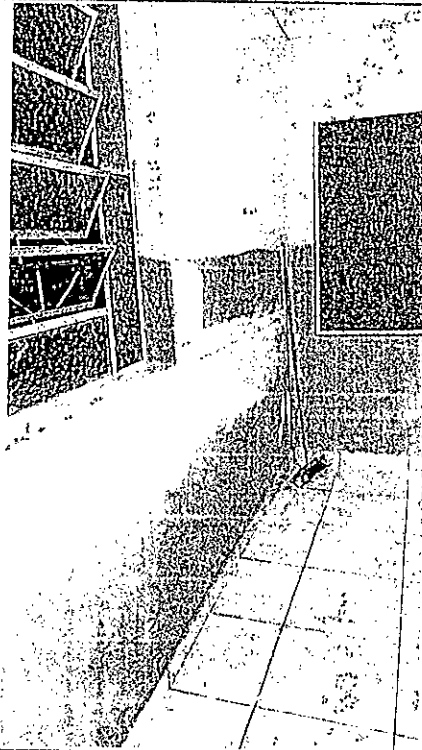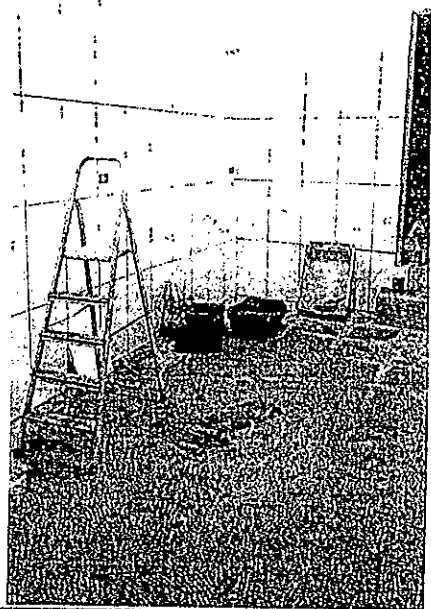


Def

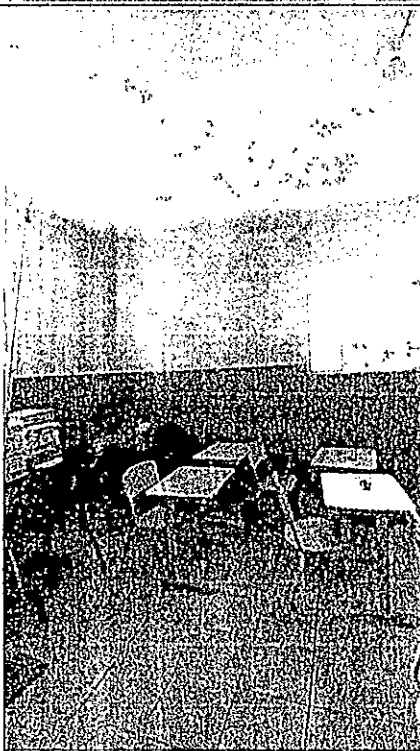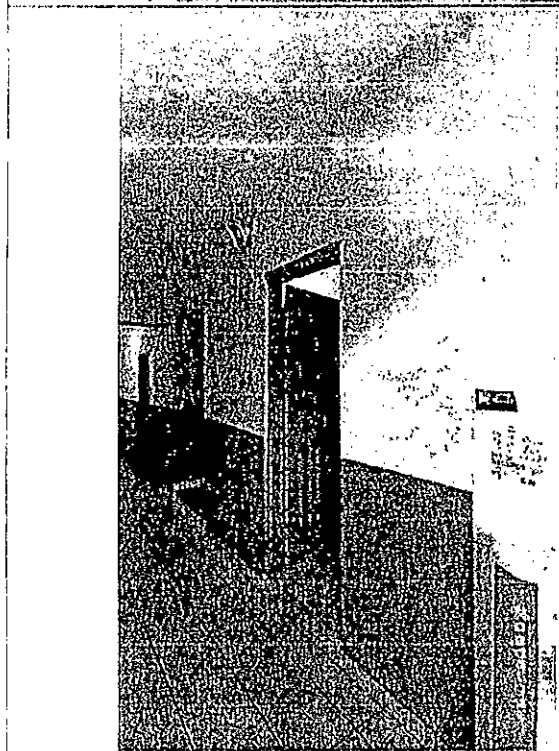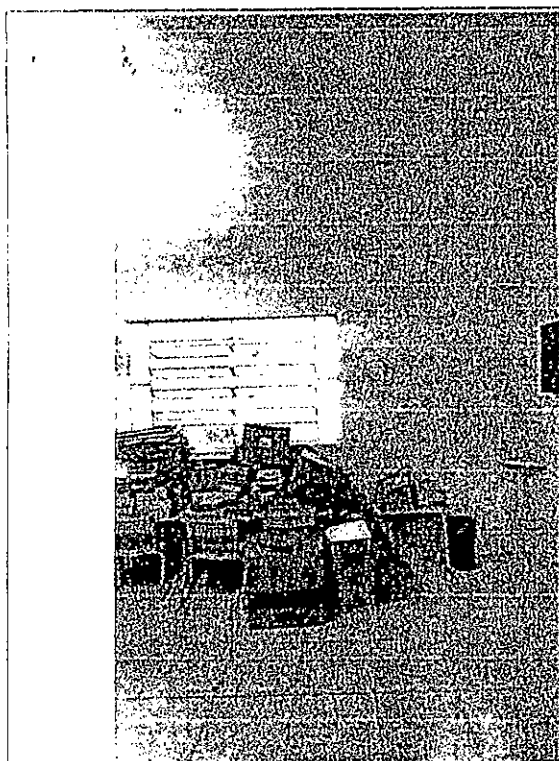

Handwritten signature

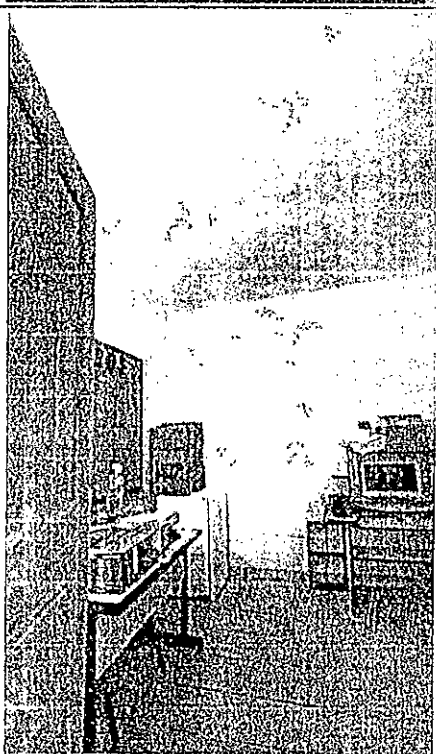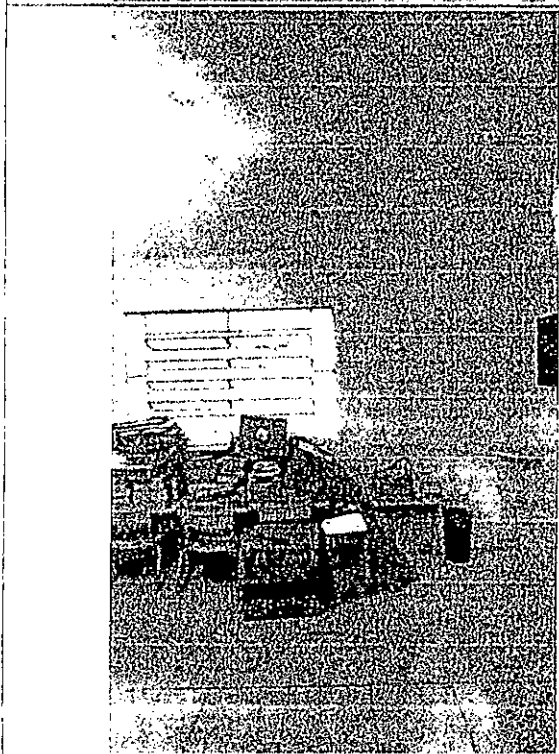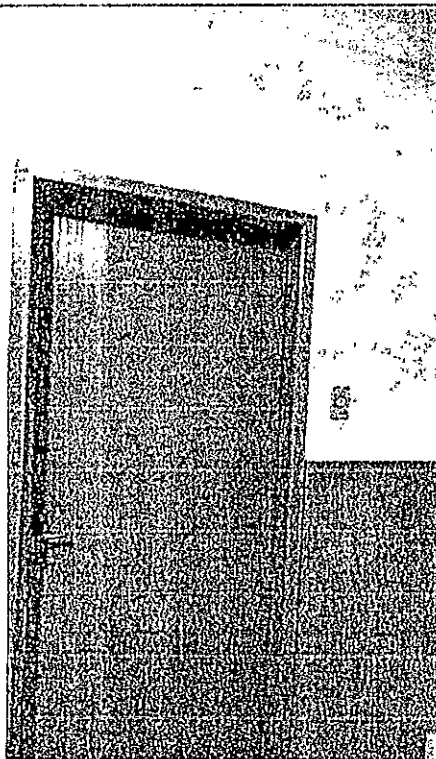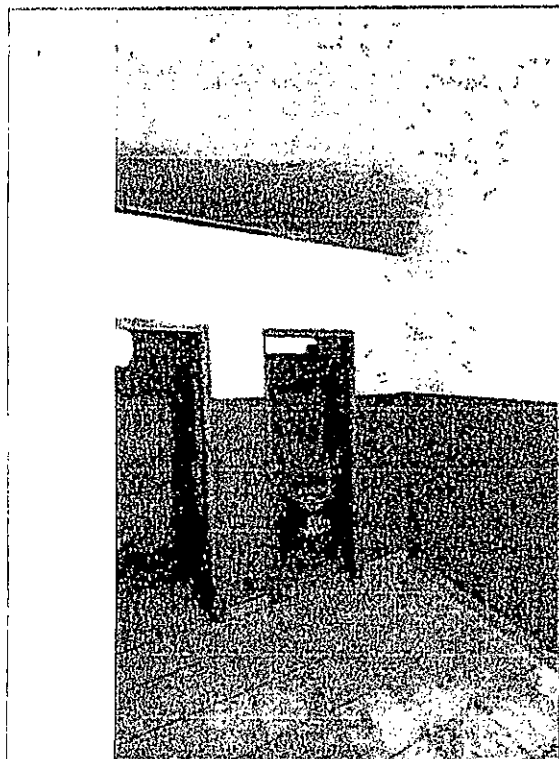

Handwritten signature

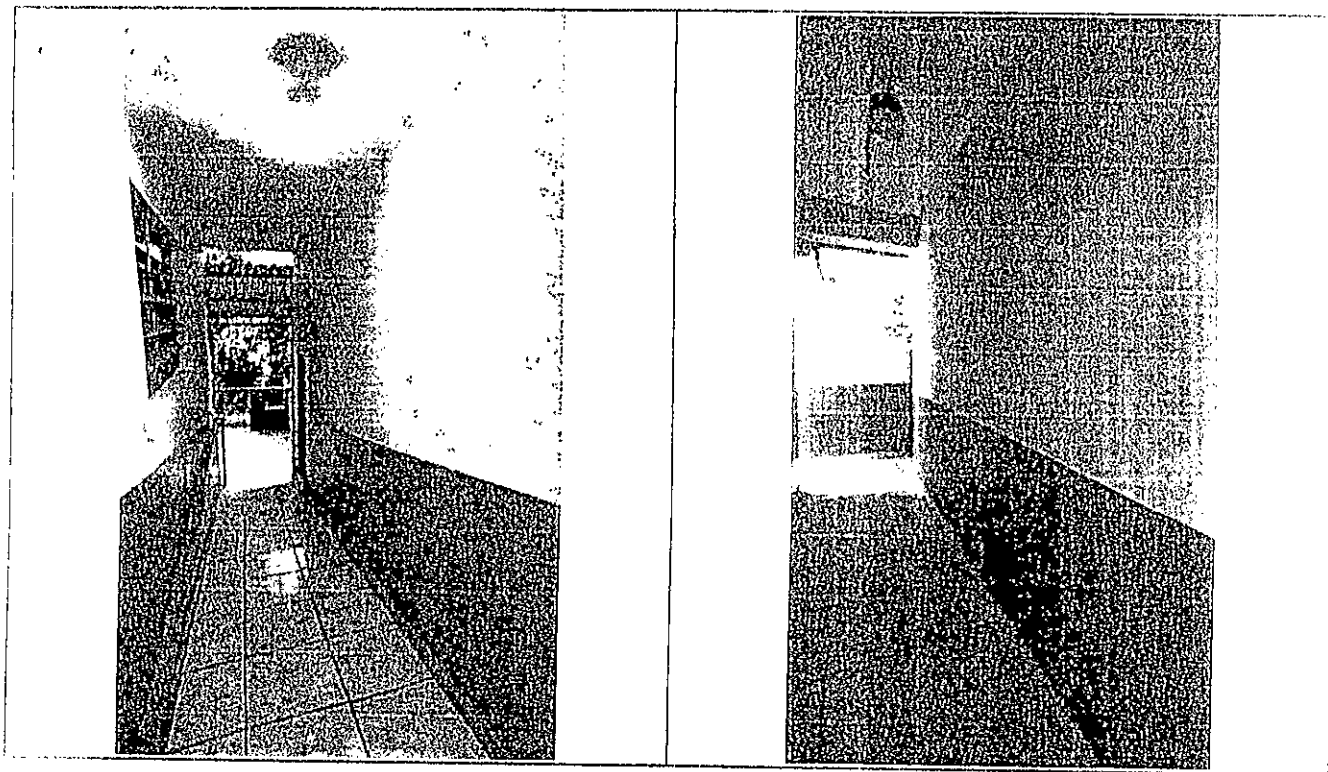

Handwritten signature


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	8
				Data do relatório	23/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Prazo contratual	21 dias
Local				Prazo decorrido	0 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele Silva	Prazo a vencer	21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INÍCIOS DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

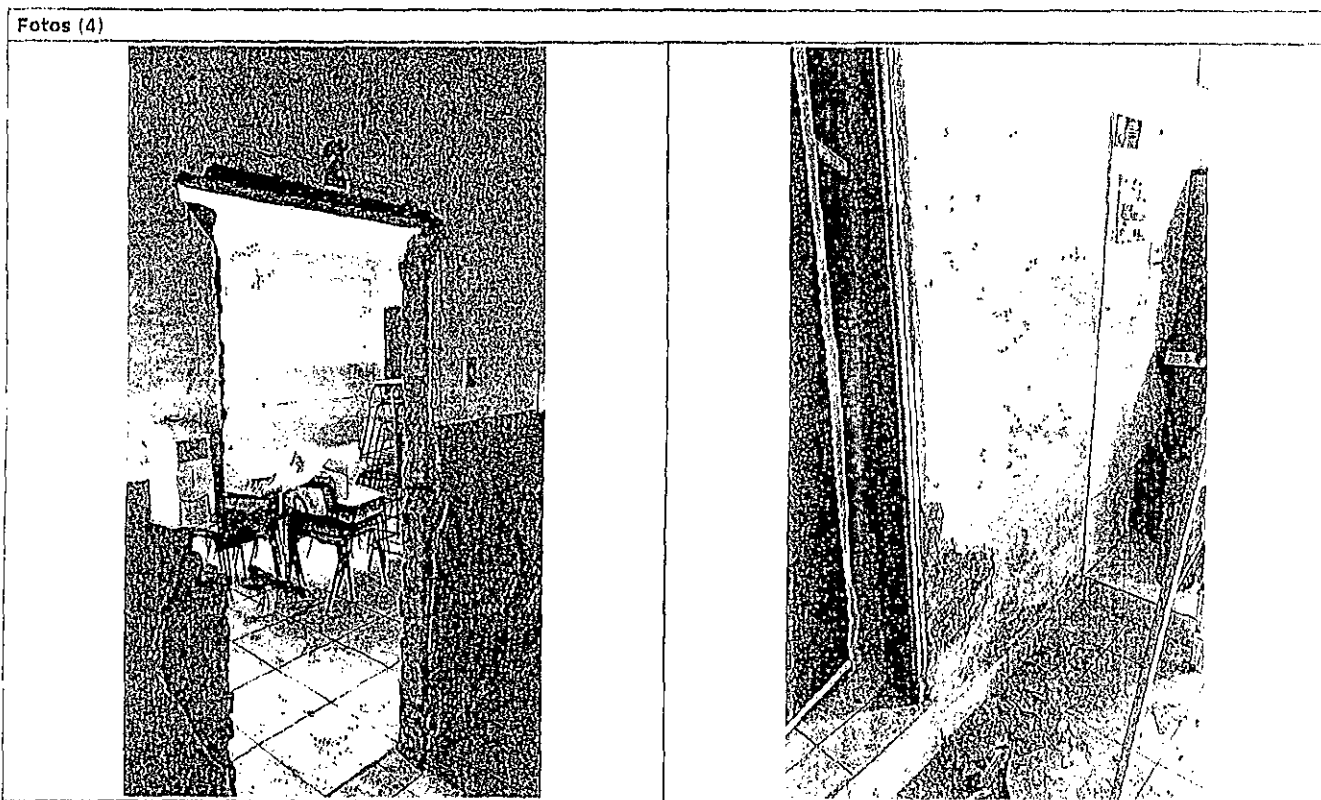

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA AROUJO LISBOA LTDA	Nº CONTROLE: ANR0WZRSN10000-0	Nº ARQUIVO: F1C3Q9FRHMD0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617	UF: MG	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: Jeceaba	CEP: 35498-000	TELEFONE: 31-85180219
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620
	744	779
		TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

-O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17 N° ARQUIVO: F1c3Q9fRhmd0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: ANR0wuzRSN10000-0
TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17 N° CONTROLE: HtdTHIUDelw0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 CENTRO JECEABA 35498000 MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.483,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.483,20
REM 13° SALÁRIO 414,66
DEPÓSITO 311,82
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES

2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.483,20
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 277,12
VAL DEVIDO PREV SOC 277,12

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.483,20
REM 13° SALÁRIO 414,66
DEPÓSITO 311,82
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAL TRABALHADORES

2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17 Nº ARQUIVO: F1C3Q9FRhmd0000-3
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
Nº CONTROLE: ANR0wuzRSN10000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13º SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	414,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	277,12	DEPÓSITO	311,82
VAL DEVIDO PREV SOC	277,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2
TOTAL A RECOLHER		311,82	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:45:59
PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
BASE CÂL 13º SAL PREV SOC
CONTRIB SEG DEVIDA
CAT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

ALLEX DOS ANJOS NASCIMENTO	1.741,60	207,33	212.72536.89-2	11/12/2023	01	155,91	07166
			0,00	138,56			0,00
MIGUEL MARCOS VTEIRA	1.741,60	207,33	113.40144.17-9	11/12/2023	01	155,91	07152
			0,00	138,56			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

414,65

C,00

277,12

311,82

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG: 0202/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA
UF: MG
CEP: 35498-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000
Nº ARQUIVO: F1C3Q9FRMD0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

CAT	QUNT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00
TOTAIS:	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA AROUADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FIAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA AROUADO LISBOA LTDA N° DE CONTROLE: HEDTHUDLW0000-2 INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JECEABA UF: MG CEP: 35498-000 TELEFONE: 0031 8518 0219 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 277.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277.12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAI: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (Lei 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEIIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ANR0WUZRSN10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: F1C3Q9FRhnd0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA UF: MG

CEP: 35498-000

BATIDO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00
TOTAIS:	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA N° DE CONTROLE: ANR0WUZRSN10000-0 N° ARQUIVO: FL3Q9FRhmd0000-3
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JECEABA UF: MG CEP: 35498-000 CNAE: 7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.483,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 414,66
2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
311,82 0,00 0,00 0,00 311,82

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA N° DE CONTROLE: ANR0WU2RSN10000-0 N° ARQUIVO: F1C3Q9Fhmd0000-3
COM: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JECÉBABA UF: MG CEP: 35498-000 TELEFONE: 0031 8518 0219 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277.12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (Lei 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	O1:	0
O2:	0	O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0	O7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	26:	0						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.897,86

DEPÓSITO

311,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

311,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	0,00		50.361.051/0001-17	0,00		2003
277,12		0,00			0,00	277,12
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES						
						507
						0,00



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

202400000000002
Emissão
05/02/2024 17:01:03
Código de Verificação
B0C9-4F49

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA

CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17

Inscrição Municipal:

0000000000000004547

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO -
CEP: 35498000

Inscrição Estadual:

Município: 3135407 - JECEABA/MG

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51

CEI:

Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026

Inscrição Municipal:

Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Inscrição Estadual:

E-mail:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA MUNICIPAL RANCHO NOVO

BASE DE CALCULO MÃO DE OBRA: 20.459,58

BASE DE CALCULO MATERIAIS: 30.689,38

Dados Bancários

Agência: 3116

C/C: 39.069-0

Sicoob

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
51.148,96	51.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.148,96
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00
- ISS: R\$ 0,00 (3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselhoelafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 264/2024

Processo Administrativo: 90/2
Contrato: 131/2
Nº da Licitação: 98/2
Modalidade: Concorrência
Data da Contratação: 09/11/21
Data da Solicitação: 04/01/21
Sequencial do Contrato: 11

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Data da tramitação: 04/01/2024

589

25/01

Fornecedor: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA

Telefone(s): 3185180219

CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS, 617, Centro - 35498-000, JECEABA - MG

E-mail: contabilidadejeceaba@outlook.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitação.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Condição de Pagamento: CONFORME CONTRATO

Prazo de Entrega: 05 DIAS ÚTEIS DA ORDEM DE SERVIÇO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
Observações: RIMS 75/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E MANUTENÇÕES NA E. M. PADRE JOSÉ LOBO DA SILVEIRA.

Empenho:

Despesas:

102 - 25.001.12.361.0012.2057.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA

Desdobramento:

Recurso: 1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,041168	SV	73548	Serviço de engenharia - Prestação de serviços de		2.352.600,0000	96.850,68
Total Geral:						96.850,68	

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Janeiro de 2024

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
Assinatura e Carimbo do Responsável



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Administração: 2021/2024

ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL Nº 04/2024

Devido a necessidade de adequações na Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira, consequentemente, possível atraso do início do período letivo. Segundo o Termo de Referência (em anexo) do contrato vigente, que caracteriza prestação de serviço de manutenções prediais preventiva e corretiva, definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados à Contratante.

Tendo em vista a proximidade do início do período letivo escolar, a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 19.718.360/0001-51, autoriza a partir desta data, a empresa CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA., celebrado entre as partes através do Processo Licitatório 090/2023, Concorrência Pública 007/2023, a dar início aos serviços emergenciais, objeto do contrato acima, referente as manutenções da Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira, localizada em Rancho Novo, neste município.

Conselheiro Lafaiete - MG, 11 de janeiro de 2024.


Kildare Bittencourt Dutra
Secretário Adjunto de Obras e
Meio Ambiente

Secretaria Municipal de
Educação


Luísa Silva
Engenheira Civil

Ciente,

HUDSON DALMO FARIA
FERNANDES:09252216600
Assinado de forma digital por
HUDSON DALMO FARIA
FERNANDES:09252216600
Dados: 2024.02.07 08:59:35 -03'00'

CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente
Rua Coronel Albino, 160 - Fonte Grande
CEP: 36.400-000 obras@conselheiralafaiete.mg.gov.br
Fone (31): 99239 5582 - (31) 99239 5505



- **ORDENS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS** – Definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE.

A Secretaria solicitante do serviço emergencial deverá apresentar ofício para a Secretaria de Obras e Meio Ambiente com justificativa para sua emergencialidade;

As ordens de serviços emergenciais deverão ser iniciadas em até 72 (setenta e duas) horas, a contar da sua emissão;

Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando minimizar os transtornos/prejuízos decorrentes. Para tanto, a CONTRATADA deverá providenciar, com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente nas áreas de hidráulica e eletricidade;

Após o início do atendimento de serviço emergencial, a CONTRATADA terá um prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar a planilha com os serviços a serem realizados.

É de responsabilidade da CONTRATADA zelar para que os serviços prestados emergencialmente estejam de acordo com as planilhas de referência (SEINFRA e SINAPI).

- **ORDENS DE SERVIÇOS COMUNS** – Definem-se como comuns os serviços que não necessitam de atendimento imediato devendo ser iniciados no prazo regulamentado de até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da OS.

A demora para dar início ou para concluir os atendimentos emergenciais e comuns por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional será comunicada pela Fiscalização de imediato à CONTRATADA, podendo gerar penalidades em caso de não atendimento satisfatório.

8. CAPACIDADE TÉCNICA

A execução será por empresa tecnicamente especializada. A comprovação se dará conforme segue, e a documentação constante da inscrição deve estar organizada, completa e apresentada na seguinte ordem com dispositivos separadores os mais claros possíveis:

- a) Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Arquitetura (CAU), em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG, para assinatura do contrato.
- b) Declaração indicando quais profissionais que serão os responsáveis técnicos pela empresa encarregados da execução do serviço;
- c) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional(is) de nível superior, o(s) qual(is) será(ão) o(s) RT(s) da obra (conforme alínea b), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico), devidamente registrado(s), na entidade profissional competente, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços similares de construção civil e semelhantes ao objeto da presente licitação, que deverão estar, preferencialmente grifados, para melhor visualização quando da análise pela Comissão.
- d) Prova de que os profissionais, designados como Responsáveis Técnicos pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

Relatório de Visita – Manutenção Predial

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

DATA DA VISITA: 18/10/2023

Horário: 9:30h

Local Visitado: Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira – Rancho Novo

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Nome do funcionário da prefeitura que acompanhou: Wilson

Serviços Solicitados:

SALA 9

Forro - 5,85x5,86

Reparo nas janelas

SALA 07

Forro- 5,80x 5,85

Reparos janelas

SALA 08

Forro - 5,80x5,85

SALA 04

Arrumar o forro (já foi instalado)

BANHEIRO MASCULINO

Reparo da caixa de descarga - 2 caixas

BANHEIRO FEMININO Reparo da
caixa de descarga - 2 caixas

CORREDOR ENTRADA

Telhado - 3.25x28,5

Telha cerâmica

Ripa - 285m (300) – 10mx 28.5m

Caibros - 61 caibros de 3,5 = 213.5m

Cerâmica (1m²)

Comprimento total - 28.5m

Calha de 70 - 18.50m

CASINHA DA CAIXA D'ÁGUA

Fechar de chapa e colocar um portão

1,70 de altura

1,40x1,55

FECHAMENTO TELHADO

Chapa - 6m de comprimento de 35cm

Passarinheira- 16,40 x 2 lados

DEPÓSITO

Telhado 4.60 (+20%) x8,20

Trocar caibro = 99,36m²

Ripa 15 de 8,20m= 123m

Peça 20m (para o meio)

Forro 4,60mx8,20m

PASSARINHEIRA

28.5m x 5.80m x 2m

FORRO DA CRECHE

1mx5,45m

ELÉTRICA

Em todos os pontos do telhado

Cientes:

Fiscal de Contrato

Luísa Silva

Construtora Arrojado Lisboa LTDA

Empresa

Funcionário que acompanhou



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 09/2024

CI

DATA: 02/01/2024

FL.:1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Secretaria Municipal de Educação

A/C: Albano Tibúrcio

CÓPIA

ASSUNTO: Solicitação de Empenho

Prezado,

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Adjunto de Obras e Meio Ambiente Kildare Bittencourt Dutra, em atendimento a solicitação desta secretaria para reparos na Escola Municipal Padre José Lobo da Silveira – Rancho novo, localizada nesta cidade, estamos encaminhando planilha de quantidades para empenho. Assim que estiver pronto, gentileza nos enviar.

Desde já agradecemos.

Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Recebido
12/01/24



PLANILHA RESUMO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DATA:	02/01/2024
NOME DA OBRA:	ESCOLA RANCHO NOVO	BDI:	25,92%
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	DESC. SINAPI:	25,45%
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023	DESC. SEINFRA:	21,58%
OBJETO:	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO		
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0	R\$ 123.502,5300	R\$ 96.850,8540
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:			R\$ 123.502,53	R\$ 96.850,88
OBS.: Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação.		Levantamento: ARROJADO LISBOA	Conferência:  Luisa Silva Eng. Civil	



PLANILHA DE QUANTIDADES

SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA: 02/04/2024					
NOME DA OBRA:		ESCOLA RANCHO NOVO		RDE: 25,97%					
CONTRATADO:		CONSTRUTORA AROLIADO LUSOIA LTDA		DESC. SINAPI: 15,65%					
ATA REGISTRO DE PREÇO:		02/2/2023		DESC. SINAPI: 15,65%					
OBJETO:		REPARO ESCOLA RANCHO NOVO		DESC. SINAPI: 21,59%					
REFERENCIAL:		2023/08 SETOR LESTE, COM DESONERIZAÇÃO							
		2023/11 SINAPI, INC. DESONERADO							
ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM EDI	PREÇO UNITÁRIO COM EDI	VALOR TOTAL COM EDI	VALOR TOTAL COM EDI E DESCONTO
1	SEINFRA	ED-28728	ÁREA INTERNA E EXTERNA	m2	149,0000	R\$ 54,89	R\$ 81,70	R\$ 12.172,30	R\$ 9.546,30
2	SEINFRA	ED-50659	FORRO EM REQUILA DE PVC, LARGURA 20CM NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODA-FOFRO OU MOLDURA	m	18,5000	R\$ 115,79	R\$ 148,80	R\$ 2.752,80	R\$ 2.158,75
3	SEINFRA	ED-7830	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,63MM (SSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL, VERTICAL	H	8,0000	R\$ 24,25	R\$ 30,54	R\$ 244,32	R\$ 191,86
4	SEINFRA	ED-50362	SERIALHEIRO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 24,25	R\$ 30,54	R\$ 244,32	R\$ 191,86
5	SEINFRA	ED-50373	AUDIANTE DE ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 20,02	R\$ 25,21	R\$ 201,68	R\$ 158,16
6	SEINFRA	ED-48419	ELETROSTCA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R\$ 24,74	R\$ 31,15	R\$ 249,20	R\$ 195,42
7	SEINFRA	ED-48415	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	m2	93,8000	R\$ 89,68	R\$ 112,93	R\$ 10.592,83	R\$ 8.306,90
8	SEINFRA	ED-48412	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	300,0000	R\$ 10,01	R\$ 12,60	R\$ 3.780,00	R\$ 2.954,28
9	SEINFRA	ED-48414	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAU 12 X 8 CM	M	127,0000	R\$ 37,59	R\$ 47,46	R\$ 9,88	R\$ 2.854,28
10	SEINFRA	ED-50361	CABRHO DE MADEIRA EM PARAU 7 X 4 CM	M	228,0000	R\$ 13,67	R\$ 17,47	R\$ 3.722	R\$ 4.726,70
11	SEINFRA	ED-50386	AUDIANTE DE CARPENTEIRO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	208,0000	R\$ 19,52	R\$ 24,58	R\$ 5.112,64	R\$ 3.086,19
12	SEINFRA	ED-48457	TELHUNDISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	104,0000	R\$ 23,84	R\$ 30,02	R\$ 3.122,08	R\$ 2.440,34
13	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	93,8000	R\$ 19,86	R\$ 25,01	R\$ 1.839,68	
14	SEINFRA	ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	83,8000	R\$ 21,41	R\$ 26,85	R\$ 2.528,85	R\$ 1.983,12
15	SEINFRA	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RIFHO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	18,5000	R\$ 4,11	R\$ 5,19	R\$ 95,83	R\$ 75,15
16	SEINFRA	ED-50683	RIFHO E CONTRARRIFHO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (SSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL, VERTICAL	M	28,0000	R\$ 6,05	R\$ 7,62	R\$ 213,36	R\$ 167,32
17	SEINFRA	ED-50924	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 1/8 X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIADA POR PERFIL "T"	M	28,0000	R\$ 33,26	R\$ 41,88	R\$ 1.172,64	R\$ 918,58
18	SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MANEIO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DESMÃO	UNIDADE	1,0000	R\$ 424,65	R\$ 534,72	R\$ 534,72	R\$ 419,33
19	SEINFRA	ED-48419	ALMOÇARADO DA ESCOLA RANCHO NOVO	KG	250,0000	R\$ 25,82	R\$ 32,51	R\$ 8.127,50	R\$ 6.373,56
20	SEINFRA	ED-48414	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	m2	46,0000	R\$ 69,68	R\$ 112,93	R\$ 5.194,78	R\$ 4.072,75
21	SEINFRA	ED-48415	CABRHO DE MADEIRA EM PARAU 7 X 4 CM	M	100,0000	R\$ 13,87	R\$ 17,47	R\$ 1.742,00	R\$ 1.370,00
22	SEINFRA	ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENCRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	123,0000	R\$ 10,01	R\$ 12,60	R\$ 1.548,80	R\$ 1.215,35
23	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	46,0000	R\$ 19,86	R\$ 25,01	R\$ 1.150,46	R\$ 902,19
				m2	46,0000	R\$ 21,41	R\$ 26,85	R\$ 1.240,16	R\$ 972,53

Mina

972,53

ITEM	ESF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
24	SEINFRA	ED-50361	ALHANDIA DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	56.0000	R\$ 19,52	R\$ 24,58	R\$ 19,26	R\$ 1.376,48	R\$ 1.079,44
25	SEINFRA	ED-50386	TELHADA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA, TERMOCOLÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 6,0MM, PRESENÇA DE ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58.0000	R\$ 23,84	R\$ 30,02	R\$ 23,54	R\$ 1.681,12	R\$ 1.316,33
26	SEINFRA	ED-48429	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	120.0000	R\$ 231,31	R\$ 291,27	R\$ 228,41	R\$ 34.952,40	R\$ 27.409,67
27	SEINFRA	ED-49664	FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 200X, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENOURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE RODAFORNO OU MOLOURA	M2	330.0000	R\$ 25,82	R\$ 32,51	R\$ 25,59	R\$ 9.753,00	R\$ 7.348,30
28	SEINFRA	ED-28723		M2	20.0000	R\$ 84,29	R\$ 91,76	R\$ 84,07	R\$ 1.684,00	R\$ 1.291,36
						R\$	R\$	R\$	R\$ 123.502,53	R\$ 96.550,68

Obs.:

Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação.

LEVANTAMENTO:

Arrojado Lisboa

CONFIRMAÇÃO:

Luís Silva
Luís Silva
Eng. Civil

Luís Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
REPARO ESCOLA RANCHO NOVO

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

920/12324

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./ PERÍMETRO	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	PERCENTUAL / EMPOLAMENTO	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)	(m)	(m²)	(m²)	(m³)	(kg)	(kg/m³)	(km)	(unidade)	%		
1	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIIS METALICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA													148,00	
	TELHADO													1480000	
2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL													18,50	
	TELHADO													185000	
3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													8,00	
	REPARO JANELAS													80000	
4	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													8,00	
	DESMONTAGEM ELETRIA													80000	
5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													8,00	
	DESMONTAGEM ELETRIA													80000	
6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA													93,80	
	TELHADO													938000	
7	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM													300,00	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													938000	
8	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM													127,00	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													938000	
9	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM													226,00	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													938000	
10	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													208,00	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													938000	
11	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													104,00	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													938000	
12	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO													93,80	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													938000	

placa

00

[illegible]

22

[illegible]

2014

5



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	05/02/2024	
NOME:	ESCOLA RANCHO NOVO		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO				
Nº AE	264/2024		Nº NE:	589/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	04./2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE – DESONERADA).	1,0000	R\$ 51.140,9563	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS – DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO: R\$ 51.140,96		
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIA FERNANDES:09252216600 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Danilo de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME DA OBRA:		ESCOLA RANCHO NOVO									
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
CONTRATADO		ARROJADO LISBOA									
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023									
REFERÊNCIA:		2023/08_SETOR_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO									
Nº AE		264/2024									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
				QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
1	SEINFRA ED-28722	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	M2	149,00	108,29			R\$ 64,07	R\$ 6.938,24	108,29	72,68%
2	SEINFRA ED-50659	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	18,50	18,50			R\$ 116,69	R\$ 2.158,75	18,50	100,00%
3	SEINFRA ED-7630	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00			R\$ 23,95	R\$ 191,60	8,00	100,00%
4	SEINFRA ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00			R\$ 19,77	R\$ 158,16	8,00	100,00%
5	SEINFRA ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00			R\$ 24,43	R\$ 195,42	8,00	100,00%
6	SEINFRA ED-48419	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M2	93,80	92,63			R\$ 88,56	R\$ 8.202,84	92,63	98,75%
7	SEINFRA ED-48415	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	300,00	300,00			R\$ 9,88	R\$ 2.964,28	300,00	100,00%
8	SEINFRA ED-48412	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	M	127,00	127,00			R\$ 37,22	R\$ 4.728,70	127,00	100,00%
9	SEINFRA ED-48414	CABRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM	M	226,00	213,50			R\$ 13,70	R\$ 2.924,94	213,50	94,47%
10	SEINFRA ED-50361	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208,00	208,00			R\$ 19,28	R\$ 4.009,33	208,00	100,00%
11	SEINFRA ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	104,00			R\$ 23,54	R\$ 2.448,34	104,00	100,00%
12	SEINFRA ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	93,80	92,63			R\$ 19,61	R\$ 1.816,64	92,63	98,75%
13	SEINFRA ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	93,80	92,63			R\$ 21,14	R\$ 1.958,28	92,63	98,75%

Handwritten signature and initials

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
14	SEINFRA	ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	18,50	18,50			R\$ 4,06	R\$ 75,15	18,50	100,00%
15	SEINFRA	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	28,00	28,00			R\$ 5,98	R\$ 167,32	28,00	100,00%
16	SEINFRA	ED-50683	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	28,00	0,00			R\$ 32,84	R\$ 0,00	0,00	0,00%
17	SEINFRA	ED-50924	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1" X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUICADA POR PERFIL "T"	UNIDADE	1,00	0,00			R\$ 419,33	R\$ 0,00	0,00	0,00%
18	SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	250,00	0,00			R\$ 25,49	R\$ 0,00	0,00	0,00%
19	SEINFRA	ED-48419	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M2	46,00	46,00			R\$ 88,55	R\$ 4.073,75	46,00	100,00%
20	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM	M	100,00	100,00			R\$ 13,70	R\$ 1.370,00	100,00	100,00%
21	SEINFRA	ED-48415	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	123,00	123,00			R\$ 9,88	R\$ 1.215,35	123,00	100,00%
22	SEINFRA	ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	46,00	46,00			R\$ 19,61	R\$ 902,19	46,00	100,00%
23	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	46,00	46,00			R\$ 21,14	R\$ 972,53	46,00	100,00%
24	SEINFRA	ED-50361	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	56,00			R\$ 19,28	R\$ 1.079,44	56,00	100,00%
25	SEINFRA	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	56,00			R\$ 23,54	R\$ 1.318,33	56,00	100,00%
26	SEINFRA	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOCUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	120,00	0,00			R\$ 228,41	R\$ 0,00	0,00	0,00%

Paul

relativa

0,00

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
27	SEINFRA	ED-49684	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADO ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	300,00	0,00			R\$ 25,49	R\$ 0,00	0,00	0,00%
28	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 200CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDBRA	M2	20,00	20,00			R\$ 64,07	R\$ 1.281,38	20,00	100,00%
SUBTOTAL:										R\$ 51.148,96		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 51.148,96		
PERCENTUAL EXECUTADO:										52,81%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO										R\$ 96.850,68		
SALDO										R\$ 45.701,73		
FISCALIZAÇÃO:										RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
 Luisa Silva Engenheiro Civil  Kildare Bittencourt Dutra										HUDSON DALMO FARIAS Inscrito no CNPJ nº 14.949.402/0001-00 FERNANDO S. GONÇALVES Inscrito no CNPJ nº 14.949.402/0001-00  Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D		
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:										SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 09/02/2024		
										Prof. Albano		

[illegible]

A handwritten signature, possibly reading "S. J. ...".

23	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			46,00	
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO									9,0200										46,00000	
24	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																			56,00	
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO																			56,00000	
25	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES																			56,00	
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO																			56,00000	
26	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO																			-	
	Cobertura																			0,0000	
27	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO																			-	
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO																			0,0000	
28	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA																			20,00	
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO																			20,00000	

10/10/20


GA

10/10/20

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	7
				Data do relatório	23/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	9 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	10 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Início reparos na escola Troca de telhados	Em Andamento

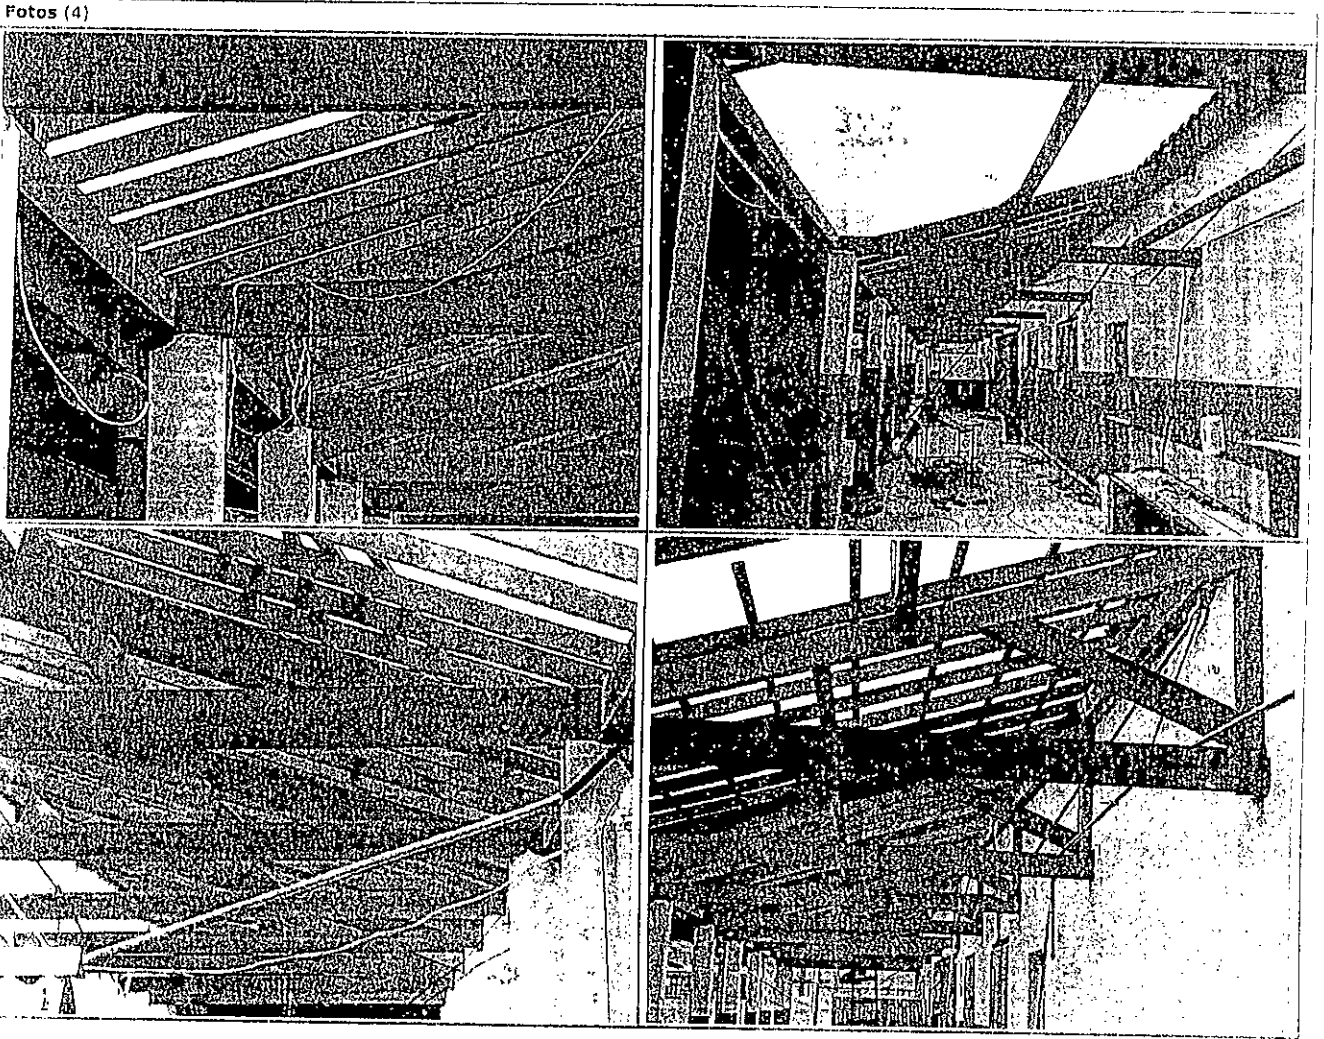


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	8
				Data do relatório	24/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	10 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	9 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável



Atividades (1)	
Início reparos na escola	Em Andamento

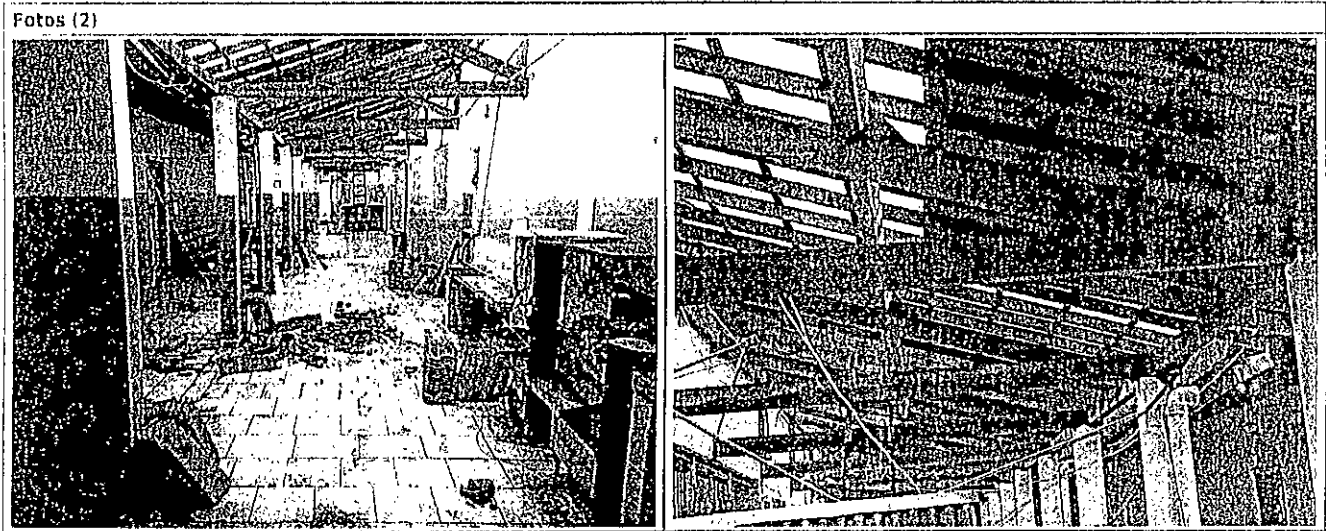

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	9
				Data do relatório	25/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	11 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	8 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Início reparos na escola	Em Andamento


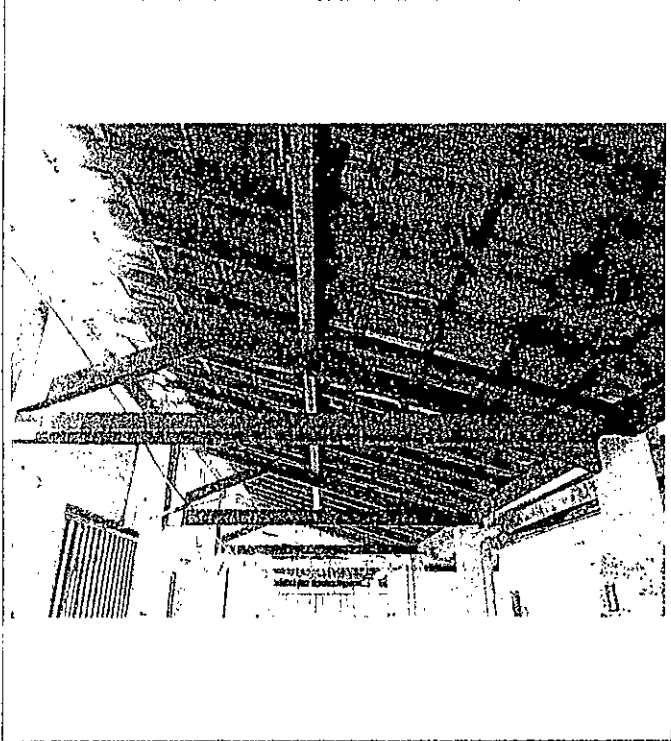
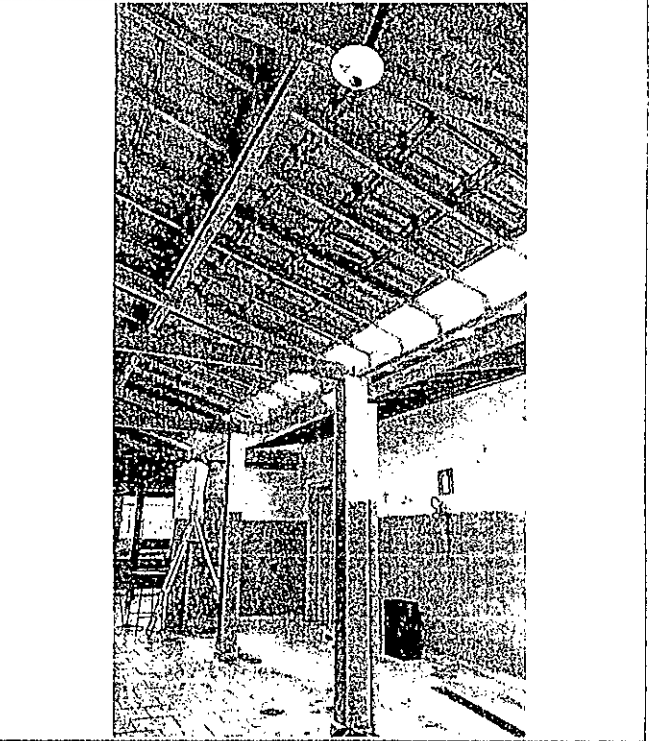
Fotos (2)	
	


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	10
				Data do relatório	26/01/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	12 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	7 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Finalizados os reparos na escola.	Em Andamento

Fotos (3)

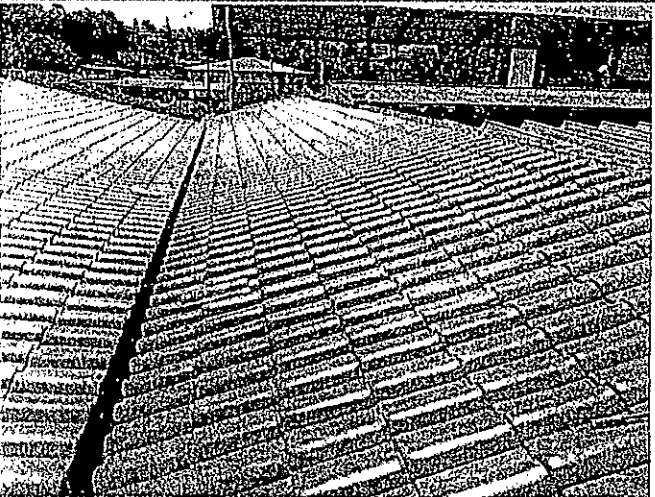


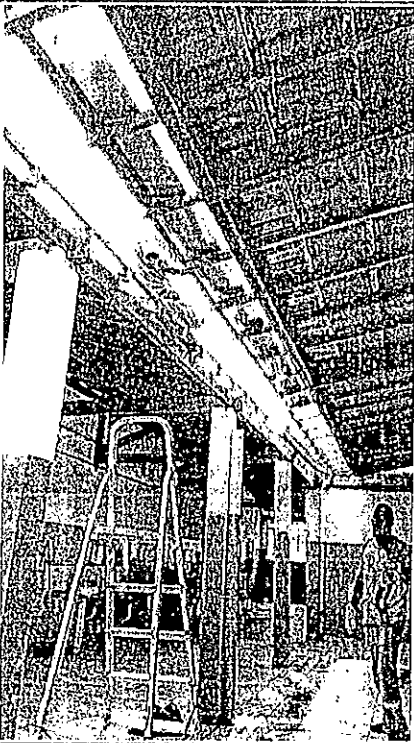

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	11
				Data do relatório	29/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	15 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	4 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Finalizados os reparos na escola.	Em Andamento

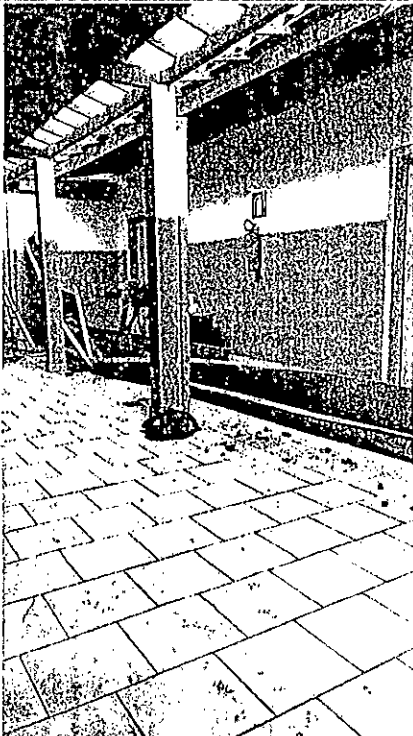Fotos (5)	
	



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISHOA LTDA
EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISHOA LTDA
Nº ARQUIVO: F1c3Q95rhmd0000-3
Nº CONTRÔLE: ANR0wuzRsn10000-0
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0301-17
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: Jeceaba UF: MG CEP: 35498-000 TELEFONE: 31-85180219 CNAE: 7112000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17 N° ARQUIVO: F1c3Q9FRhmd00000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: ANR0wuzRsN10000-0
TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17 N° CONTROLE: HtDTHlUDeLw0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 CENTRO JECEABA 35498000 MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	414,66
		DEPÓSITO	311,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	414,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	277,12	DEPÓSITO	311,82
VAL DEVIDO PREV SOC	277,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10 2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8586000000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
N° ARQUIVO: F1c3Q9fRhmD0000-3
N° CONTROLE: ANR0wuzRsN10000-0

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	414,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	277,12	DEPÓSITO	311,82
VAL DEVIDO PREV SOC	277,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2
		TOTAL A RECOLHER	311,82

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

3586000000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OPERA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA

INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADMISSÃO
CAT
OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

ALLEX DOS ANJOS NASCIMENTO	207,33	212.72536.89-2	11/12/2023	01			07166
1.741,60		0,00	138,56			155,91	0,00
MIGUEL MARCOS VIEIRA	207,33	113.40144.17-9	11/12/2023	01			07152
1.741,60		0,00	138,56			155,91	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.483,20

414,66

0,00

277,12

311,82

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PAG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 118201802405 10768418859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA

Nº ARQUIVO: Flc3Q9frhmd0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17

FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: HtdTHIUdeLw0000-2

CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

BAIRRO: CENTRO

UF: MG CEP: 35498-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00
TOTAIS:	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA
UF: MG
CEP: 35498-000
TELEFONE: 0031 8518 0219
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

Nº ARQUIVO: F1c3Q9Erhmd0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17

FPAS: 507
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
RAT: 0.0
Nº DE CONTROLE: HEDTHIUdeLw0000-2

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277.12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8586000000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA N° DE CONTROLE: ANR0WUZRSN10000-0 N° ARQUIVO: F1c3Q9fRhmD0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JECEABA UF: MG CEP: 35498-000 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00
TOTAIS:	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8586000000039 118201802405 107684180859 C36105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA		N° DE CONTROLE: ANR0WuzRsN10000-0		N° ARQUIVO: Flc3Q9FRhmd0000-3	
COMP: 12/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 507	OUTRAS ENT: SIMPLES: 2	INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA:			FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00		
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617			INSCRIÇÃO:		
CIDADE: JECEABA			BAIRRO: CENTRO		
UF: MG			CNAE PREPONDERANTE: 7112000		
CEP: 35498-000			CNAE: 7112000		

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	3.483,20
	414,66
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	TOTAL RECOLHER
311,82	0,00	311,82
	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
	0,00	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: ANR0wuzRsn10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: Flc3Q9fRhd0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA
UF: MG
CEP: 35498-000
TELEFONE: 0031 8518 0219
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277.12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR SOLICITADO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
SIMPLES: 2

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.897,86

DEPÓSITO

311,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

311,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	50.361.051/0001-17	0,00	0,00	0,00	0,00	2003	507		
277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	0,00		

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
2024000000000006
Emissão
28/02/2024 09:03:41
Código de Verificação
A12F-CF08

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA
CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17
Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG

Inscrição Municipal: 0000000000000004547
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
E-mail:

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA MUNICIPAL RANCHO NOVO

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 10.486,47
BASE DE CALCULO MATERIAIS : 24.488,40

Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.069-0
Sicoob

Declaro que os materiais/serviços foram
recebidos, conferidos e aceitos, estando em
condições satisfatórias para o Município

Data 29 / 02 / 2024

Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
34.954,87	34.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,87
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Kelly 04/03/24

68079934



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	27/02/2024	
NOME:	ESCOLA RANCHO NOVO		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO				
Nº AE	264/2024		Nº NE:	589/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO			ORDEM DE SERVIÇO	04./2024
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 34.954,8720	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$ 34.954,87	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIA FERNANDES.09252218600 Assinada de forma autêntica por #129104 Data: 20/02/2024 10:04:30 S (02/11/2024) Data: 20/02/2024 10:04:30 S (02/11/2024) Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniela de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Britencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



ESCOLA BANCHIO NOVO												
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
ARROJADO LISBOA												
029/2023												
2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO												
264/2024												
N° AE												
N° NE 589/2024												
ORDEM DE SERVIÇO												
04/2024												
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODA-FORRO OU MOLDURA	M2	149,00	138,29	0,00		R\$ 64,07	R\$ 0,00	108,29	72,68%
2	SEINFRA	ED-50659	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	18,50	18,50	0,00		R\$ 116,69	R\$ 0,00	18,50	100,00%
3	SEINFRA	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00	0,00		R\$ 23,95	R\$ 0,00	8,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00	0,00		R\$ 19,77	R\$ 0,00	8,00	100,00%
5	SEINFRA	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00	0,00		R\$ 24,43	R\$ 0,00	8,00	100,00%
6	SEINFRA	ED-48419	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M2	93,80	92,63	0,00		R\$ 88,56	R\$ 0,00	92,63	98,75%
7	SEINFRA	ED-48415	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	300,00	300,00	0,00		R\$ 9,88	R\$ 0,00	300,00	100,00%
8	SEINFRA	ED-48412	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	M	127,00	127,00	0,00		R\$ 37,22	R\$ 0,00	127,00	100,00%
9	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM	M	226,00	213,50	0,00		R\$ 13,70	R\$ 0,00	213,50	94,47%
10	SEINFRA	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208,00	208,00	0,00		R\$ 19,28	R\$ 0,00	208,00	100,00%
11	SEINFRA	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	104,00	0,00		R\$ 23,54	R\$ 0,00	104,00	100,00%
12	SEINFRA	ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRAIDA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	93,80	92,63	0,00		R\$ 19,61	R\$ 0,00	92,63	98,75%
13	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRAIDA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	93,80	92,63	0,00		R\$ 21,14	R\$ 0,00	92,63	98,75%

White.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM B.O.I. E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
27	SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	300,00	0,00	300,00		R\$ 25,49	R\$ 7.648,30	300,00	100,00%
28	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODA-FORRO OU MOLDURA	M2	20,00	20,00	0,00		R\$ 64,07	R\$ 0,00	20,00	100,00%
SUBTOTAL:										R\$ 34.954,87		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 34.954,87		
PERCENTUAL EXECUTADO:										88,90%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO										R\$ 96.850,68		
SALDO										R\$ 10.746,86		
FISCALIZAÇÃO:										RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
										HUDSON DALMO FARIAS Ajustado de forma digital por FERNANDES.097522166 HUDSON DALMO FARIAS 00 TERA-POS 07/03/21 16:00 CNPJ 15.041.022/13.311-41008		
										Luisa Silva Engenheiro Civil		
										Hudson Dalmo Faria Fernandes Construtora Arrojado Lisboa		
										Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D		
										SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
										27/02/2024		
										Kildare Bittencourt Dutra		
										Eng. Albano		

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./ PERÍMETRO	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	PERCENTUAL / EMPOLAMENTO	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(kg)	(kg/m3)	(KM)	(unit)	%		
1	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDEIRA													-	
	Sala 9		5,86	5,8500			34,28							34,2810	
	Sala 7		5,86	5,8500			34,28							34,2810	
	Sala 8		5,86	5,8500			34,28							34,2810	
	Creche		1,00	5,4500			5,45							5,4500	
2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL													-	
	TELHADO													18,5900	
3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													-	
	REPARO JANELAS													8,0000	
4	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													-	
	DESMONTAGEM ELETRIA													8,0000	
5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													-	
	DESMONTAGEM ELETRIA													8,0000	
6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA													-	
	TELHADO													92,6250	
7	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM		3,25	28,5000			92,63							-	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													0,0000	
8	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM													-	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													127,0000	
9	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM													-	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO		3,50									61,00		213,5000	
10	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													-	
	AJUDANTES (2)													208,0000	
11	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES											13,00		-	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO											13,00		104,0000	

30/04/2024

30/04/2024

30/04/2024

12	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO REPARO ESCOLA RANCHO NOVO								3,25	28.5000	92,63								92,6250	-
13	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			-
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO								3,25	28.5000	92,63								92,6250	-
14	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			-
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO																		18.5000	-
15	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			-
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO																		28.0000	-
16	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL																		28.00	-
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO																		28.0000	-
17	ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUJECIDA POR PERFIL "T"																			-
	CASINHA D'ÁGUA																		0.0000	-
18	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO																		45,00	-
	Estrutura para forno do almoxarifado								1,00										45.0000	-
19	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA																		-	-
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO								5,10	9,0200	46,00							0,000	0,000	-
20	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM																		-	-
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO																	22,00	0,0000	-
21	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM																		-	-
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO																	15,00	123.0000	-
22	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			-
	ALMOXARIFADO ESCOLA RANCHO NOVO								5,10	9,0200									46.0000	-






[illegible]


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	12
				Data do relatório	30/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	16 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	3 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável





Atividades (1)	
TELHADOS FINALIZADOS	Em Andamento

Fotos (6)

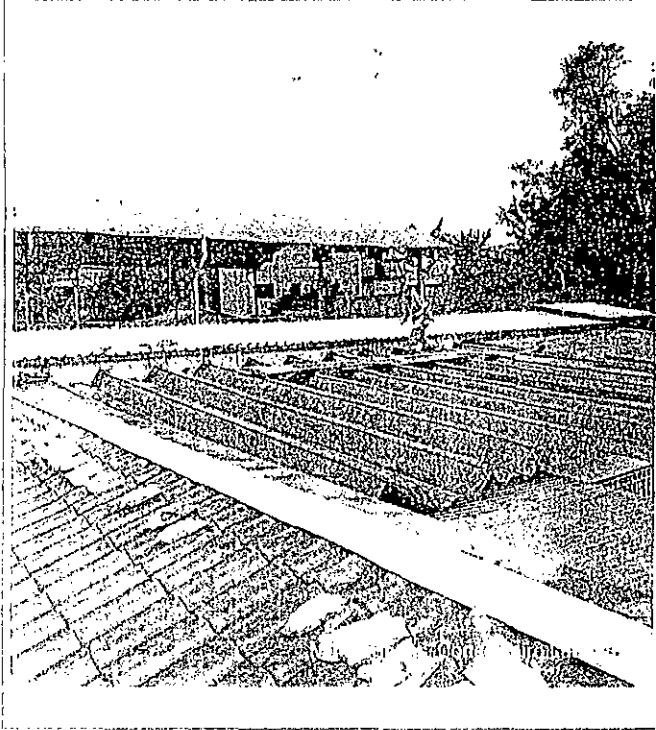

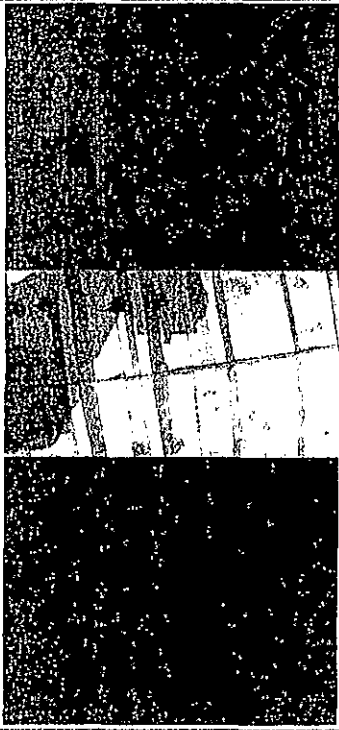

[Handwritten signature]

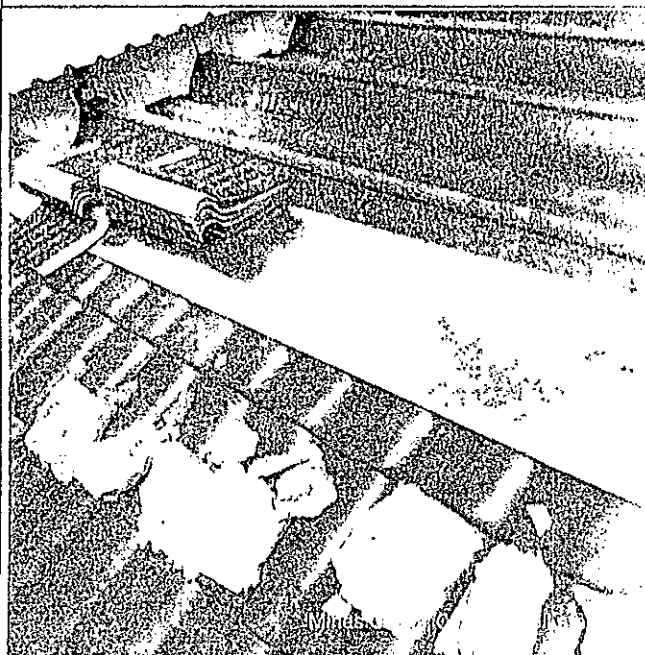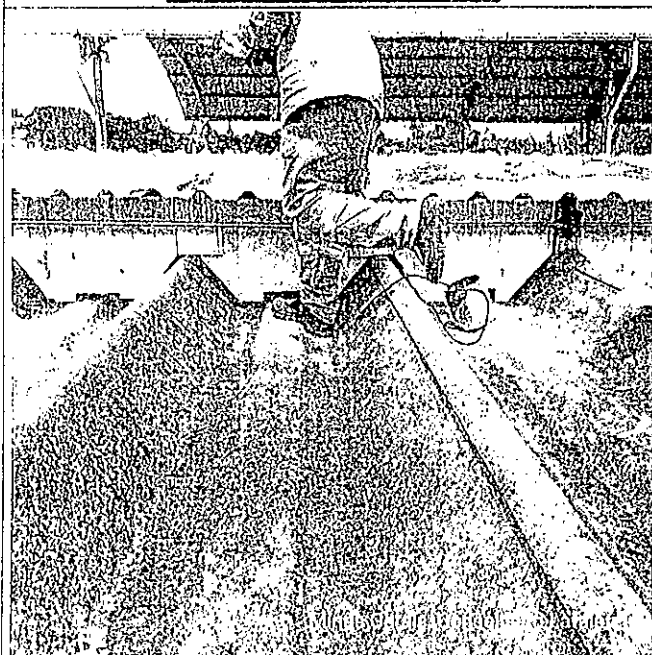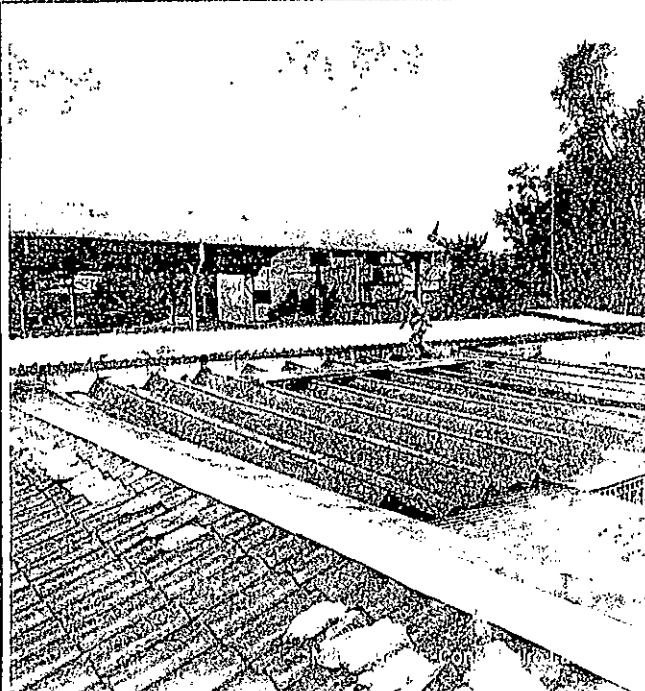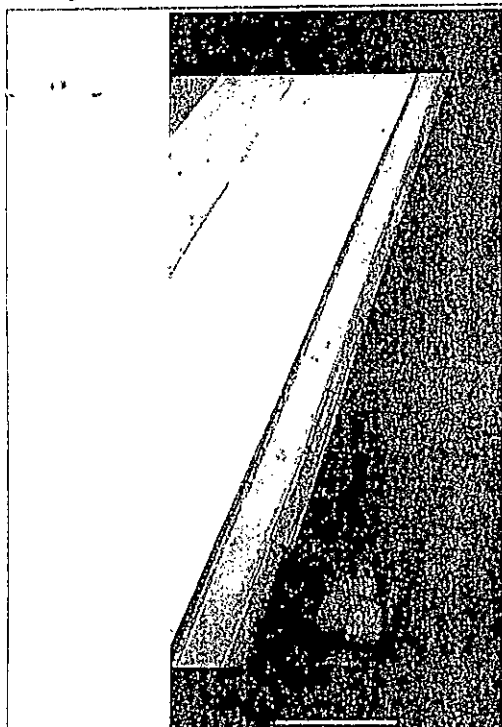

Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000005
Emissão
28/02/2024 08:58:39
Código de Verificação
4542-CA54

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA
CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17
Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG

Inscrição Municipal: 0000000000000004547
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
CEP: 36400026
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE OMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA XECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR ERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS INAPI (BASE MINAS ERAIS - DESONERADA).

ANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

EPARO ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS

ASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 9.834,68
ASE DE CALCULO MATERIAIS : 22.947,56

Ados Bancários
gência: 3116
C: 39.069-0
coob

Declaro que os materiais/serviços foram
recebidos, conferidos e aceitos, estando em
condições satisfatórias para o Município

Data 29/1/2024

Assinatura Legítima Doc. Identidade

Assinatura Legítima Doc. Identidade

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Início de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
32.782,24	32.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	32.782,24
Valor do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Adicionais

Contribuinte optante pelo simples nacional.
Retido na Fonte pelo tomador.
R\$ 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que fluenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Kelly 04/03/24

MG 8079934



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DATA:	27/02/2024	
NOME:	Escola Municipal "Sebastião Pereira da Fonseca" - Três Barras		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO NA ESCOLA				
Nº AE	265/2024		Nº NE:	590/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	01./2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 32.782,2422	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 32.782,24	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Lulsa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FÁRIA CPF: 09252216600 FERNANDES.09252216600 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA/256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME:		Escola Municipal "Sebastião Pereira da Fonseca" - Três Barras									
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
CONTRATADO		ARROADO LISBOA									
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023									
REFERÊNCIA:		2023/08_SETOR_LESTE_COM_DISENTERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESOPERADO									
Nº AE		265/2024		Nº ME 590/2024						ORDEN DE SERVIÇO	
										01/2024	
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:			
1	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE FIXAMENTO MANUAL VERTICAL.	m	702,00	0,00	0,00		R\$ 0,00	0,00	0,00%
2	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANUT. ISOLANTE/TERMICA	m	226,80	226,80	0,00		R\$ 0,00	226,80	100,00%
3	SEINFRA	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m	30,16	0,00	30,16		R\$ 875,34	30,16	100,00%
4	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS(3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m	38,28	0,00	38,28		R\$ 698,85	38,28	100,00%
5	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETAS/RAPELADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 349,26	1,00	100,00%
6	SEINFRA	ED-49591	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 299,66	1,00	100,00%
7	SEINFRA	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANEIA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 89,17	1,00	100,00%
8	SEINFRA	ED-51157	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/CAIXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHOPERFIL	m	0,16	0,00	0,00		R\$ 0,00	0,00	0,00%
9	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDIURA	m2	35,00	0,00	35,00		R\$ 2.242,42	35,00	100,00%
10	SEINFRA	ED-28751	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM REGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	23,00	0,00	23,00		R\$ 391,75	23,00	100,00%
11	SEINFRA	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA	m	30,16	0,00	30,16		R\$ 875,34	30,16	100,00%
12	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS(3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m	38,28	0,00	38,28		R\$ 698,85	38,28	100,00%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR		ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	UNITÁRIO COM 8DI E DESCONTO	VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO		
13	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO 180X210CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 349,26	R\$ 349,26	1,00	100,00%
14	SEINFRA	ED-49591	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO 180X210CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 299,66	R\$ 299,66	1,00	100,00%
15	SEINFRA	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 89,17	R\$ 89,17	1,00	100,00%
16	SEINFRA	ED-51157	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃOXAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAPILHOPEPIL	m	0,16	0,00	0,00		R\$ 221,80	R\$ 0,00	0,00	0,00%
17	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	m2	35,00	0,00	35,00		R\$ 64,07	R\$ 2.242,42	35,00	100,00%
18	SEINFRA	ED-28751	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	23,00	0,00	23,00		R\$ 17,03	R\$ 391,75	23,00	100,00%
19	SEINFRA	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETOALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICOACORRIDA (PVA)	m	25,92	0,00	25,92		R\$ 29,02	R\$ 752,28	25,92	100,00%
20	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS(3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICOACORRIDA (PVA)	m	21,06	0,00	21,06		R\$ 18,26	R\$ 384,48	21,06	100,00%
21	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	m2	15,30	0,00	15,30		R\$ 64,07	R\$ 980,26	15,30	100,00%
22	SEINFRA	ED-28751	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	16,00	0,00	16,00		R\$ 17,03	R\$ 272,53	16,00	100,00%
23	SEINFRA	ED-50337	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACOINAMENTO SIMPLER, DN 1,1/2" (30MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00		R\$ 229,77	R\$ 0,00	0,00	0,00%

15/11/2024

15/11/2024

15/11/2024

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:			
24	SEINFRA	ED-50293	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACOIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00		R\$ 726,54	R\$ 0,00	0,00%
25	SEINFRA	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 453,79	R\$ 453,79	100,00%
26	SEINFRA	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1,1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	2,00	0,00	0,00		R\$ 42,35	R\$ 0,00	0,00%
27	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	M2	10,00	0,00	10,00		R\$ 18,26	R\$ 182,56	100,00%
28	SEINFRA	ED-50610	PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m	39,57	0,00	39,57		R\$ 29,02	R\$ 1.148,45	100,00%
29	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETAS/ARAFERDO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 349,26	R\$ 349,26	100,00%
30	SEINFRA	ED-49591	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 299,66	R\$ 299,66	100,00%
31	SEINFRA	ED-21612	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MEDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA/MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	UNIDADE	1,00	0,00	1,00		R\$ 89,17	R\$ 89,17	100,00%
32	SEINFRA	ED-50455	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO	M2	15,00	0,00	15,00		R\$ 25,60	R\$ 384,05	100,00%
33	SEINFRA	ED-28128	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PERDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODA/FORRO OU MOLHURA	m2	32,40	0,00	32,40		R\$ 64,07	R\$ 2.075,84	100,00%

10/12/2012

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
34	SEINFRA	ED-28751	RODAFORO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÊGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	17,50	0,00	17,50		R\$ 298,07	17,50	100,00%
35	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA(CORRIDA (PVA)	M2	462,00	0,00	302,04		R\$ 5.514,10	302,04	65,38%
36	SEINFRA	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO(VALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA(CORRIDA (PVA)	m	154,74	0,00	154,74		R\$ 4.491,06	154,74	100,00%
37	SEINFRA	ED-50568	CONTEAPISO DESEMPENHADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	m	123,00	0,00	123,00		R\$ 4.868,16	123,00	100,00%
38	SEINFRA	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	0,00	8,00		R\$ 191,60	8,00	100,00%
39	SEINFRA	ED-50366	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	0,00	8,00		R\$ 154,02	8,00	100,00%
40	SEINFRA	ED-61125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL, OU MECÂNICA	UNIDADE	5,00	0,00	0,00		R\$ 0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL:								R\$ 32.782,24			
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:								R\$ 32.782,24			
PERCENTUAL EXECUTADO:								93,93%			
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO								R\$ 71.383,33			
SALDO								R\$ 4.333,46			
FISCALIZAÇÃO:											
CONTRATADA:											
RESPONSÁVEL TÉCNICA:											
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:											
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
27/02/2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Escola Municipal Sebastião Pereira da Fonseca - Três Barras

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

27/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			PERÍMETRO (m)												
1	RIPIA DE MADEIRA, EM PARAU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE FICAMENTO MANUAL VERTICAL													-	m
	TELHADO													0,0000	
2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA													-	m
	TELHADO													0,0000	
3	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)													30,16	m
	SALA 1													30,1600	
4	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)													38,28	m
	SALA 1													38,2800	
5	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO FRANCHETAS/ARAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ													1,00	u
	SALA 1													1,0000	
6	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ													1,00	u
	SALA 1													1,0000	
7	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2)													1,00	u
	SALA 1													1,0000	

10/03/2024

3	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL																		0,0000	m
9	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA																		35,00	M
	SALA 1																		35,0000	
10	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO																		23,00	M
	SALA 1																		23,0000	
11	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICO/CORRIDA (PVA)																		30,16	M
	SALA 2																		30,1600	
12	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICO/CORRIDA (PVA)																		38,28	M
	SALA 2																		38,2800	
13	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL, PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETAS/ARAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ																		1,00	U
	SALA 2																		1,0000	
14	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL, PARA PINTURAVERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ																		1,00	U
	SALA 2																		1,0000	
15	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRÁU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2)																		1,00	U
	SALA 2																		1,0000	
16	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL																		-	M
	SALA 2																		0,0000	
17	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA																		35,00	M
	SALA 2																		35,0000	

Yolha

18	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO																		23,00	M
	SALA 2																		23,0000	
19	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)																		25,92	M
	SALA 3																		25,92	
20	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)																		21,06	M
	SALA 3																		21,0600	
21	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METALICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA																		15,30	M
	SALA 3																		15,3000	
22	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO																		16,00	M
	SALA 3																		16,0000	
23	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1,1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA																		-	M
	SALA 3 - banheiro																		0,0000	
24	BACIA SANITÁRIA (NASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLA, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO.																		-	U
	SALA 3																		0,0000	
25	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO.																		1,00	U
	SALA 3																		1,0000	
26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1,1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES																		-	M
	SALA 3																		0,0000	
27	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)																		10,00	M
	REFEITÓRIO - COZINHA																		10,0000	

10/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

28	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICO/ACORRIDA (PVA)																		39,57	M
	REFEITÓRIO - COZINHA																		39,5700	
29	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETAS/ARAFADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ																		1,00	U
	REFEITÓRIO - COZINHA																		1,0000	
30	MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ																		1,00	U
	REFEITÓRIO - COZINHA																		1,0000	
31	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2)																		1,00	U
	REFEITÓRIO - COZINHA																		1,0000	
32	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO																		15,00	M
	MEIO-FIO																		15,0000	
33	FÓRRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODA-FORRO OU MOLDBURA																		32,40	M
	REFEITÓRIO - COZINHA																		32,4000	
34	RODA-FORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO																		17,50	M
	REFEITÓRIO - COZINHA																		17,5000	
35	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICO/ACORRIDA (PVA)																		302,04	M
	MURO - MURETAS - PORTAS - JANELAS - PARTES EXTERNAS																		302,0400	
36	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICO/ACORRIDA (PVA)																		154,74	M
	PINTURA EXTERNA																		154,7400	
37	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM																		123,00	M
	CONTRAPISO EXTERNO																		123,0000	

Yedra

[illegible]

12

[Handwritten signature]

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	7
				Data do relatório	24/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	10 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	48 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (5)



Daniel

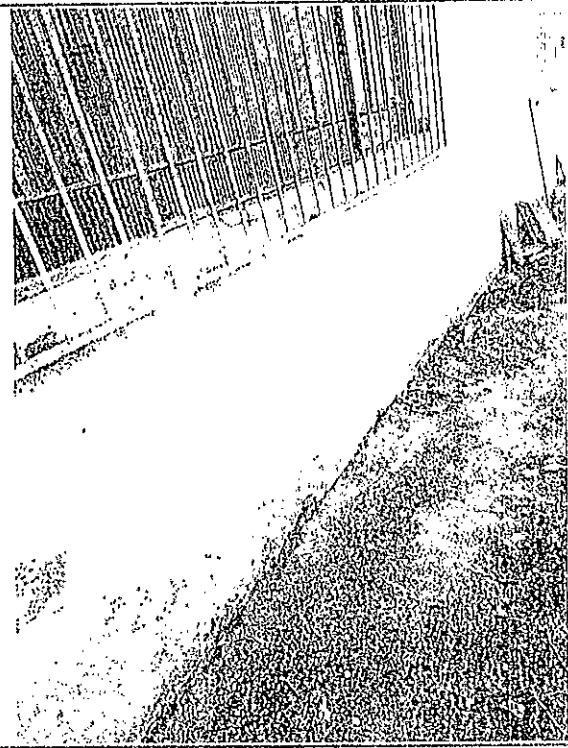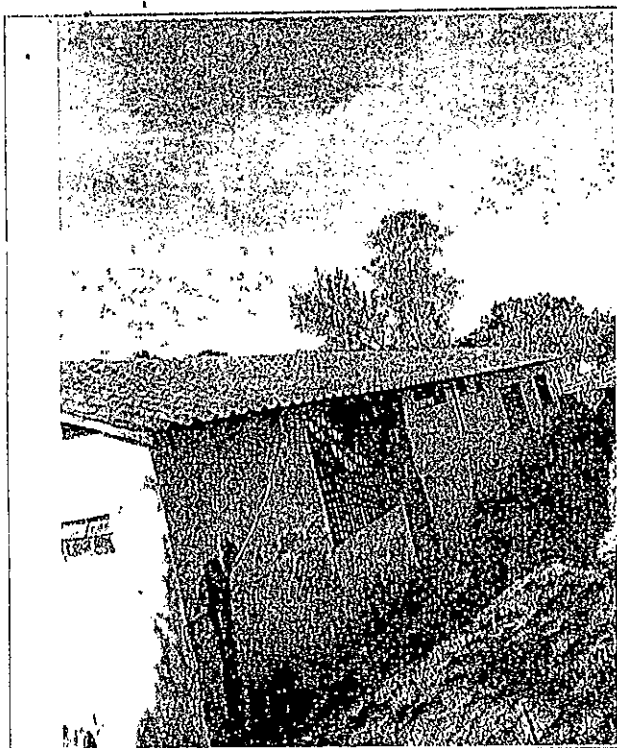

Assinatura


A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Assinatura



ARROJADO LISBOA				Relatório nº	6
				Data do relatório	23/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	9 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	49 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

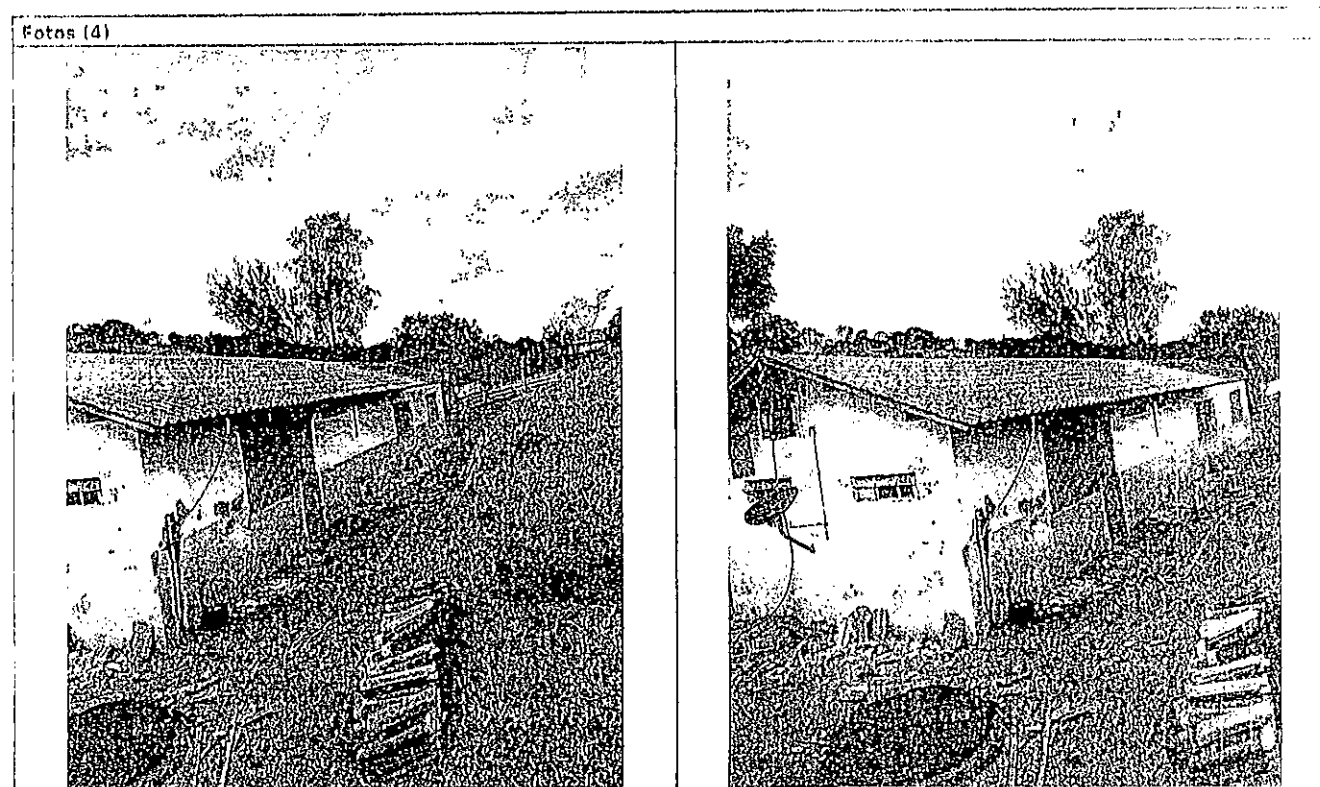

Paul

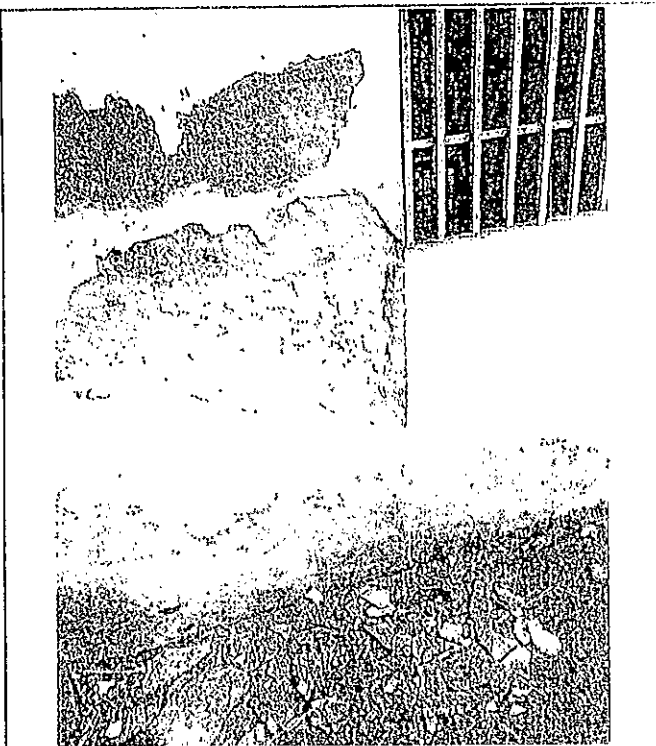


Assinatura

Assinatura



ARROJADO LISBOA				Relatório nº	8
				Data do relatório	25/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	11 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	47 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

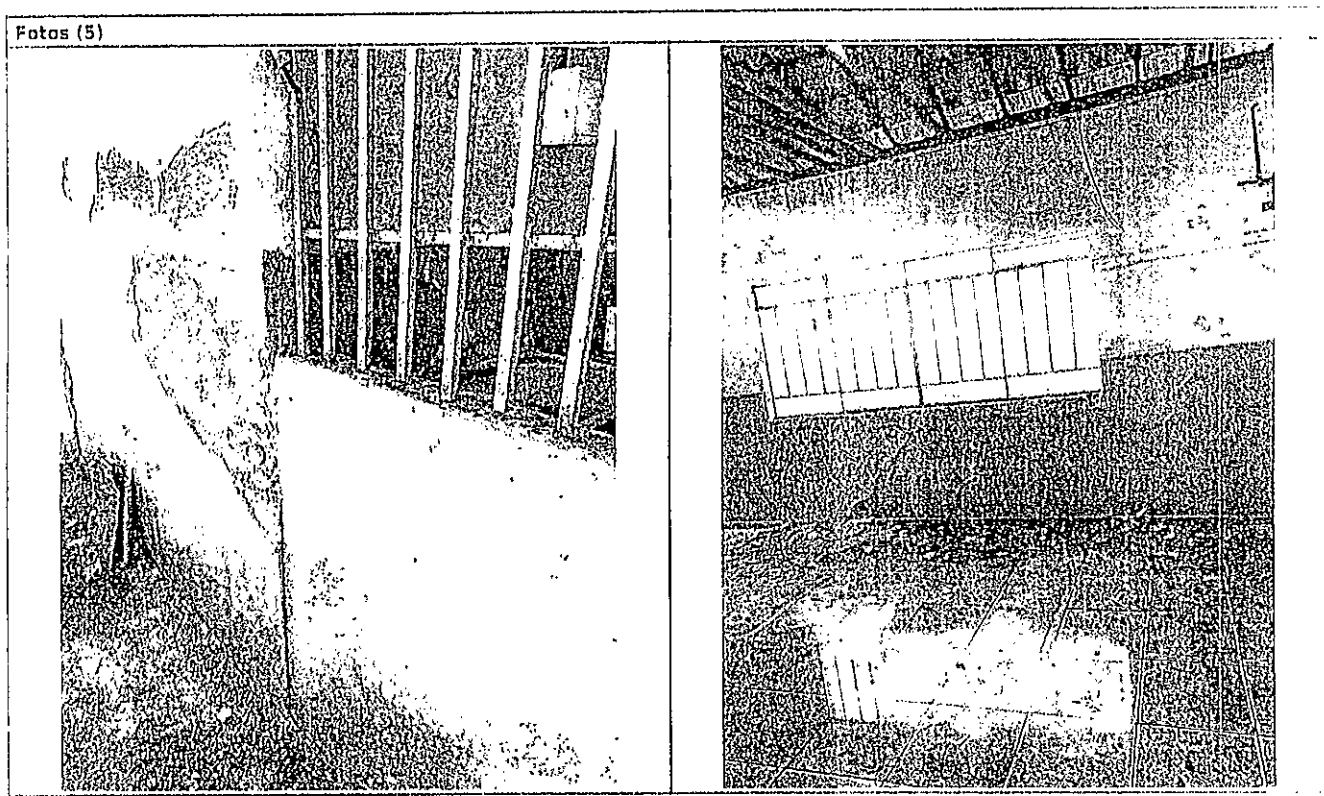

[Handwritten signature]

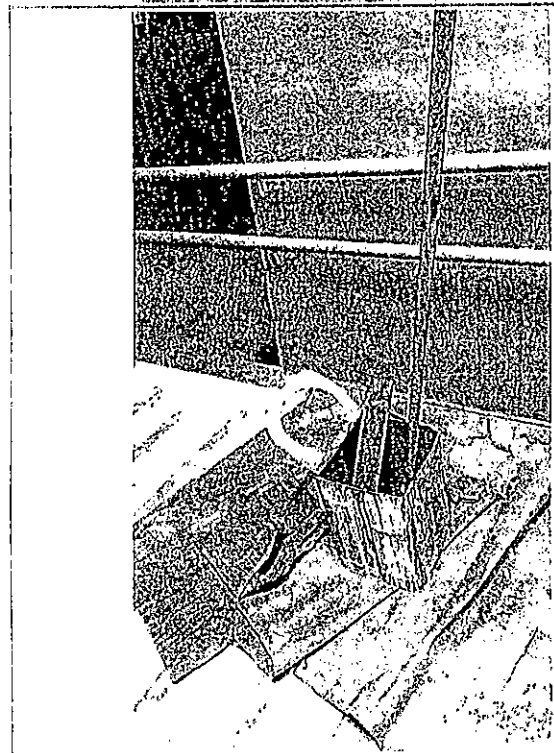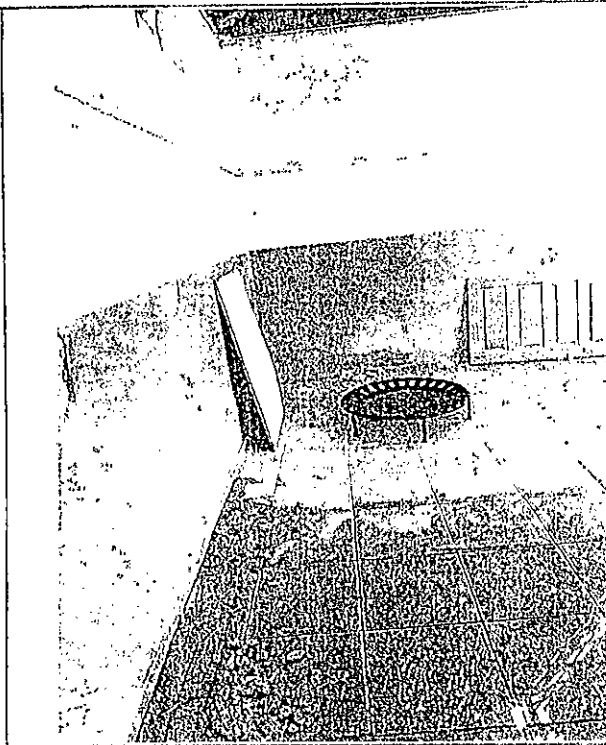

Assinatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M. F.' or similar.


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	5
				Data do relatório	19/01/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	5 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	53 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável



Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (5)

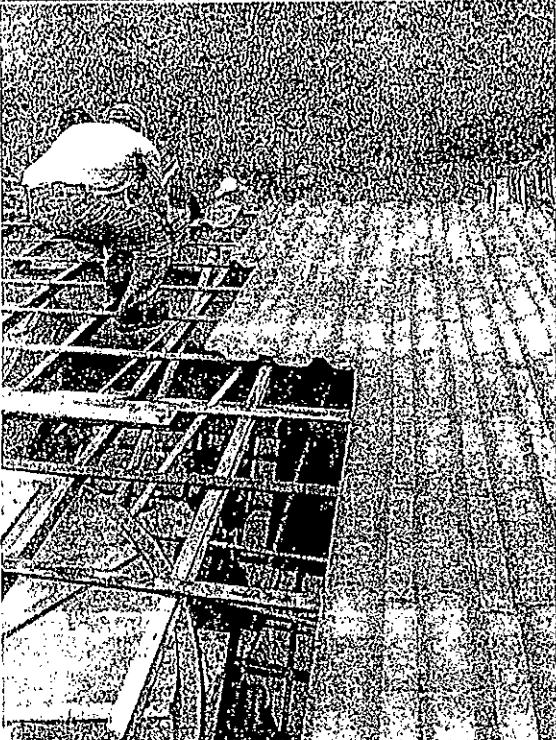



[Handwritten signature]

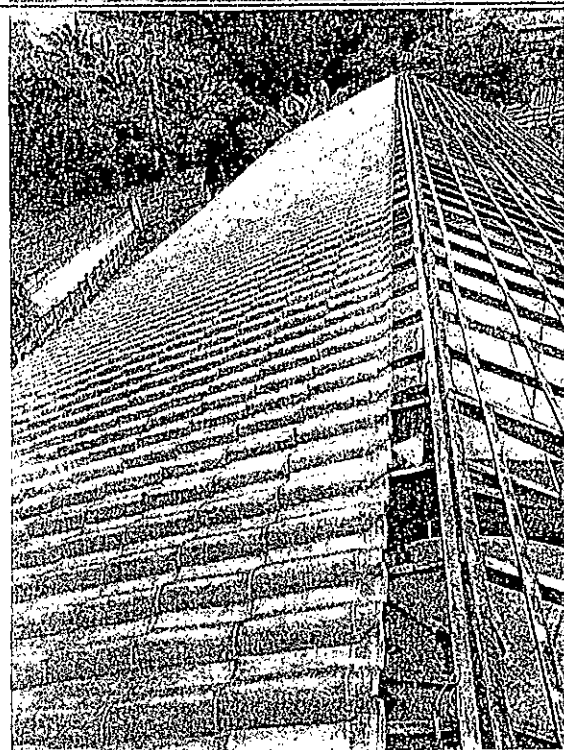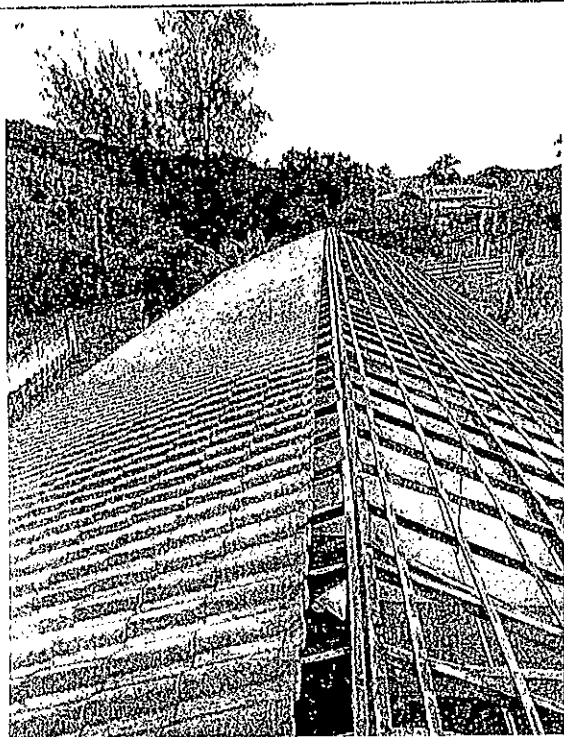


Assinatura

Assinatura





ARROJADO LISBOA				Relatório nº	16
				Data do relatório	12/02/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	29 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	29 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)	
FINALIZAÇÃO DOS REPAROS	Em Andamento

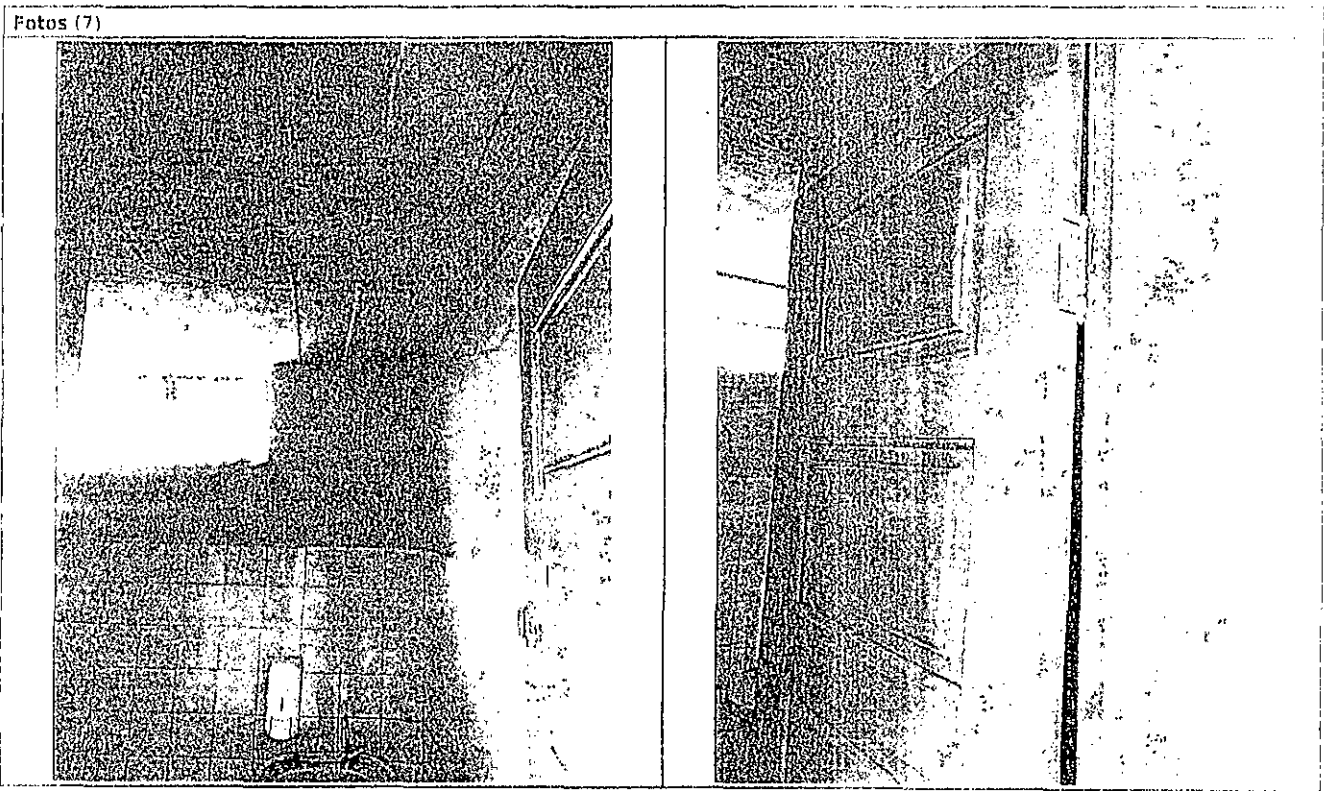

Daniel

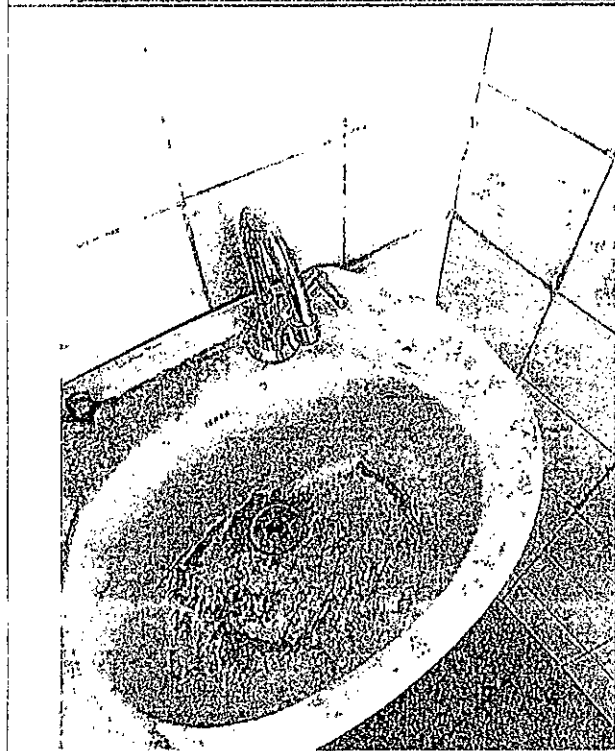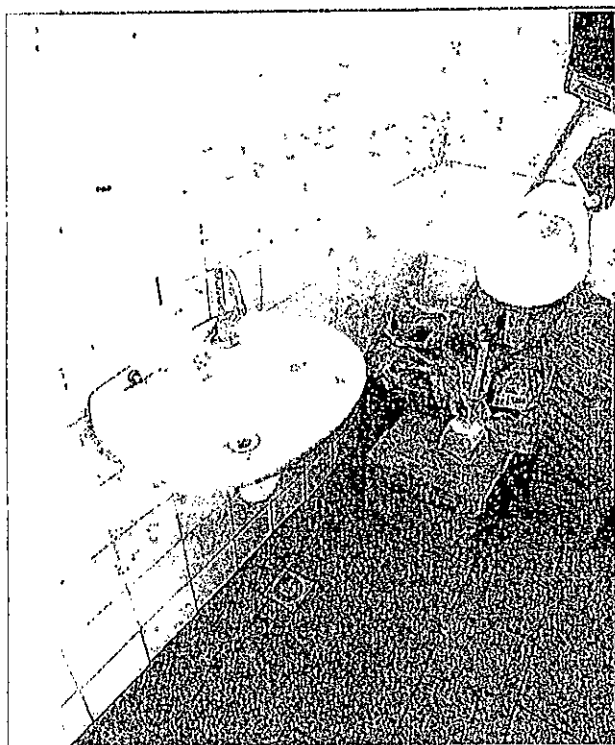

Paul

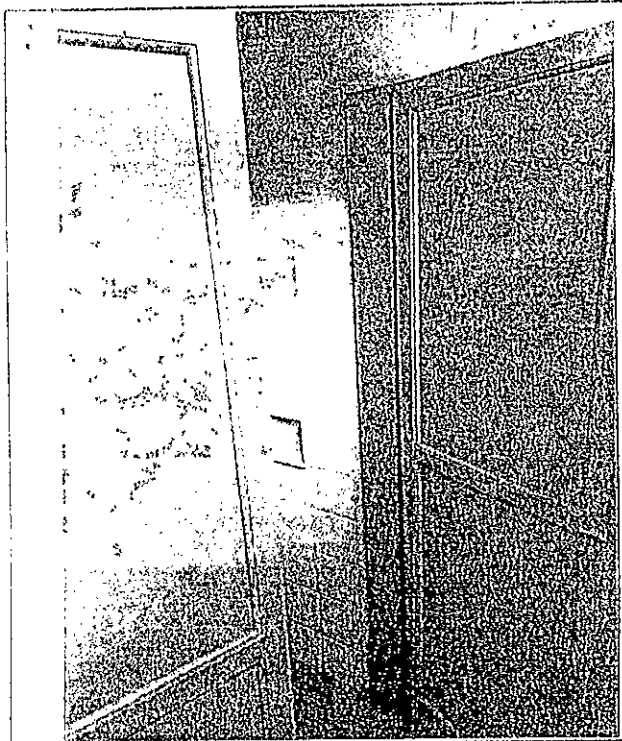

Assinatura


A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Paul' or similar, written above a horizontal line.

Assinatura





ARROJADO LISBOA				Relatório nº	15
				Data do relatório	09/02/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	26 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	32 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável




Atividades (1)	
FINALIZAÇÃO DOS REPAROS	Em Andamento

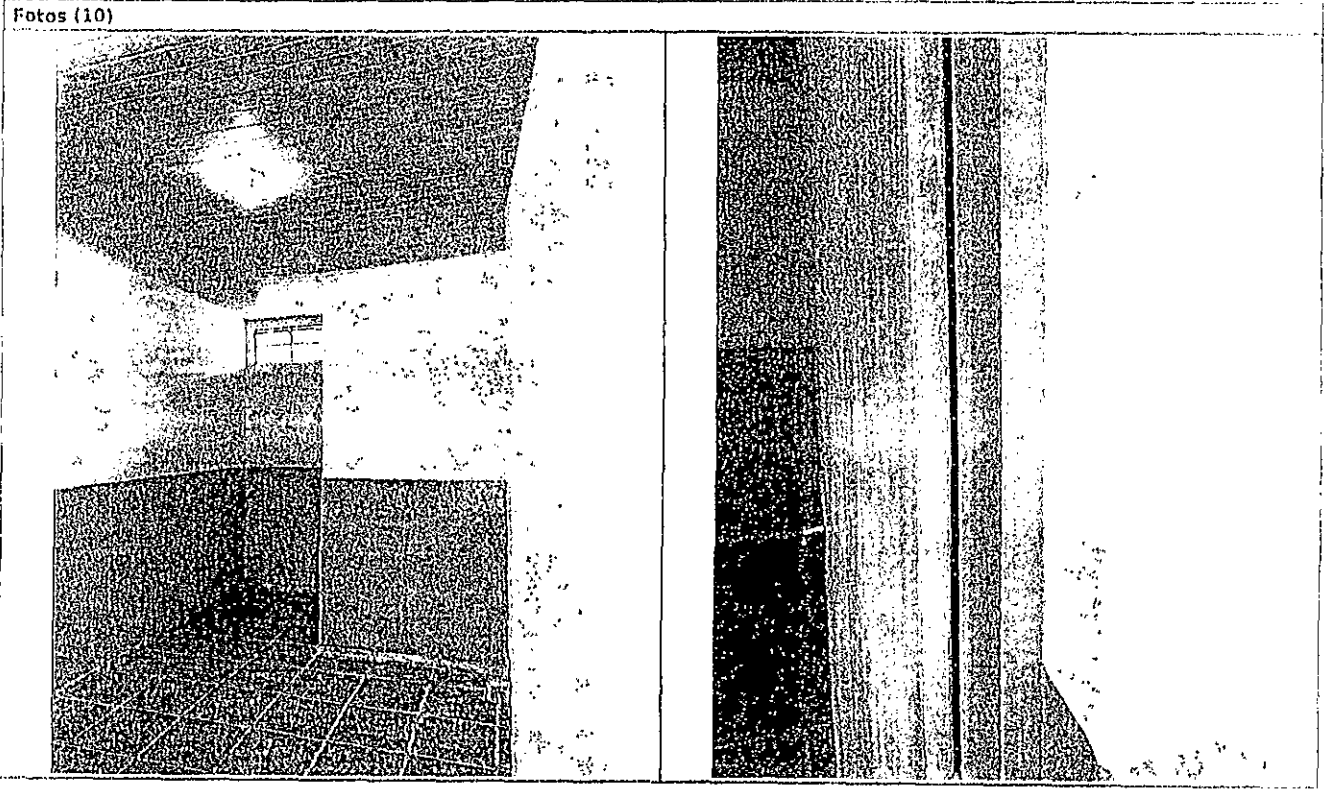

Ass

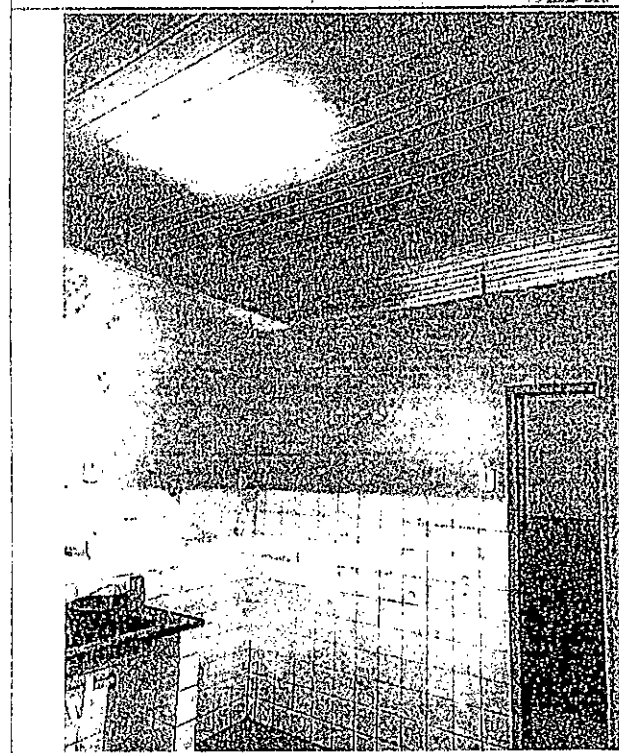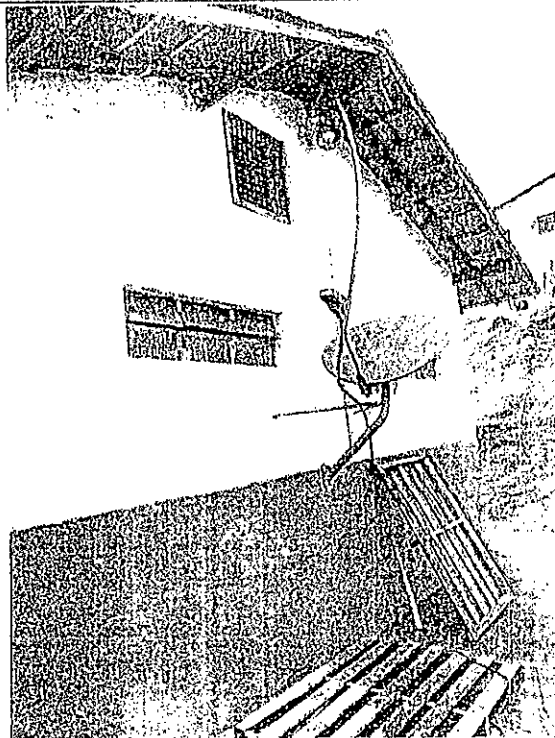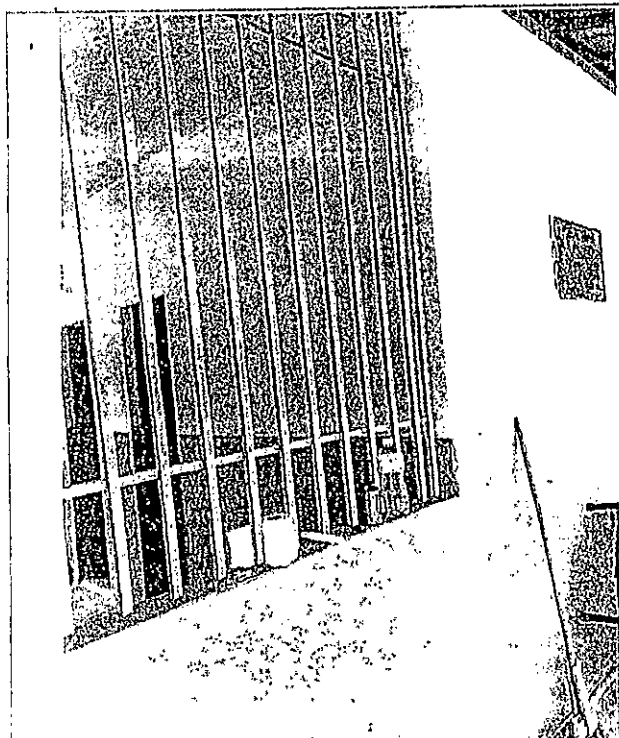

Prof

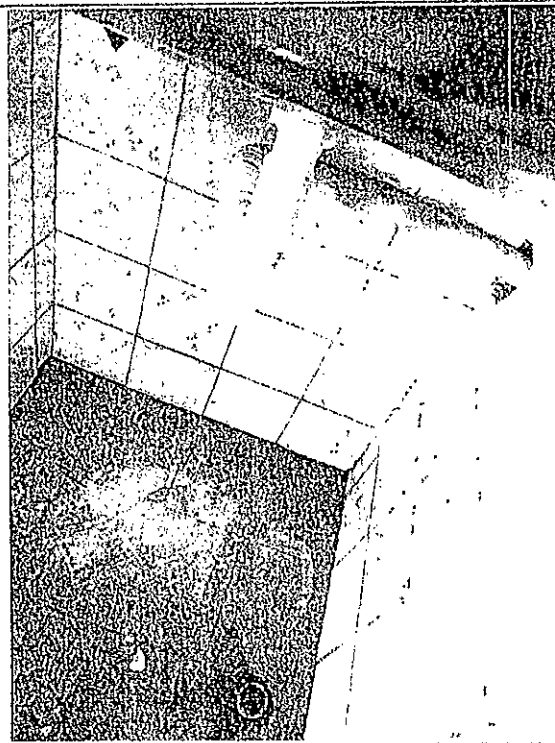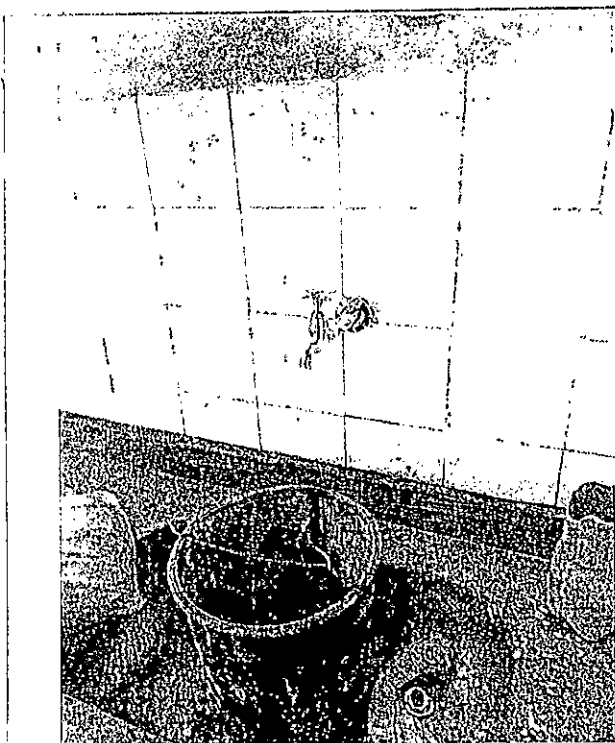

Assinatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Duf'.

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	14
				Data do relatório	08/02/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	25 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	33 dias





Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZAÇÃO DOS REPAROS	Em Andamento


Fotos (10)



[Handwritten signature]

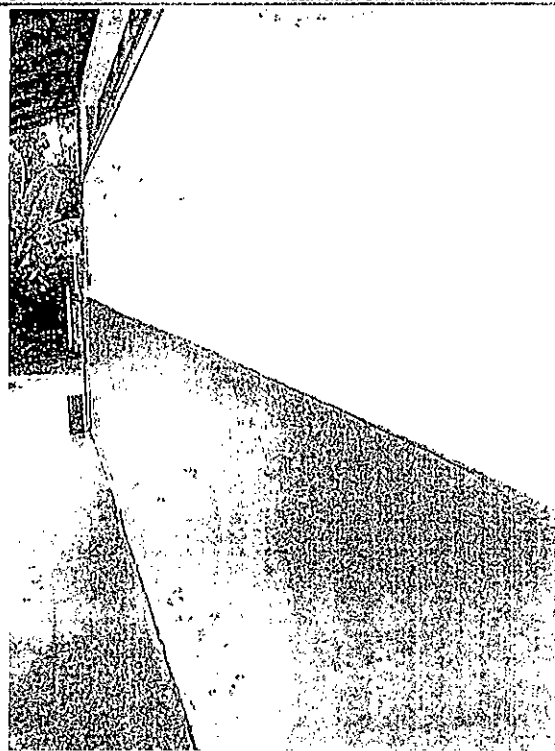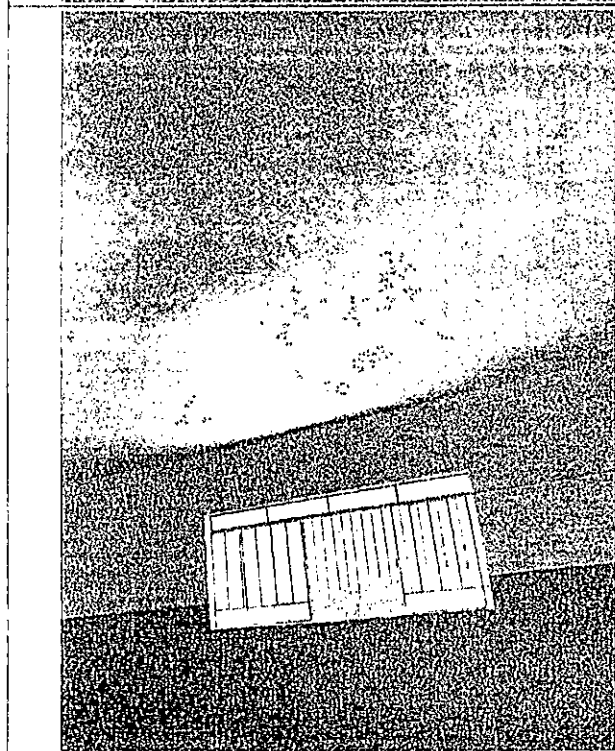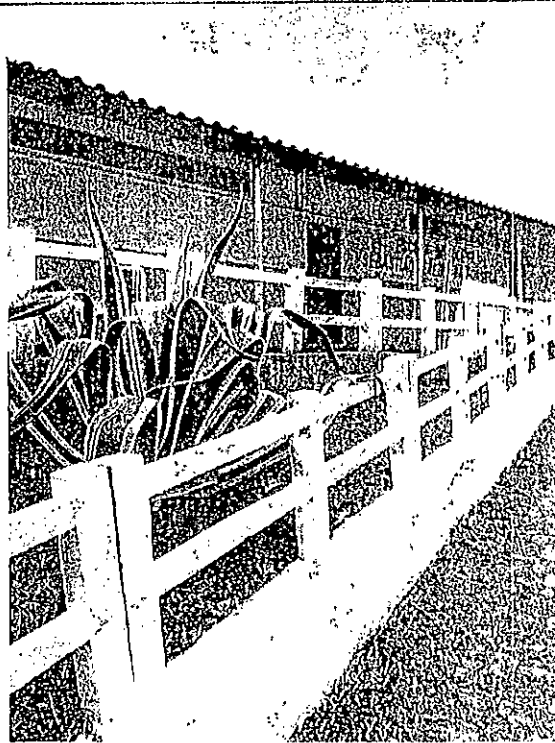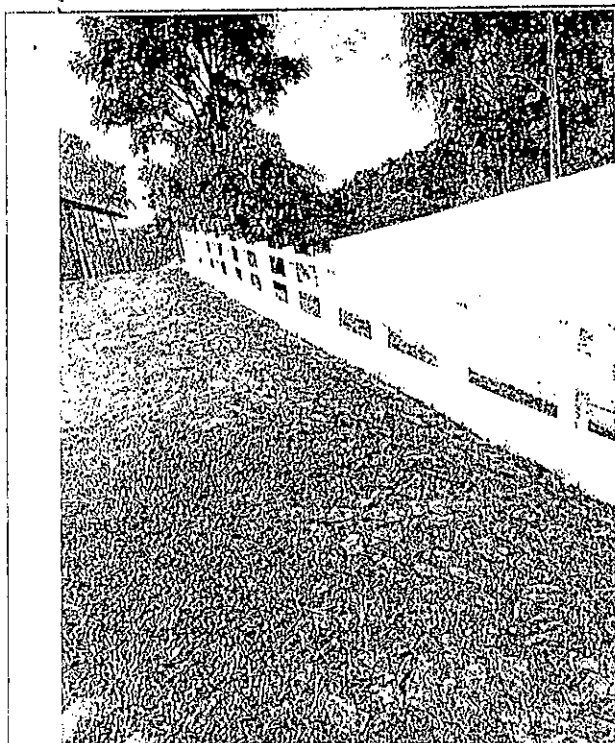

Handwritten signature

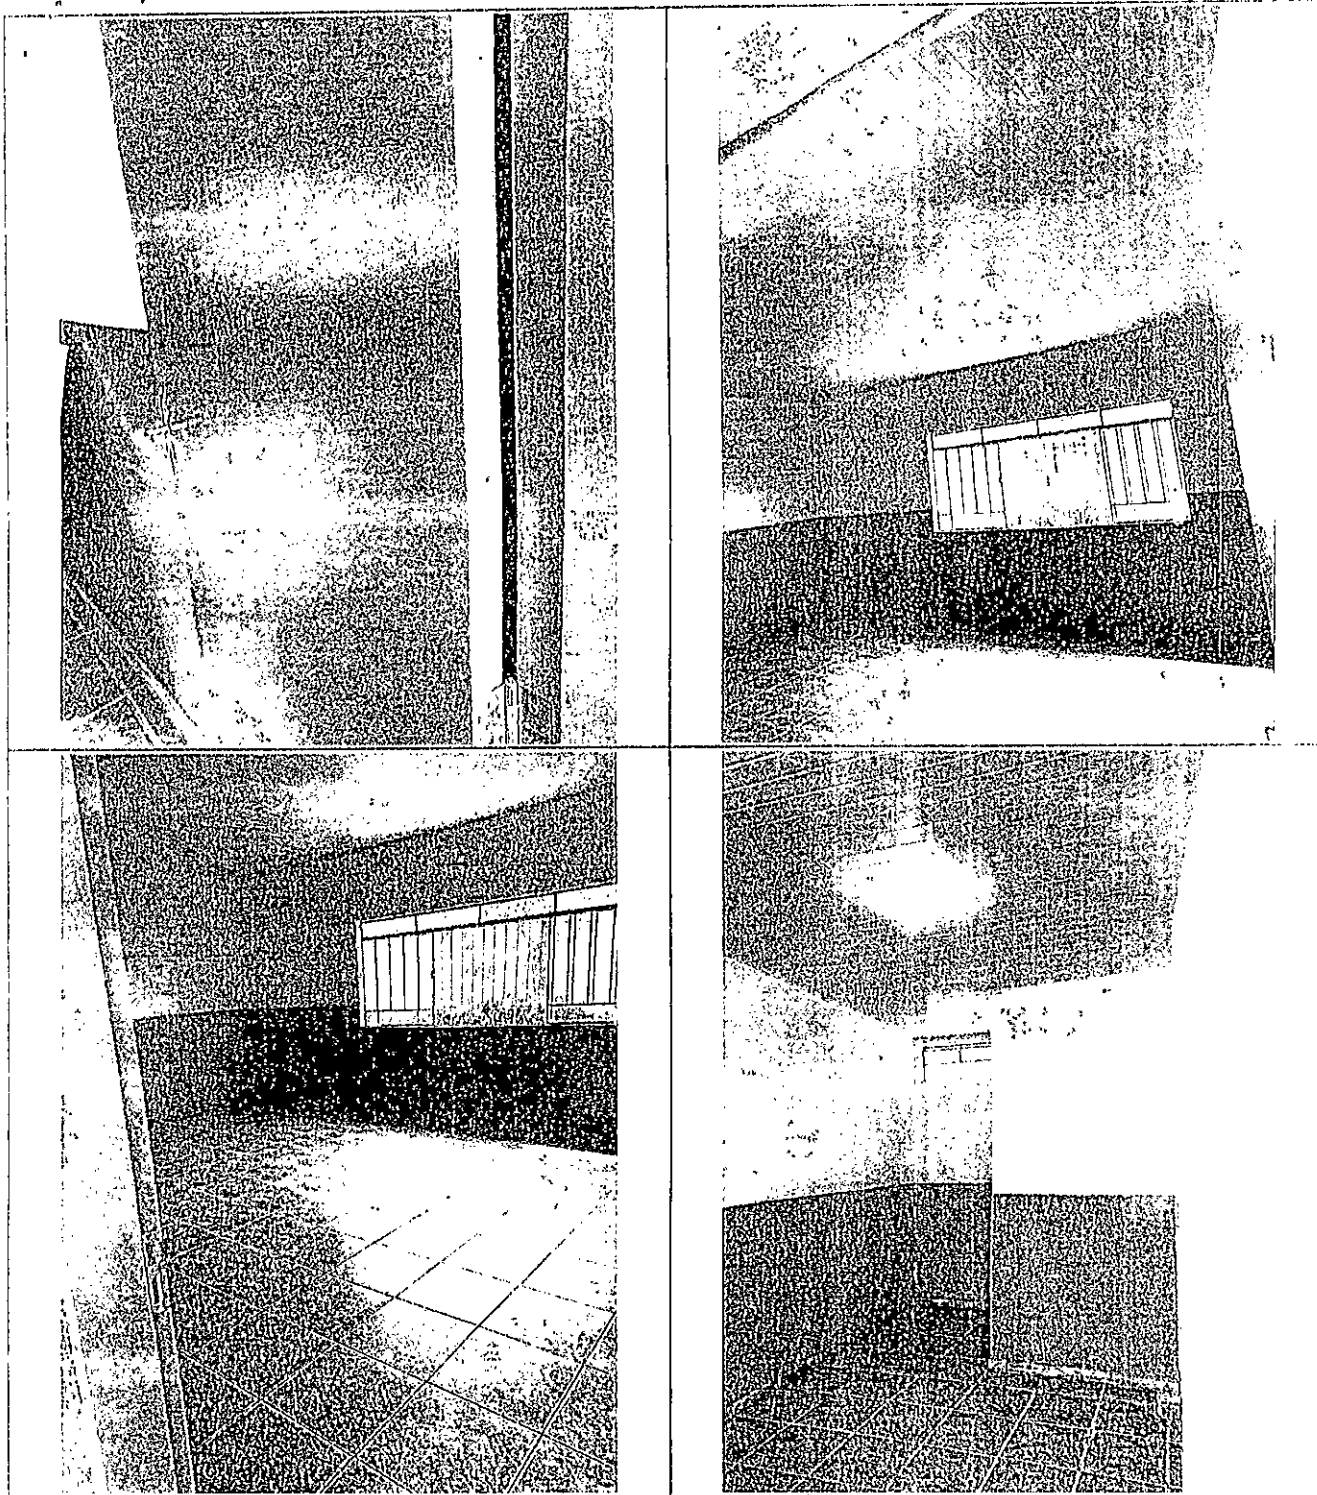

Assinatura


[Handwritten signature]

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório n°	13
				Data do relatório	07/02/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	24 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	34 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZAÇÃO DOS REPAROS	Em Andamento

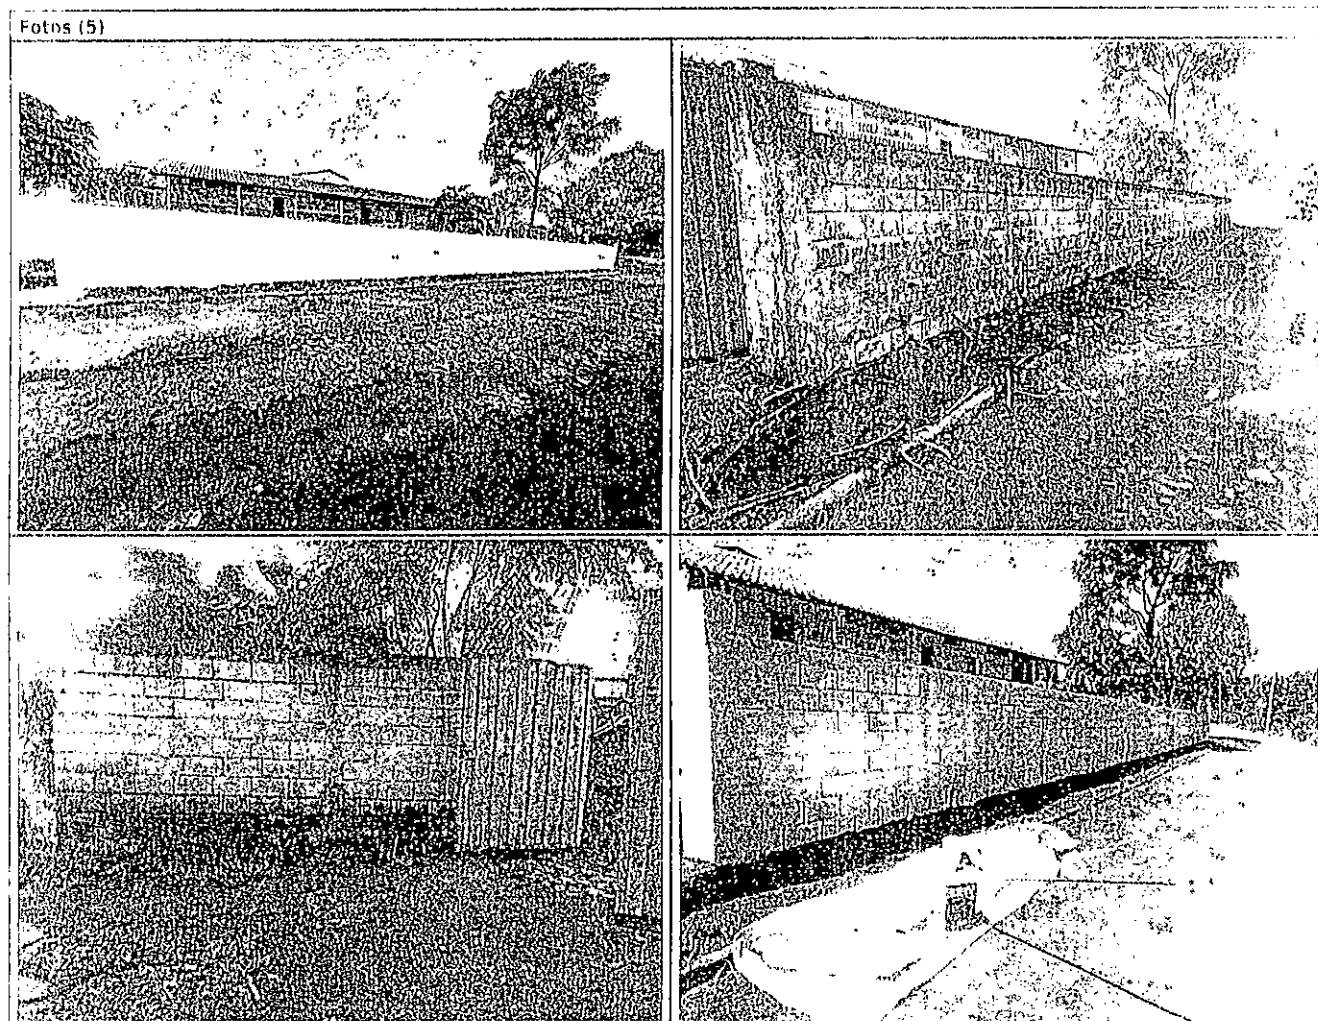

[Handwritten signature]

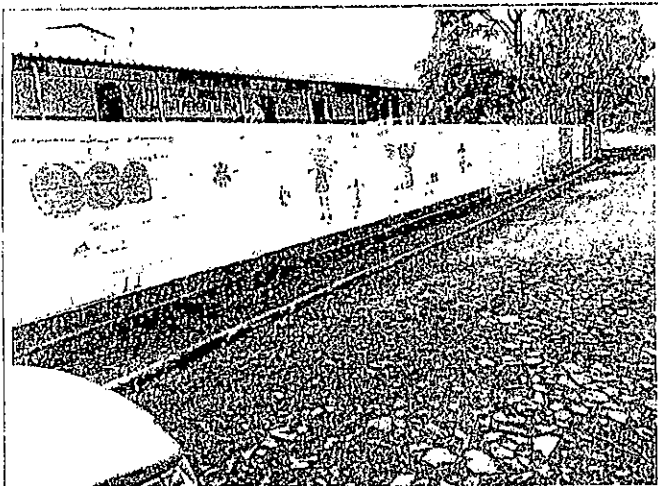

Assinatura


A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	12
				Data do relatório	06/02/2024
				Dia da semana	Terça-feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	23 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	35 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

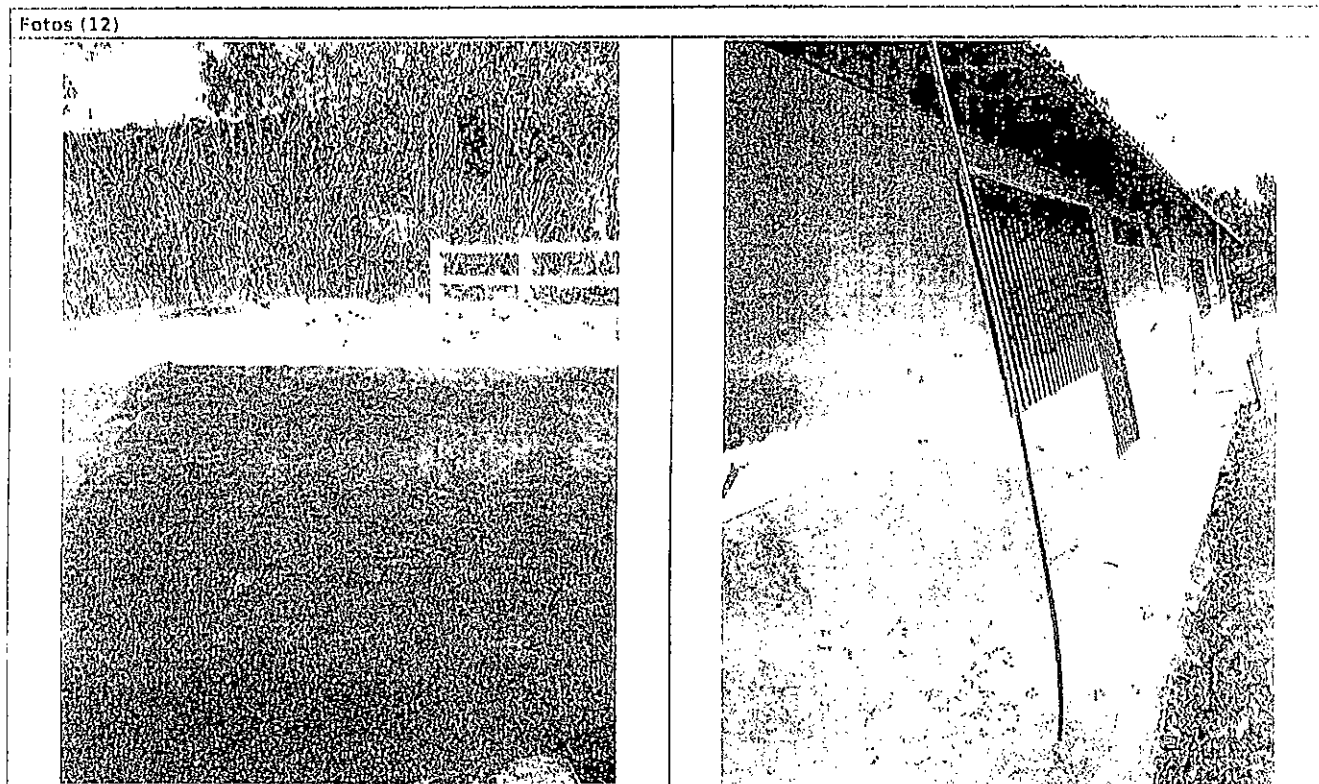


Daniele Silva

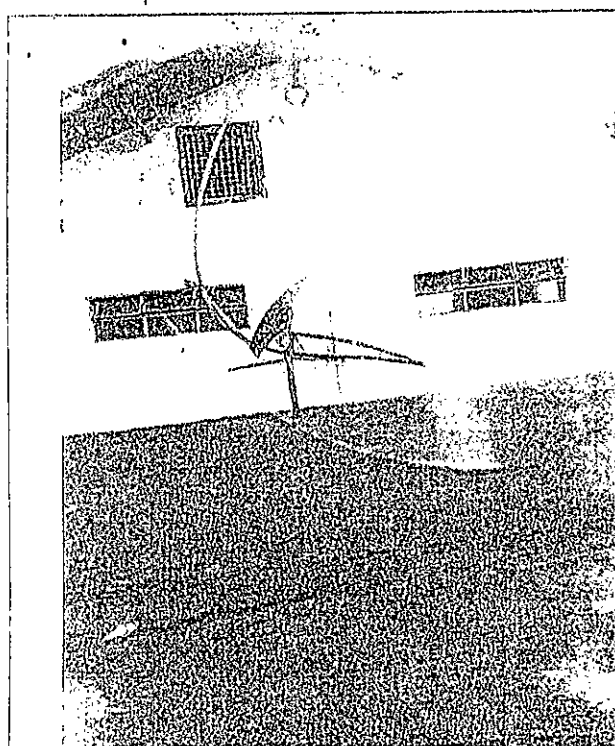

[Handwritten signature]

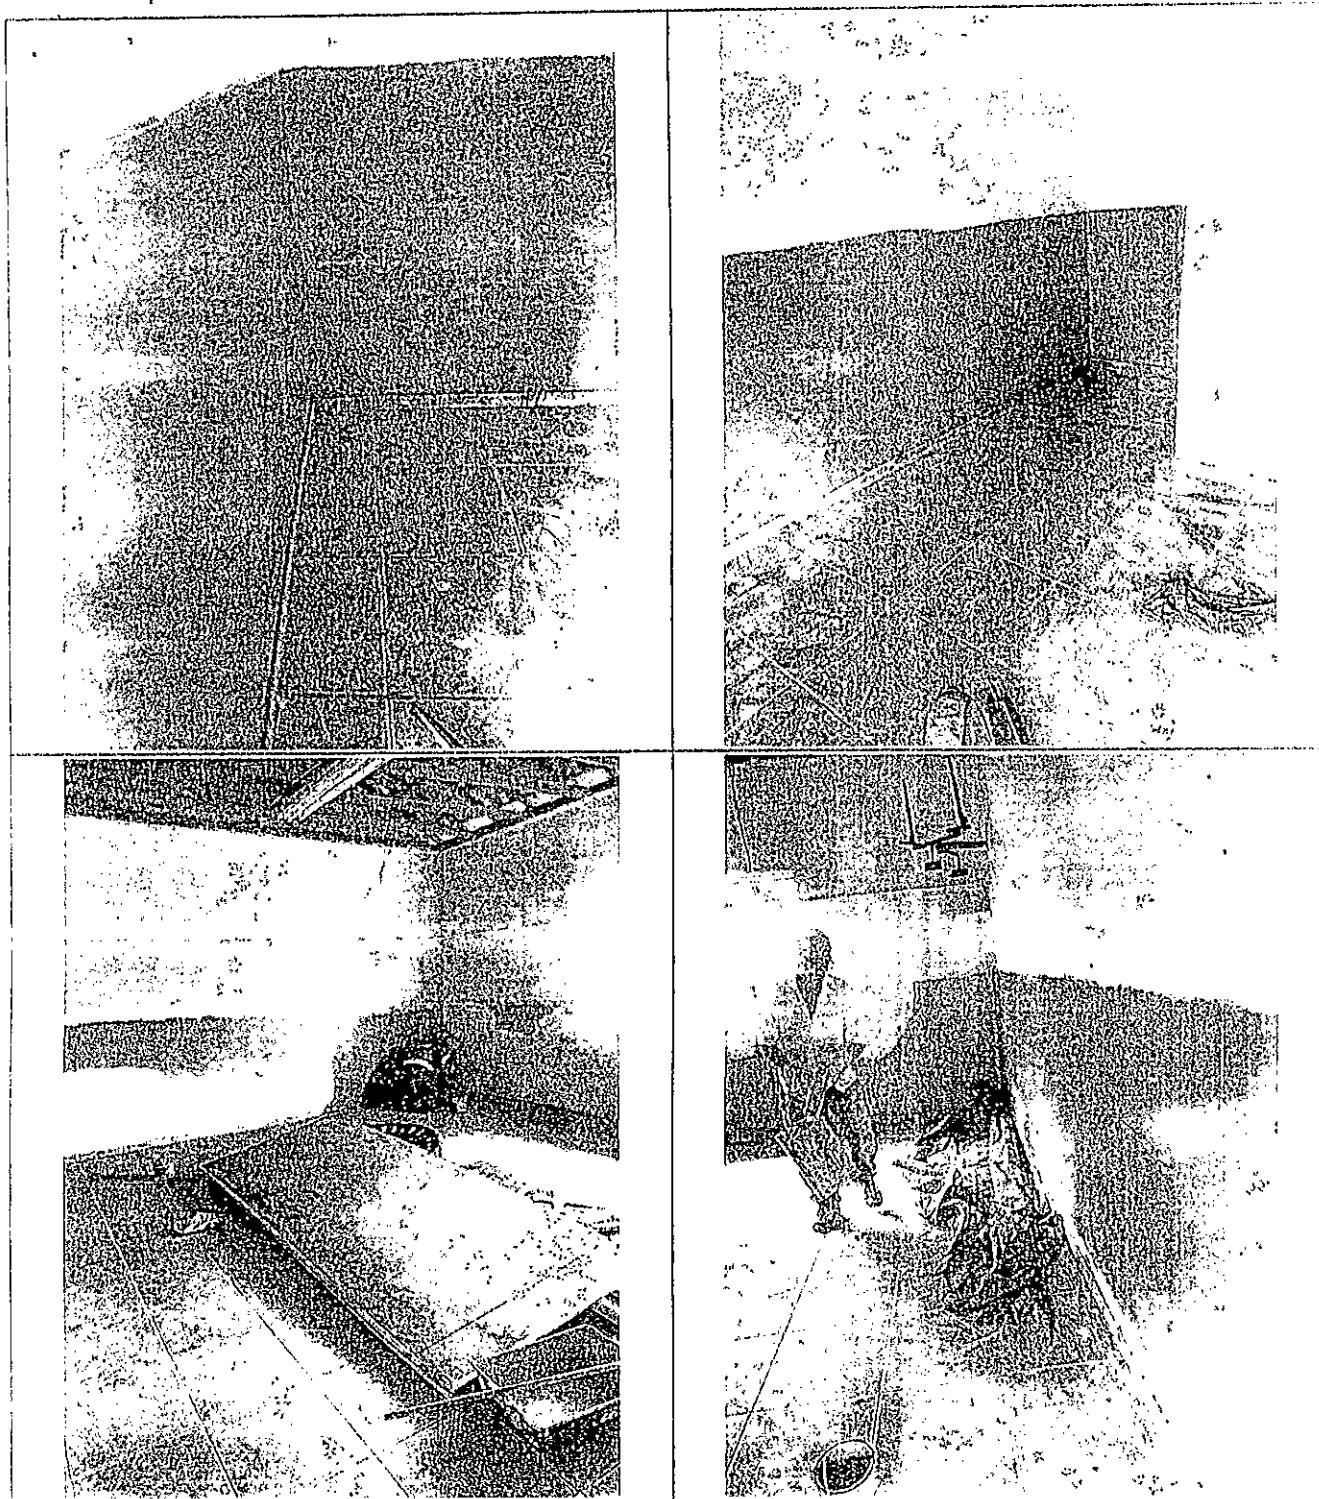

[Handwritten signature]

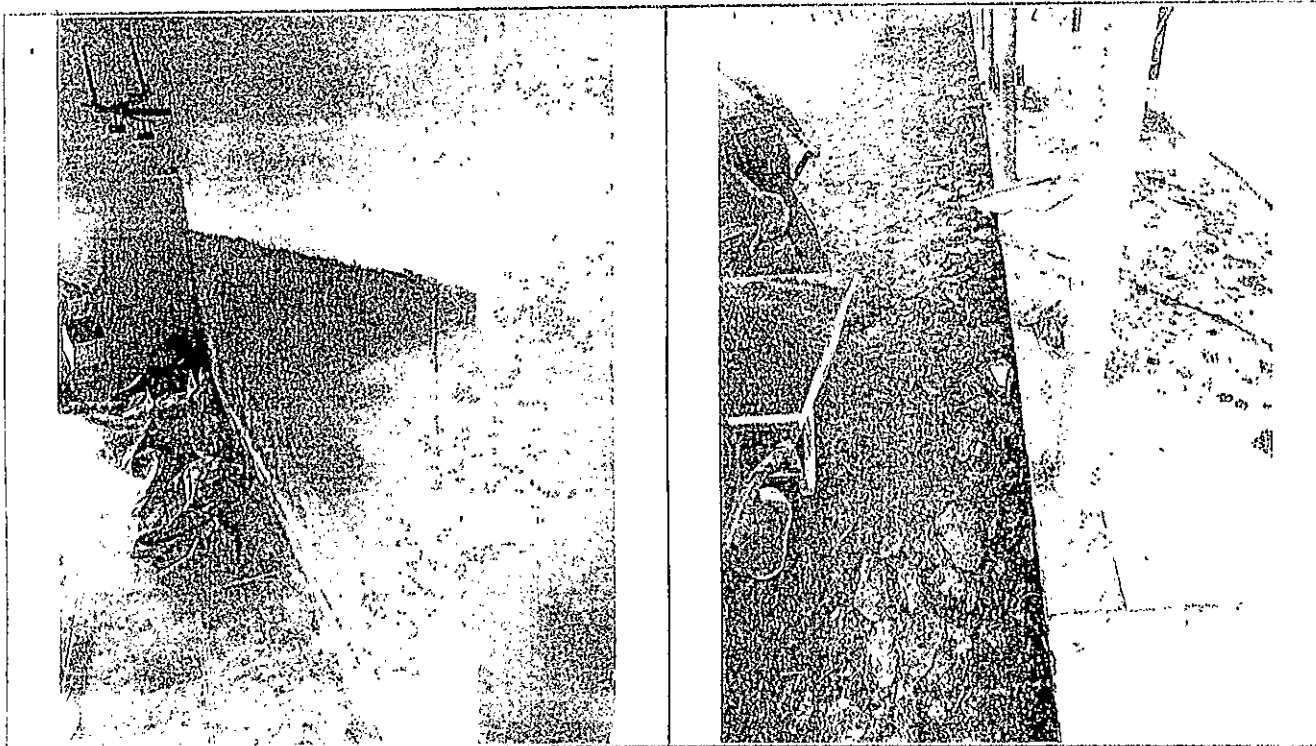


Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	11
				Data do relatório	05/02/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	22 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	36 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

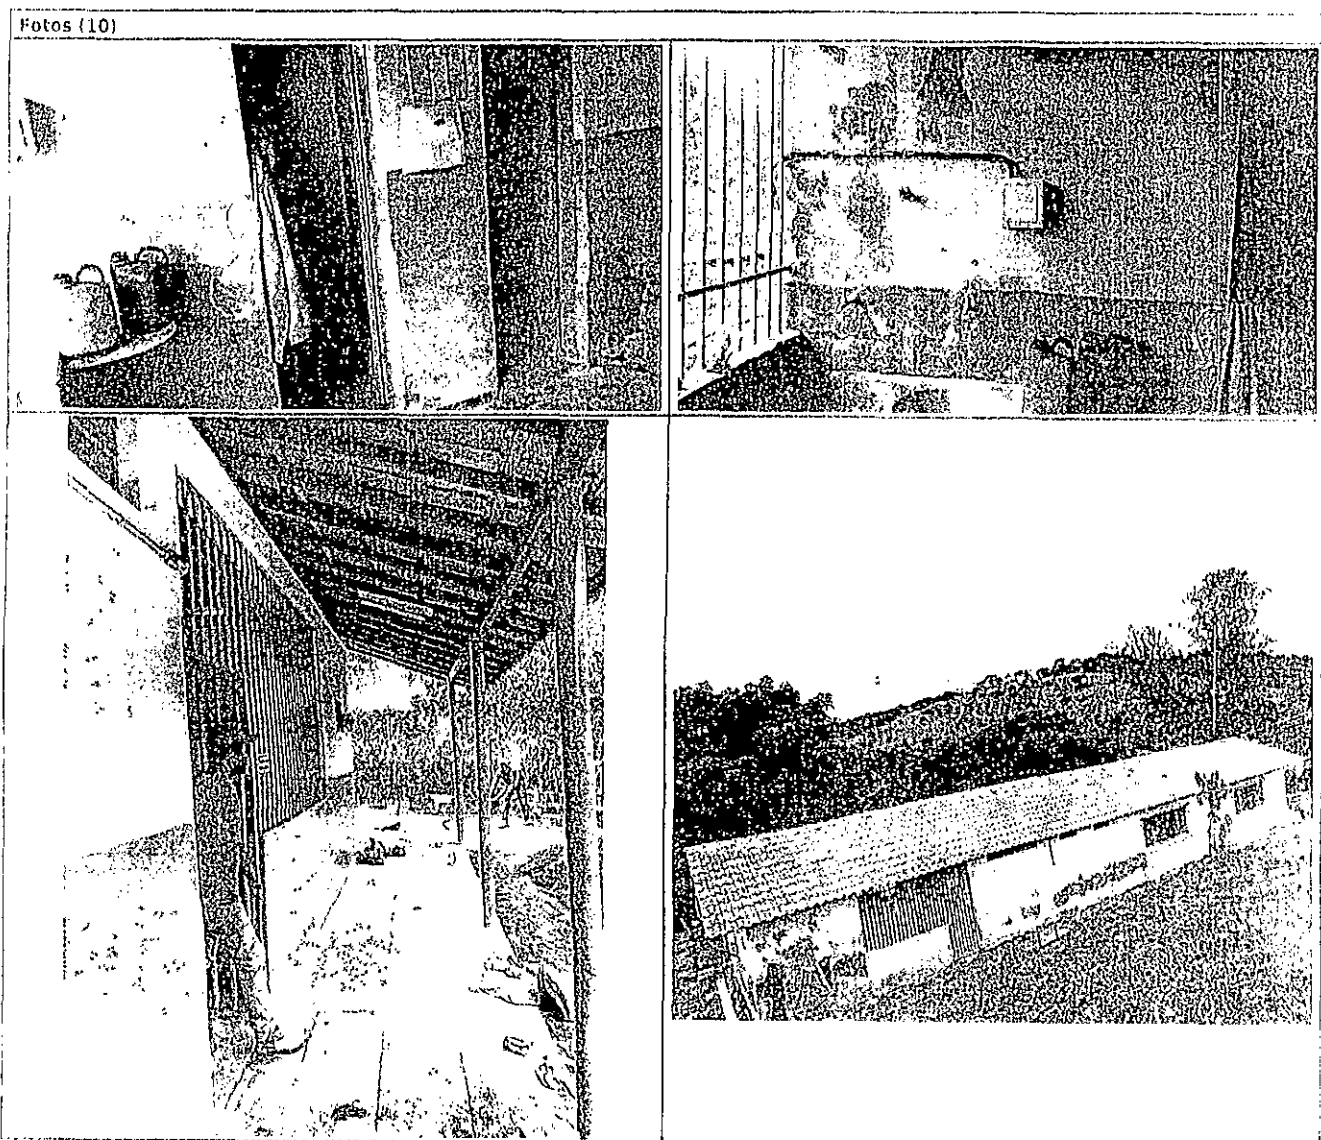*[Handwritten signature]*

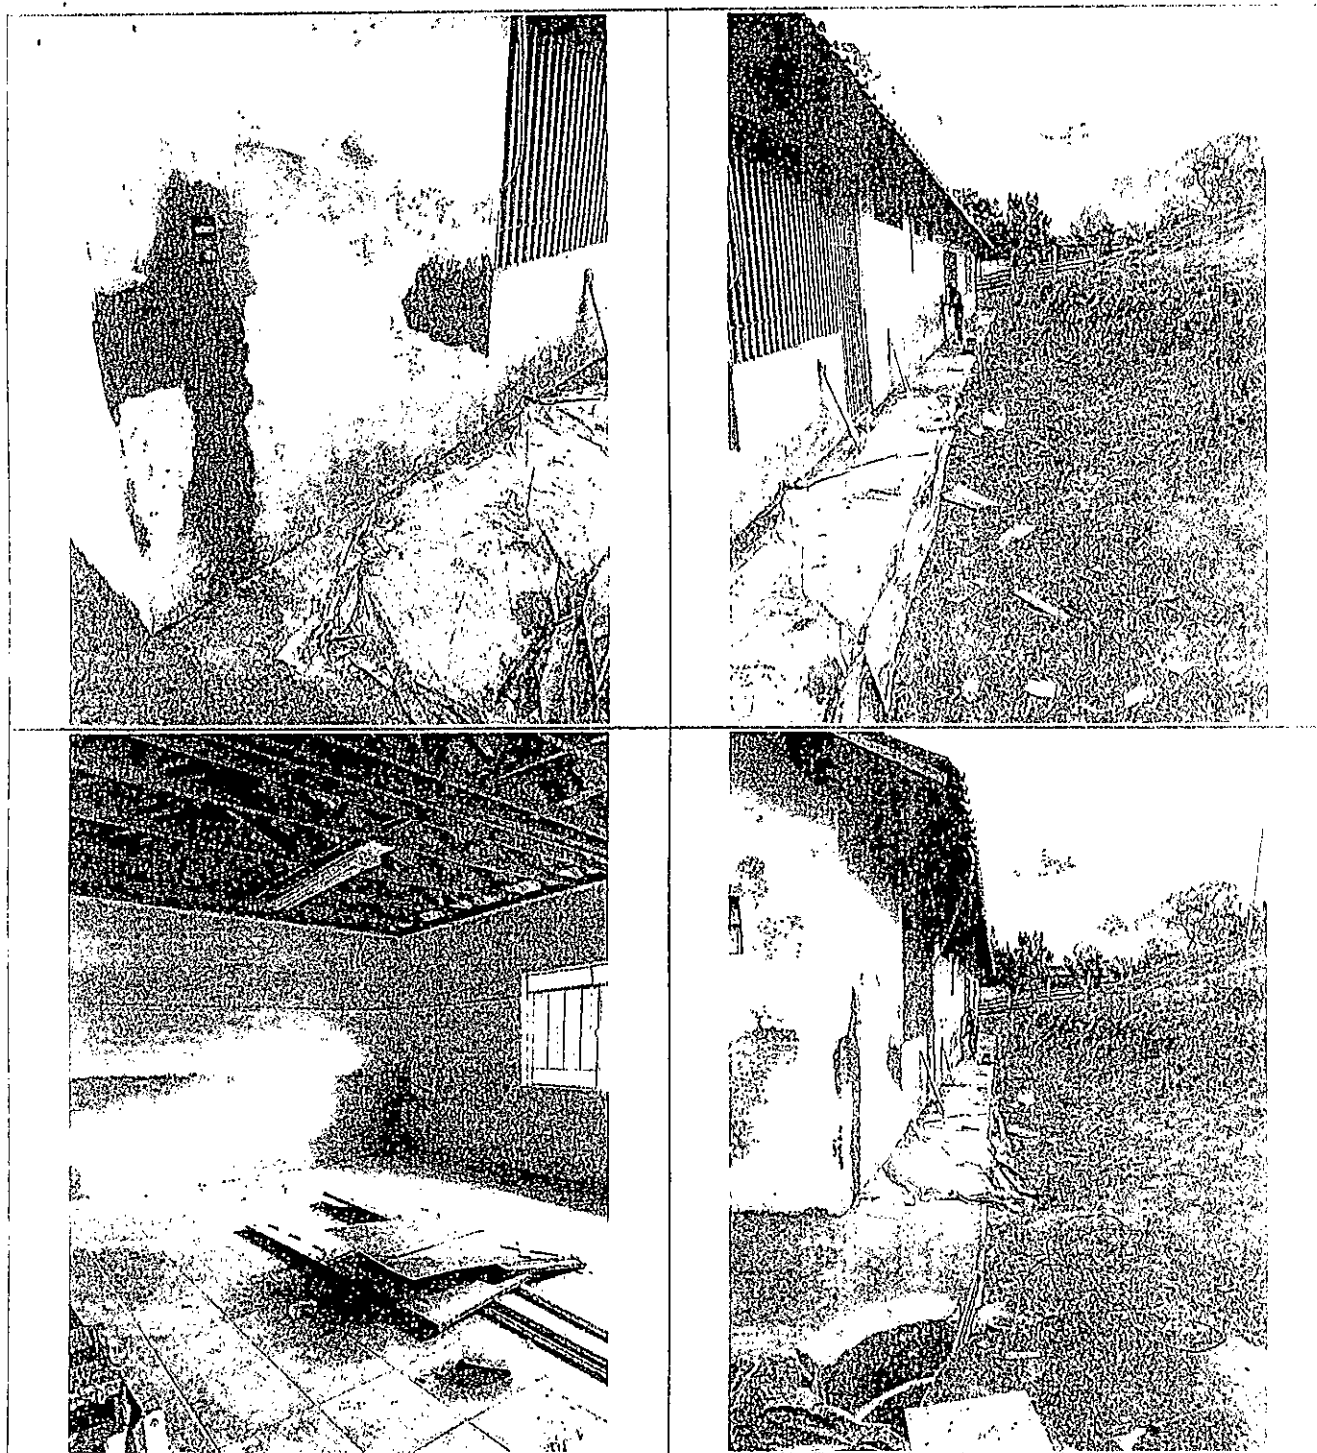

[Handwritten signature]




Assinatura

[Handwritten signature]
Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	9
				Data do relatório	01/02/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	18 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	40 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

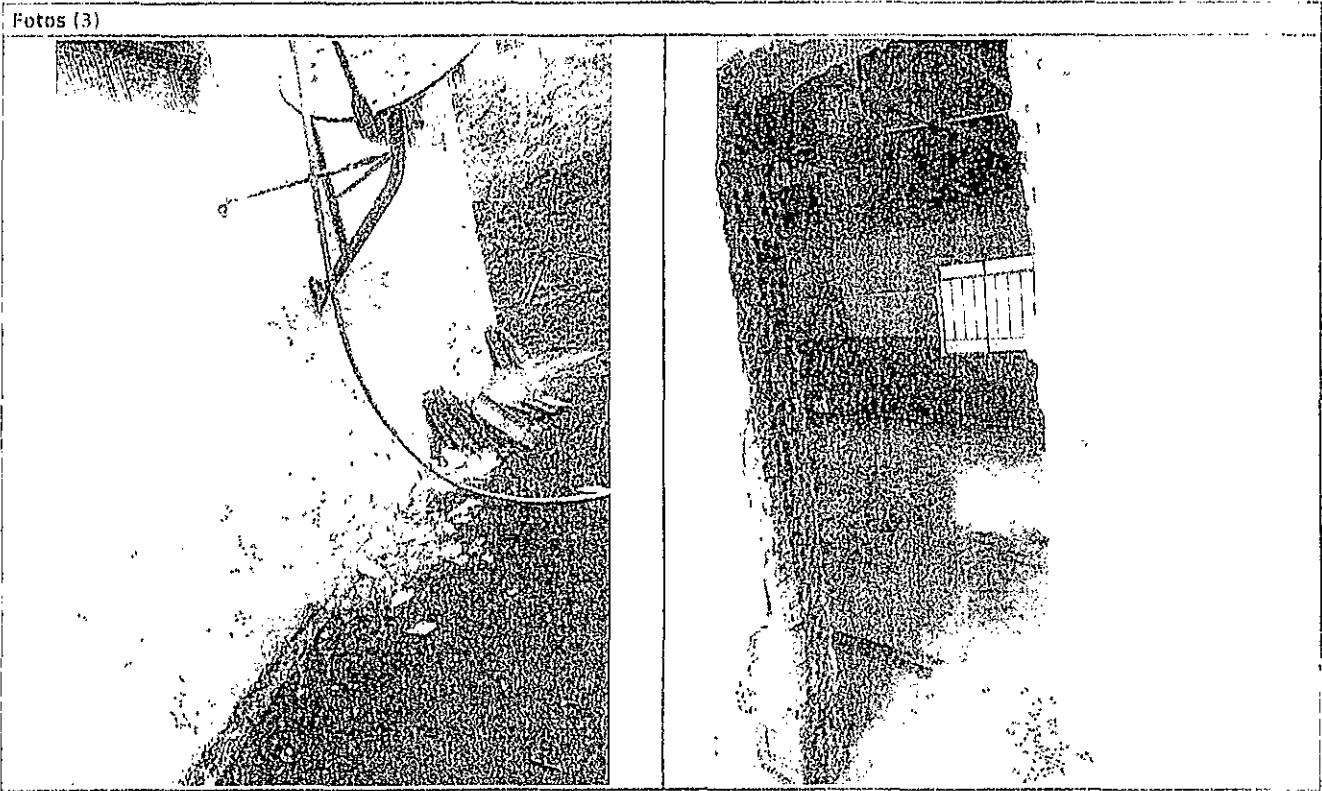

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000004
Emissão
05/02/2024 17:43:31
Código de Verificação
F60E-DF9D

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA**

CPF/CNPJ: **50.361.051/0001-17**

Endereço: **ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO -**
CEP: **35498000**

Município: **3135407 - JECEABA/MG**

Inscrição Municipal:
0000000000000004547

Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**

CPF/CNPJ: **19.718.360/0001-51**

Endereço: **AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO**
CEP: **36400026**

Município: **3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG**

E-mail:

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO FERREIRA

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 22.939,31

BASE DE CALCULO MATERIAIS : 34.408,97

Dados Bancários

Agência: 3116

C/C: 39.069-0

Sicoob

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conforme: Anexo anexo ao processo administrativo nº 10.000.000/2024

Data 07.02.2024

Assinatura Legítima Doc. Identidade

Assinatura Legítima Doc. Identidade

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
57.348,28	57.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.348,28
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033 E-mail: licitafaiete@conselhoelafaiete.mg.gov.br Site: www.	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 268/2024	
	Processo Administrativo: 90/202 Contrato: 131/202 Nº da Licitação: 98/202 Modalidade: Concorrência Data da Contratação: 09/11/202. Data da Solicitação: 04/01/202. Sequencial do Contrato: 198	

AUTORIZADA por DANIEL BRANDAO RODRIGUES

Data da tramitação: 04/01/2024

591

25/01

Fornecedor: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA

Telefone(s): 3185180219

CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS, 617, Centro - 35498-000, JECEABA - MG

E-mail: contabilidadejeceaba@outlook.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitação.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Condição de Pagamento: CONFORME CONTRATO

Prazo de Entrega: 05 DIAS ÚTEIS DA ORDEM DE SERVIÇO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

Observações: RIMS 39/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NO CEI MONSENHOR ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA.

Empenho:

Despesas:

102 - 25.001.12.361.0012.2057.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA

Desdobramento:

Recurso: 1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,026297	SV	73548	Serviço de engenharia - Prestação de serviços de		2.352.600,0000	61.866,77
2	0,000362	SV	73548	Serviço de engenharia - Prestação de serviços de		1.491.000,0000	539,86
						Total Geral:	62.406,63

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de Janeiro de 2024

DANIEL BRANDAO RODRIGUES
 Assinatura e Carimbo do Responsável



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Administração 2021/2024

ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL Nº 03/2024

Devido a necessidade de adequações na Creche Municipal Monsenhor Antônio Ferreira, conseqüentemente, possível atraso do início do período letivo. Segundo o Termo de Referência (em anexo) do contrato vigente, que caracteriza **prestação de serviço de manutenções prediais preventiva e corretiva**, definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados à Contratante.

Tendo em vista a proximidade do início do período letivo escolar, a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 19.718.360/0001-51, autoriza a partir desta data, a empresa CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA., celebrado entre as partes através do Processo Licitatório 090/2023, Concorrência Pública 007/2023, a dar início aos **serviços emergenciais**, objeto do contrato acima, referente as manutenções da Creche Municipal Monsenhor Antônio Ferreira, localizada neste município.

Conselheiro Lafaiete - MG, 11 de janeiro de 2024.

Kildare Bittencourt Dutra
Secretário Adjunto de Obras e
Meio Ambiente

Secretaria Municipal de
Educação

Lúcia Silva
Engenheira Civil

Ciente,

HUDSON DALMO FARIA Assinado de forma digital por
FERNANDES:092522166 HUDSON DALMO FARIA
00 FERNANDES:09252216600
Dados: 2024.02.07 09:01:13 -03'00'

CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente.

Administração 2021/2024

- **ORDENS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS** – Definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE.

A Secretaria solicitante do serviço emergencial deverá apresentar ofício para a Secretaria de Obras e Meio Ambiente com justificativa para sua emergencialidade;

As ordens de serviços emergenciais deverão ser iniciadas em até 72 (setenta e duas) horas, a contar da sua emissão;

Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando minimizar os transtornos/prejuízos decorrentes. Para tanto, a CONTRATADA deverá providenciar, com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente nas áreas de hidráulica e eletricidade;

Após o início do atendimento de serviço emergencial, a CONTRATADA terá um prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar a planilha com os serviços a serem realizados.

É de responsabilidade da CONTRATADA zelar para que os serviços prestados emergencialmente estejam de acordo com as planilhas de referência (SEINFRA e SINAPI).

- **ORDENS DE SERVIÇOS COMUNS** – Definem-se como comuns os serviços que não necessitam de atendimento imediato devendo ser iniciados no prazo regulamentado de até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da OS.

A demora para dar início ou para concluir os atendimentos emergenciais e comuns por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional será comunicada pela Fiscalização de imediato à CONTRATADA, podendo gerar penalidades em caso de não atendimento satisfatório.

8. CAPACIDADE TÉCNICA

A execução será por empresa tecnicamente especializada. A comprovação se dará conforme segue, e a documentação constante da inscrição deve estar organizada, completa e apresentada na seguinte ordem com dispositivos separadores os mais claros possíveis:

a) Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Arquitetura (CAU), em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG, para assinatura do contrato.

b) Declaração indicando quais profissionais que serão os responsáveis técnicos pela empresa encarregados da execução do serviço;

c) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional(is) de nível superior, o(s) qual(is) será(ão) o(s) RT(s) da obra (conforme alínea b), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico), devidamente registrado(s), na entidade profissional competente, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços similares de construção civil e semelhantes ao objeto da presente licitação, que deverão estar, preferencialmente grifados, para melhor visualização quando da análise pela Comissão.

d) Prova de que os profissionais, designados como Responsáveis Técnicos pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador de serviços



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

Relatório de Visita – Manutenção Predial

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

DATA DA VISITA: 04/01/2024

Horário: Manhã

Local Visitado: Creche Monsenhor Antônio Ferreira

Secretaria Responsável: Secretaria Municipal de Educação

Nome do funcionário da prefeitura que acompanhou: Albano e Adão

Serviços Solicitados:

- TROCA DE TELHAS SOLTAS
- PORTAS
 - 1 porta de 60cm
 - 4 portas de 70cm
 - 7 portas de 80cm
- ELÉTRICA
 - Uma tomada atrás da geladeira
 - Interruptor na entrada
 - 15 plafons e lâmpadas
 - Condulete
 - Eletroduto
 - 4 tomadas duplas
 - Lâmpadas do lado de fora
- PINTURAS
 - Contrapiso na frente e no fundo da escola
 - Pintura geral de portas, janelas, paredes externas e internas
 - Se possível, fazer desenho na fachada
- TROCA DE VIDROS
- TESTAR CHUVEIRO
- FITA ANTIDERRAPANTE NO PISO
- REPARO NO PISO E NO VASO SANITÁRIO

Assinatura

Fiscal do Contrato

Assinatura

Secretaria Responsável



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 08/2024

CI

DATA: 02/01/2024

FL.: 1/1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Secretaria Municipal de Educação

A/C: Albano Tibúrcio

CÓPIA

ASSUNTO: Solicitação de Empenho

Prezado,

A Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, representada pelo Secretário Adjunto de Obras e Meio Ambiente Kildare Bittencourt Dutra, em atendimento a solicitação desta secretaria para reparos na **Creche Monsenhor Antônio Ferreira**, localizada nesta cidade, estamos encaminhando planilha de quantidades para empenho. Assim que estiver pronto, gentileza nos enviar.

Desde já agradecemos.

Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Recebido


12/01/24



PLANILHA RESUMO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DATA:	02/01/2024
NOME:	MONSENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA	BDI:	25,92%
CONTRATADO:	ARROJADO LISBOA	DESC. SINAPI:	21,58%
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023	DESC. SEINFRA:	25,45%
OBJETO:	REPARO GERAL NA CRECHE		
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0	R\$ 80.333,1500	R\$ 61.866,7700
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0	R\$ 724,0150	R\$ 539,8600

TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:		R\$ 81.057,17	R\$ 62.406,63
OBS..	Levantamento:	Conferência:	
Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação.	ARROJADO LISBOA	 Luisa Silva Eng. Civil	



PLANILHA ESTIMATIVA

SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
NOME		CÍCERO MONTEIRO ANTONIO FERREIRA	
CONTRATADO:		ARROJADO LIZBIA	
ATA REGISTRO DE PREÇOS:		02/27/2023	
OBJETO:		REPARO GERAL NA GRESHE	
REFERÊNCIA:		2023/08, SETOP, LISTE COM, DISONERAÇÃO	
		2023/11 SINAPI, MG, DESONERADO	

ITEM	RECE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM EDI	PREÇO UNITÁRIO COM EDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM BDI E DESCONTO
1	SEINFRA	ED-7830	SERRAVAL EIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	56,00	R\$ 24,25	R\$ 30,54	R\$ 23,95	R\$ 1.710,24	R\$ 1.341,20
2	SEINFRA	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	711,00	R\$ 11,93	R\$ 15,02	R\$ 11,78	R\$ 10.679,22	R\$ 8.375,58
3	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	711,00	R\$ 32,34	R\$ 40,72	R\$ 31,93	R\$ 28.951,92	R\$ 22.702,23
4	SEINFRA	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m²	131,00	R\$ 33,38	R\$ 42,03	R\$ 32,96	R\$ 5.505,93	R\$ 4.317,76
5	SEINFRA	ED-50574	APLICAÇÃO DE FANAFITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRÁUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	3,00	R\$ 13,62	R\$ 17,15	R\$ 13,45	R\$ 51,45	R\$ 40,95
6	SEINFRA	ED-49585	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARRAFADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	U	1,00	R\$ 340,41	R\$ 428,64	R\$ 336,14	R\$ 428,64	R\$ 336,14
7	SEINFRA	ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	12,00	R\$ 111,98	R\$ 141,01	R\$ 110,58	R\$ 1.692,12	R\$ 1.326,96
8	SEINFRA	ED-49586	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARRAFADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	U	4,00	R\$ 347,04	R\$ 436,99	R\$ 342,69	R\$ 1.747,96	R\$ 1.370,76
9	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARRAFADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	U	7,00	R\$ 353,69	R\$ 445,37	R\$ 349,26	R\$ 3.117,59	R\$ 2.444,82
10	SEINFRA	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T200A 250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,00	R\$ 14,54	R\$ 18,31	R\$ 14,36	R\$ 18,31	R\$ 14,36
11	SEINFRA	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,00	R\$ 14,91	R\$ 18,77	R\$ 14,72	R\$ 18,77	R\$ 14,72
12	SINAPI	38773 INSUMOS	LUMINÁRIA DE TETO PLAFONPLAFONER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	un	15,00	R\$ 7,58	R\$ 9,54	R\$ 7,11	R\$ 143,10	R\$ 106,65
13	SINAPI	0247 INSUMOS	AJUDANTE ELÉTRICISTA (HORISTA)	hora	4,50	R\$ 13,88	R\$ 17,48	R\$ 13,03	R\$ 78,66	R\$ 59,64

Handwritten signature

Handwritten signature

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	PREÇO UNITÁRIO SEM IPI	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO UNITÁRIO COM IPI E DESCONTO	VALOR TOTAL COM IPI	VALOR TOTAL COM IPI E DESCONTO
14	SINAPI	2436 INSUMOS	ELETRICISTA (HORISTA)	hora	4,50	R\$ 18,40	R\$ 23,17	R\$ 17,27	R\$ 104,27	R\$ 77,32
15	SINAPI	38193 INSUMOS	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 (127/220 V)	un	15,00	R\$ 15,58	R\$ 19,52	R\$ 14,63	R\$ 294,30	R\$ 219,45
16	SEINFRA	ED-17954	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 28,46	R\$ 35,84	R\$ 28,11	R\$ 143,36	R\$ 112,44
17	SEINFRA	ED-17951	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	3,00	R\$ 5,11	R\$ 6,43	R\$ 5,04	R\$ 19,29	R\$ 15,12
18	SEINFRA	ED-15762	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT5E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	4,00	R\$ 65,44	R\$ 82,40	R\$ 64,62	R\$ 329,60	R\$ 258,48
19	SINAPI	1074 INSUMOS	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, CONDUTOR, 480/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	40,00	R\$ 1,82	R\$ 2,29	R\$ 1,71	R\$ 91,60	R\$ 68,40
20	SINAPI	20111 INSUMOS	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 75°C V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	m	1,00	R\$ 9,60	R\$ 12,09	R\$ 9,01	R\$ 12,09	R\$ 9,01
21	SEINFRA	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA CORRIDA (PVA)	m2	350,00	R\$ 29,39	R\$ 37,01	R\$ 29,02	R\$ 12.953,50	R\$ 10.157,00
22	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA CORRIDA (PVA)	m2	350,00	R\$ 16,49	R\$ 23,28	R\$ 18,26	R\$ 8.148,00	R\$ 6.391,00
23	SEINFRA	ED-51155	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E MEDIÇÃO COM GUARNIÇÃO/CAIXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CADELO/HOVERFL	m2	15,00	R\$ 133,05	R\$ 167,55	R\$ 131,39	R\$ 2.513,25	R\$ 1.970,85
24	SEINFRA	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	20,00	R\$ 34,28	R\$ 43,17	R\$ 33,85	R\$ 863,40	R\$ 677,00
25	SEINFRA	ED-50722	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), PETA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	20,00	R\$ 57,20	R\$ 72,03	R\$ 56,49	R\$ 1.442,60	R\$ 1.129,80
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:						R\$ 81.057,17	R\$ 81.057,17	R\$ 81.057,17	R\$ 81.057,17	R\$ 63.536,43
OBS:						CONFERENCIA:				
Esta planilha de quantidades é uma estimativa de serviços a serem executados, podendo durante a execução serem substituídos ou acrescidos da mesma, cabendo ao setor de fiscalização a aprovação.						Lúcia Silva				

(Assinatura)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA DE EDUCACAO

MONSENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. PERIMETRO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO VÃO (m2)	AREA (m2)	VOLUME (m3)	PESO (kg)	DENSIDADE (kg/m3)	DMT (KM)	QUANTIDADE (unif)	HORA (h)	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													56,00	hora
	TELHADO													56,0000	
2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO													711,00	m2
	ACABAMENTO													711,0000	
3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICADO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO													711,00	m2
	ACABAMENTO													711,0000	
4	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM													131,00	m2
	Contrapiso na frente e nos fundos da escola													131,0000	
5	APLICACAO DE FAIXAFITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRÁUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO													3,00	m
	ACABAMENTO													3,0000	
6	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO FRANGIETAS/ARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ													1,00	U
	ESQUADRIAS													1,0000	
7	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRÁU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CRÔMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES													12,00	U
	ESQUADRIAS													12,0000	

Wlho

8	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO 170X210CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ																		4,30	U
	ESQUADRIAS																		4,0000	
9	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO 80X210CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ																		7,00	-un
	ESQUADRIAS																		7,0000	
10	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+120A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE																		1,00	un
	ELETRICA																		1,0000	
11	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE																		1,00	un
	ELETRICA																		1,0000	
12	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)																		15,00	hora
	ELETRICA																		15,0000	
13	AJUDANTE ELETRICISTA (HORISTA)																		4,50	hora
	INSTALAÇÃO DE PLAFONS																15,00	0,3000	4,5000	
14	ELETRICISTA (HORISTA)																		4,50	un
	INSTALAÇÃO DE PLAFONS																		4,5000	
15	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)																		15,00	un
	ELETRICA																		15,0000	
16	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO																		4,00	m
	ELETRICA																		4,0000	
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASCO																		40,00	un
	ELETRICA																		40,0000	

Handwritten signature

Handwritten signature

[illegible]



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	05/02/2024	
NOME:	MONSENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO GERAL NA CRECHE				
Nº AE	268/2024		Nº NE:	591/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO			ORDEM DE SERVIÇO	03./2024
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 56.859,7248	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 488,6600	
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$ 57.348,28	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIA FERNANDES.09252216600 CONSTRUTORA Arrojado Lisboa LTDA		 Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 258.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME:		CRECHE MONSENHOR ANTONIO FERREIRA										
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
N° CONTRATO:		029/2023										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		REPARO CRECHE										
REFERÊNCIA:		2023/08_SETOR_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO										
N° AE		268/2024										
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
1	SEINFRA	ED-7630	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	56,00	0,00			R\$ 23,95	R\$ 0,00	0,00	0,00%
2	SEINFRA	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	711,00	711,00			R\$ 11,78	R\$ 8.375,58	711,00	100,00%
3	SEINFRA	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	711,00	711,00			R\$ 31,93	R\$ 22.702,23	711,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m2	131,00	131,00			R\$ 32,96	R\$ 4.317,76	131,00	100,00%
5	SEINFRA	ED-50574	APLICAÇÃO DE FANAFITIA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	3,00	0,00			R\$ 13,45	R\$ 0,00	0,00	0,00%
6	SEINFRA	ED-49585	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (60X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	U	1,00	0,00			R\$ 336,14	R\$ 0,00	0,00	0,00%
7	SEINFRA	ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	un	12,00	9,00			R\$ 110,58	R\$ 995,22	9,00	75,00%
8	SEINFRA	ED-49586	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	U	4,00	2,00			R\$ 342,69	R\$ 685,38	2,00	50,00%
9	SEINFRA	ED-49587	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ	U	7,00	7,00			R\$ 349,26	R\$ 2.444,82	7,00	100,00%
10	SEINFRA	ED-5627	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+1T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	1,00	1,00			R\$ 14,36	R\$ 14,36	1,00	100,00%
11	SEINFRA	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1,00			R\$ 14,72	R\$ 14,72	1,00	100,00%
12	SINAPI	RF773INSUMOS	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27 POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	un	15,00	15,00			R\$ 7,11	R\$ 106,65	15,00	100,00%

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
13	SINAPI	0247 INSUMOS	AJUDANTE ELETRICISTA (HORISTA)	hora	4,50	4,50			R\$ 13,03	R\$ 58,64	4,50	100,00%
14	SINAPI	2436 INSUMOS	ELETRICISTA (HORISTA)	hora	4,50	4,50			R\$ 17,27	R\$ 77,72	4,50	100,00%
15	SINAPI	38191 INSUMOS	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W. BASE E27 (127/220 V)	un	15,00	15,00			R\$ 14,63	R\$ 219,45	15,00	100,00%
16	SEINFRA	ED-47954	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	1,00			R\$ 28,11	R\$ 28,11	1,00	25,00%
17	SEINFRA	ED-47951	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	m	3,00	0,00			R\$ 5,04	R\$ 0,00	0,00	0,00%
18	SEINFRA	ED-45762	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	4,00	0,00			R\$ 64,62	R\$ 0,00	0,00	0,00%
19	SINAPI	1014 INSUMOS	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAAMA BWF-B, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	40,00	10,00			R\$ 1,71	R\$ 17,10	10,00	25,00%
20	SINAPI	20111 INSUMOS	FTTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UM	1,00	1,00			R\$ 9,01	R\$ 9,01	1,00	100,00%
21	SEINFRA	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m2	350,00	350,00			R\$ 23,02	R\$ 10.157,00	350,00	100,00%
22	SEINFRA	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m2	350,00	350,00			R\$ 18,26	R\$ 6.391,05	350,00	100,00%
23	SEINFRA	ED-51155	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO PERFIL	m2	15,00	0,00			R\$ 131,39	R\$ 0,00	0,00	0,00%

AM

Valeria

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
24	SEINFRA	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2				20,00	20,00			R\$ 33,85	R\$ 677,00	20,00	100,00%
25	SEINFRA	ED-50722	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2				20,00	1,00			R\$ 56,49	R\$ 56,49	1,00	5,00%
SUBTOTAL:													R\$ 57.348,28		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:													R\$ 57.348,28		
PERCENTUAL EXECUTADO:													91,89%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:													R\$ 62.406,63		
SALDO													R\$ 5.058,35		
FISCALIZAÇÃO:													RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
 Luisa Silva Engenheiro Civil  Kidare Bittencourt Dutra													 Hudson Dalmo Faria Fernandes Construtora Arrojado Lisboa  Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D		
SECRETARIA ADJUNTO DE OBRAS:													SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
													Prof. Albano		
													02/01/2024		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE															
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
MONSENHOR JOSE ANTONIO FERREIRA															
MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES															
ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./ PERIMETRO	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VAO	AREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
05/02/2024															
1	SÉRRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES														
	TELHADO													-	hora
2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO													0,0000	
	ACABAMENTO													711,00	m2
3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO													711,0000	
	ACABAMENTO													711,00	m2
4	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM													711,0000	
	Contrapiso na frente e nos fundos da escola													131,00	m2
5	APLICAÇÃO DE FAIXAFITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO													131,0000	
	ACABAMENTO													-	m
6	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO 60X210CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETASARRABEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ													0,0000	
	ESQUADRIAS													-	U
7	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMÍAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES													0,0000	
	ESQUADRIAS													9,00	U
														9,0000	

34/04/2024

34/04/2024

34/04/2024

8	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (70X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ, ESQUADRIAS																			2,00	un
9	FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURAVERNIZ, ESQUADRIAS																			7,00	un
10	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+1720A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE																			1,00	un
11	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE																			1,00	un
12	LUMINARIA DE TETO PLAFONPLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)																			15,00	hora
13	AJUDANTE ELETRICISTA (HORISTA)																			4,50	hora
14	ELETRICISTA (HORISTA)																			4,50	un
15	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)																			15,00	un
16	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B"; DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO																			15,00	m
17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO																			1,00	un
	ELETRICA																			0,0000	

gubato

gubato

gubato

[illegible]

W. A. R. 1912



[illegible]


Wish

[illegible][illegible]


ARROJADO LISBOA				Relatório n°	2
				Data do relatório	16/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	2 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG, DANIELE SILVA	Prazo a vencer	56 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA RETIRADA DE TELHAS	
Em Andamento	

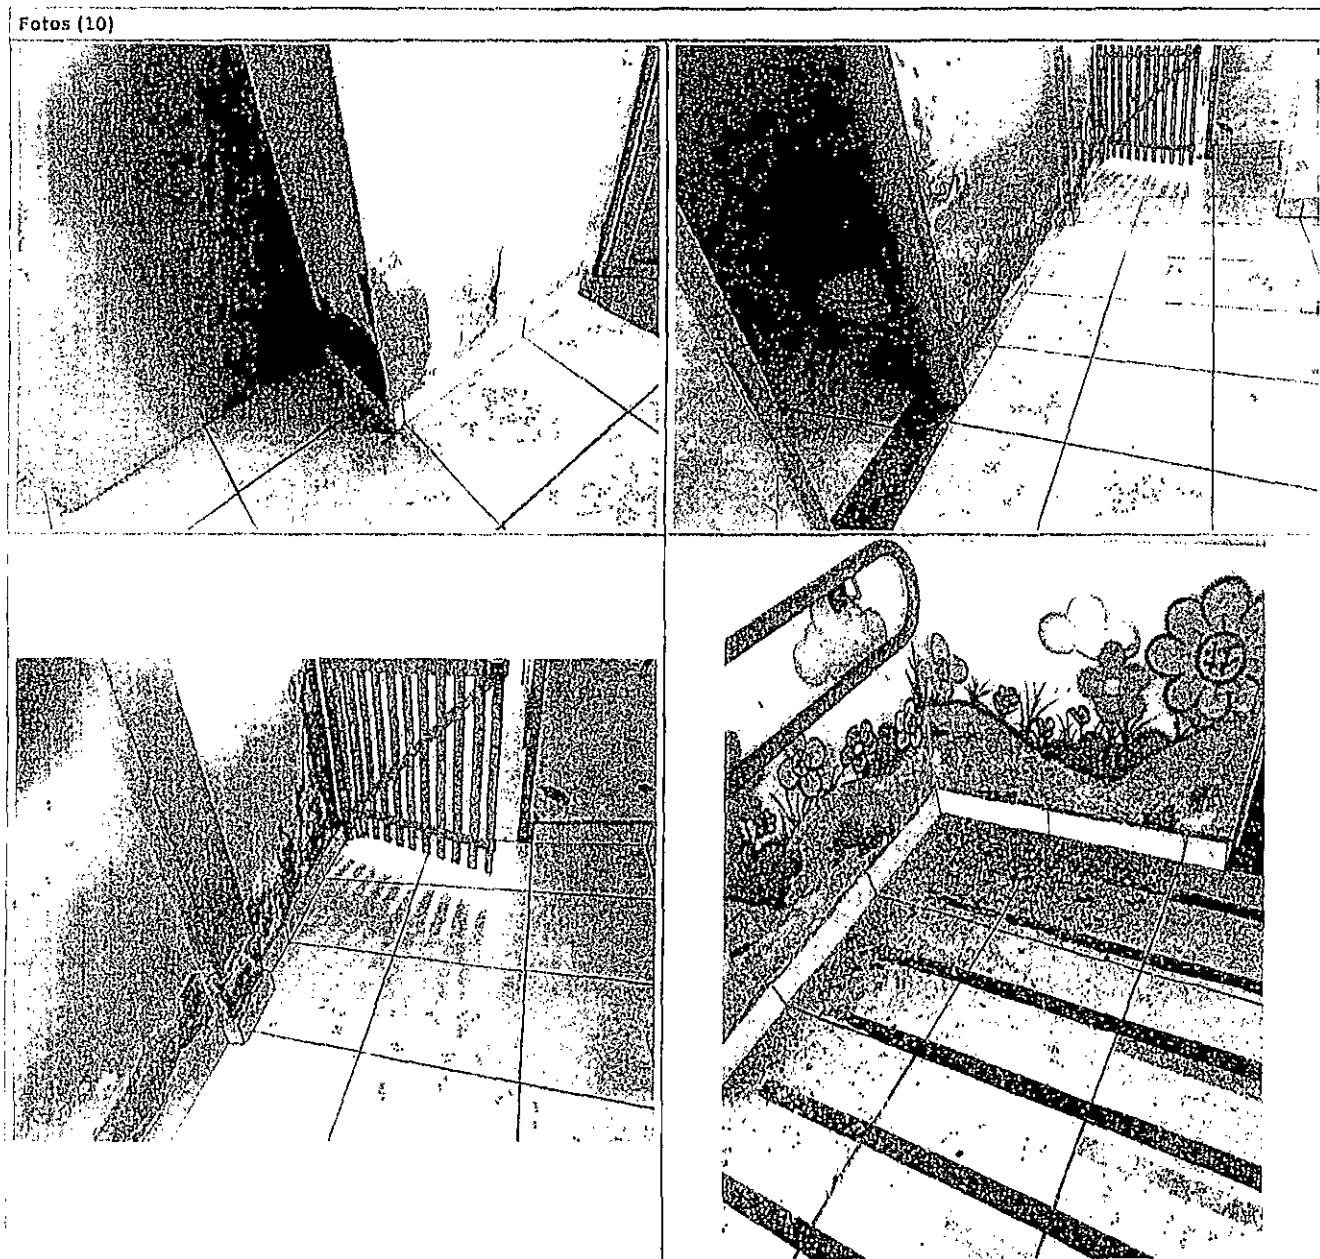

DUP

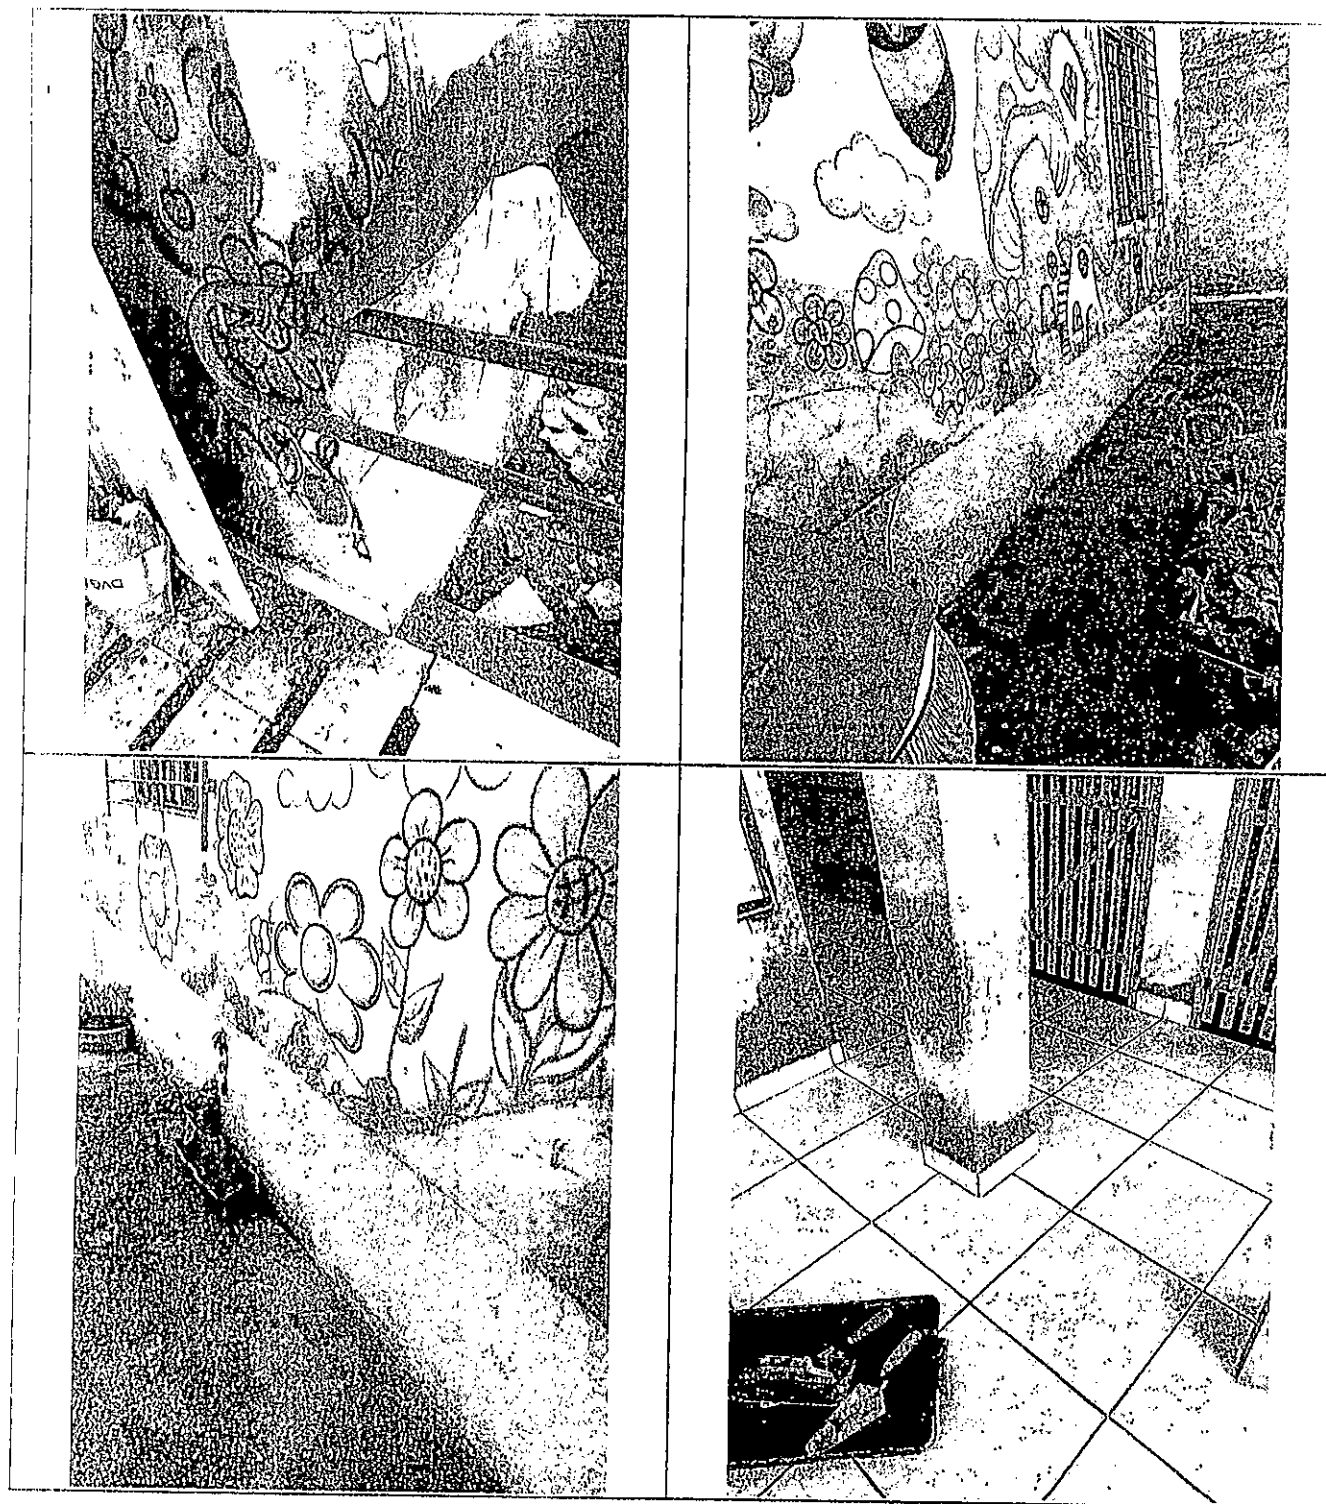

Dup

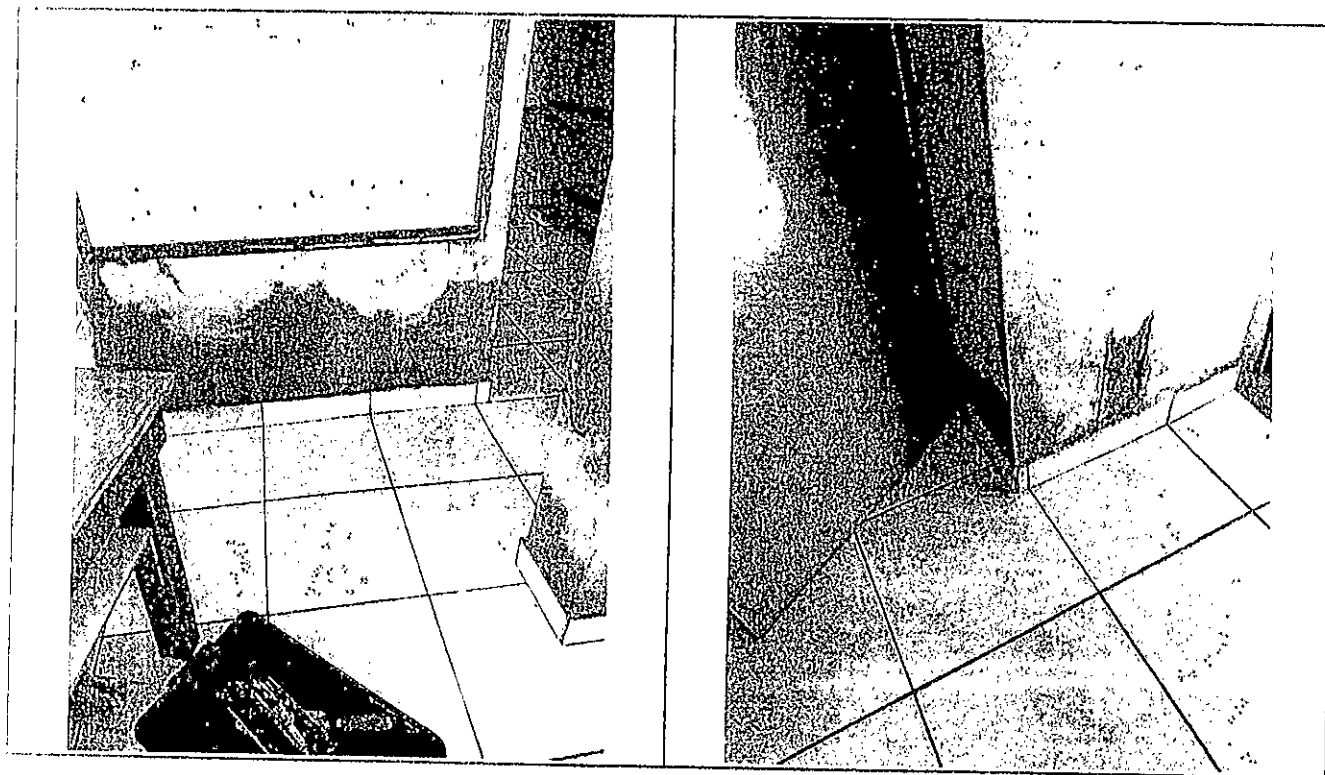

[Handwritten signature]



Assinatura

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	3
				Data do relatório	17/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	3 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	55 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

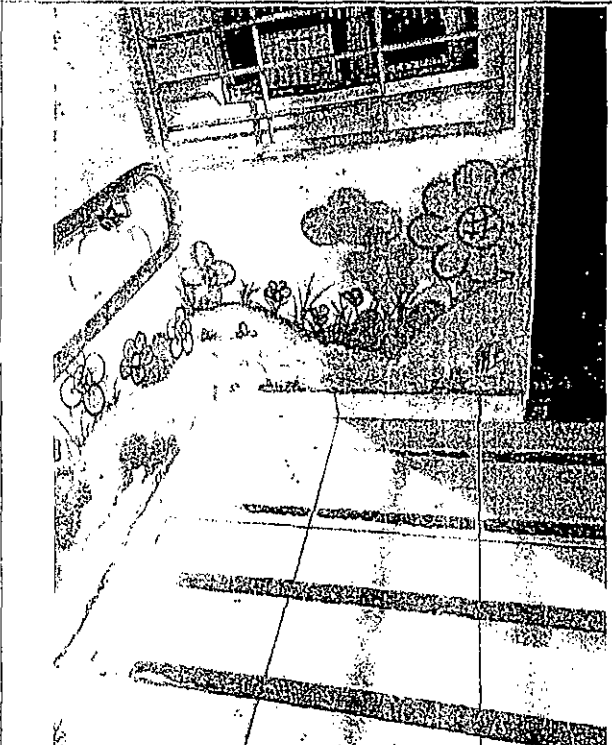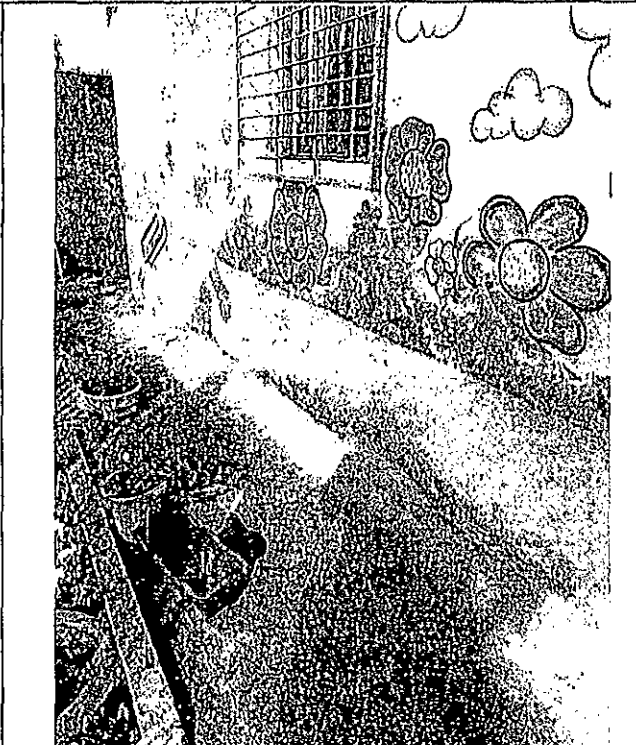Fotos (10)	
	

D. S.

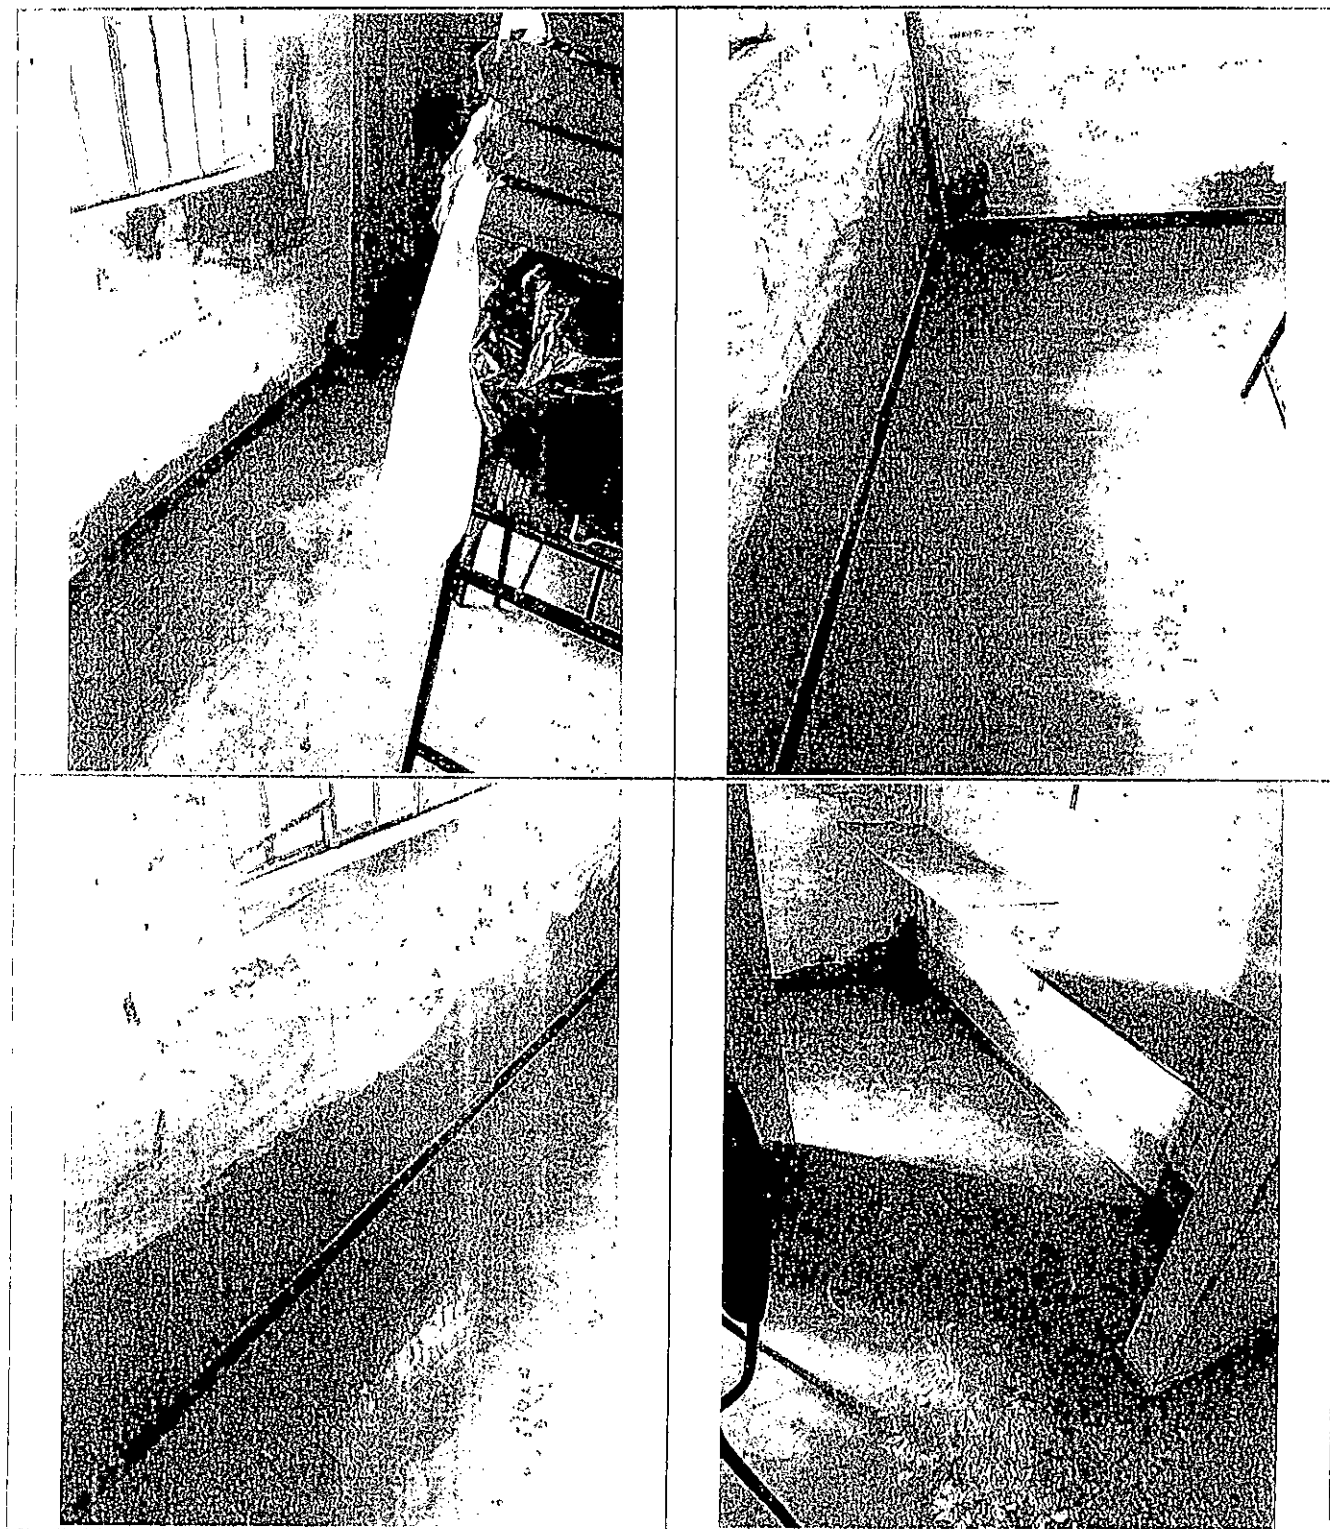

[Handwritten signature]

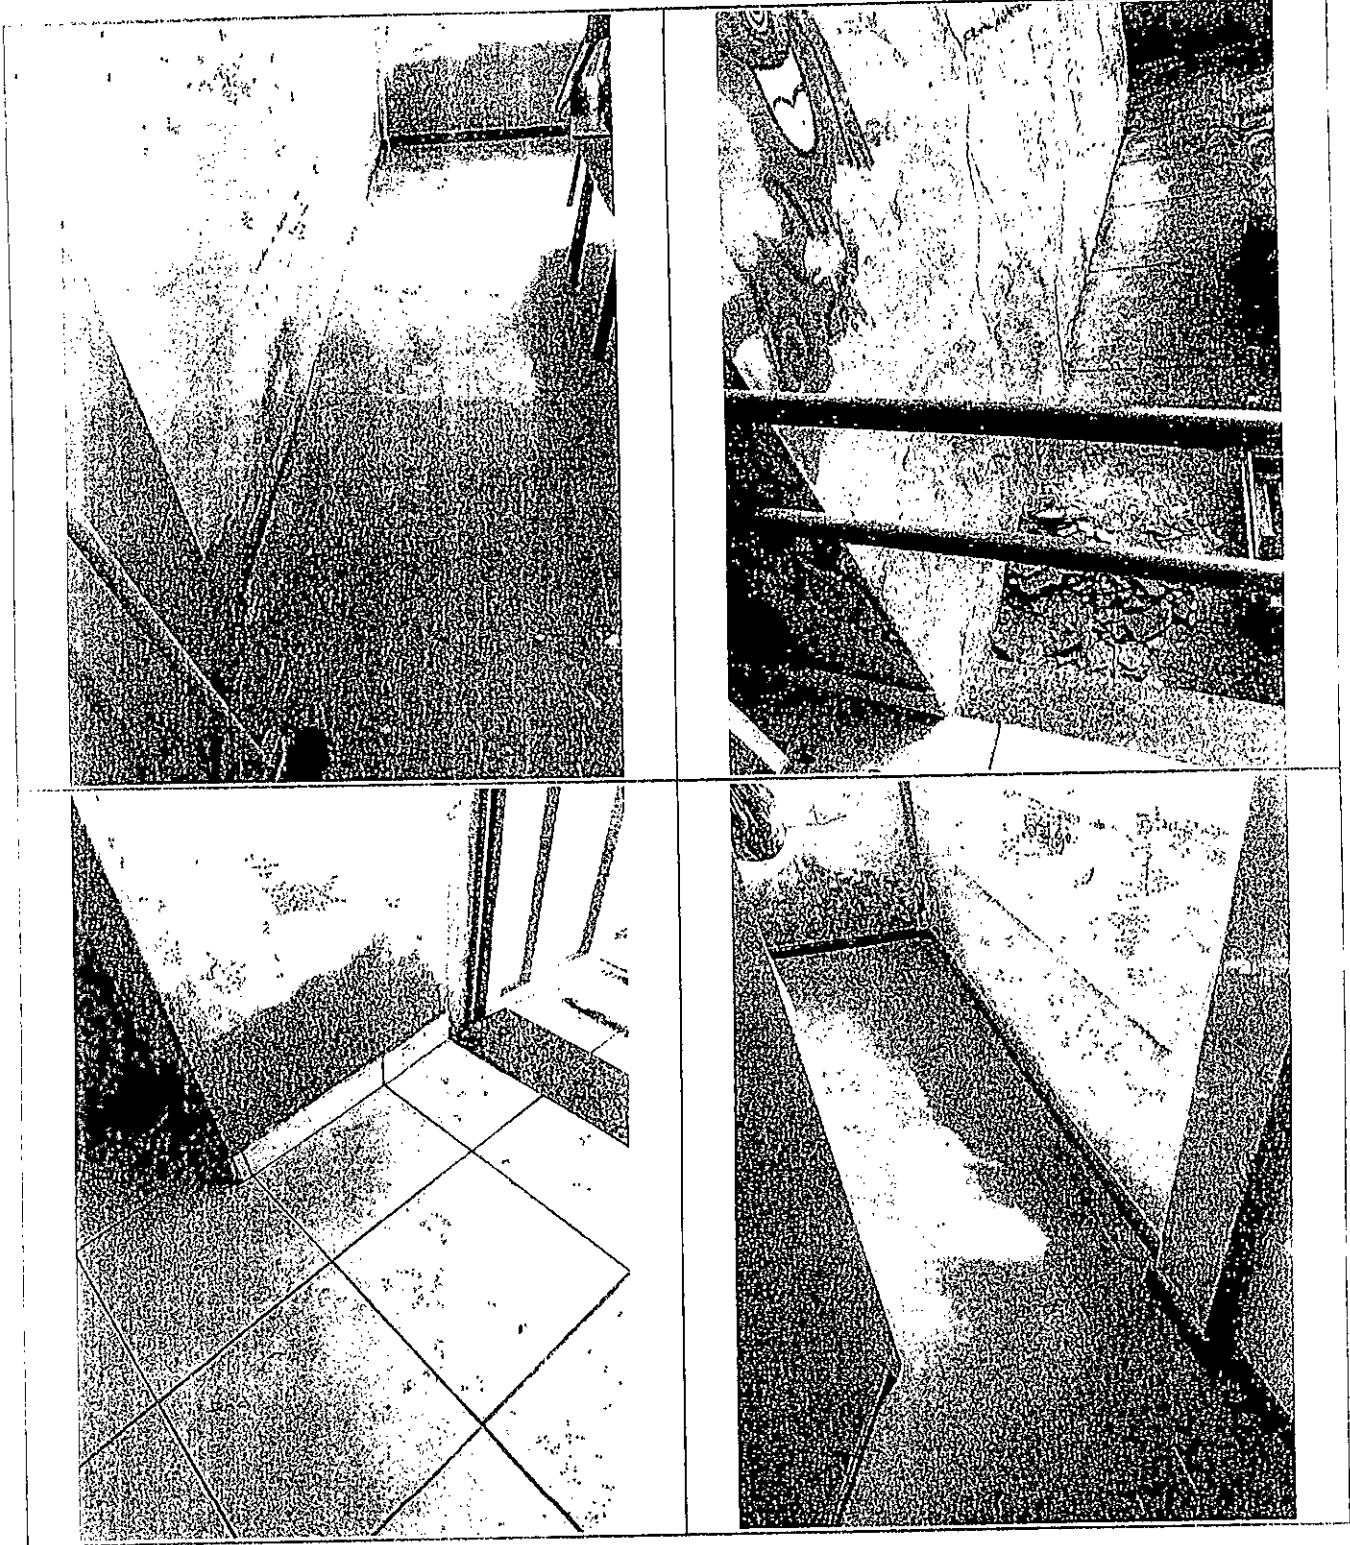


Assinatura



Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	4
				Data do relatório	18/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	4 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	54 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

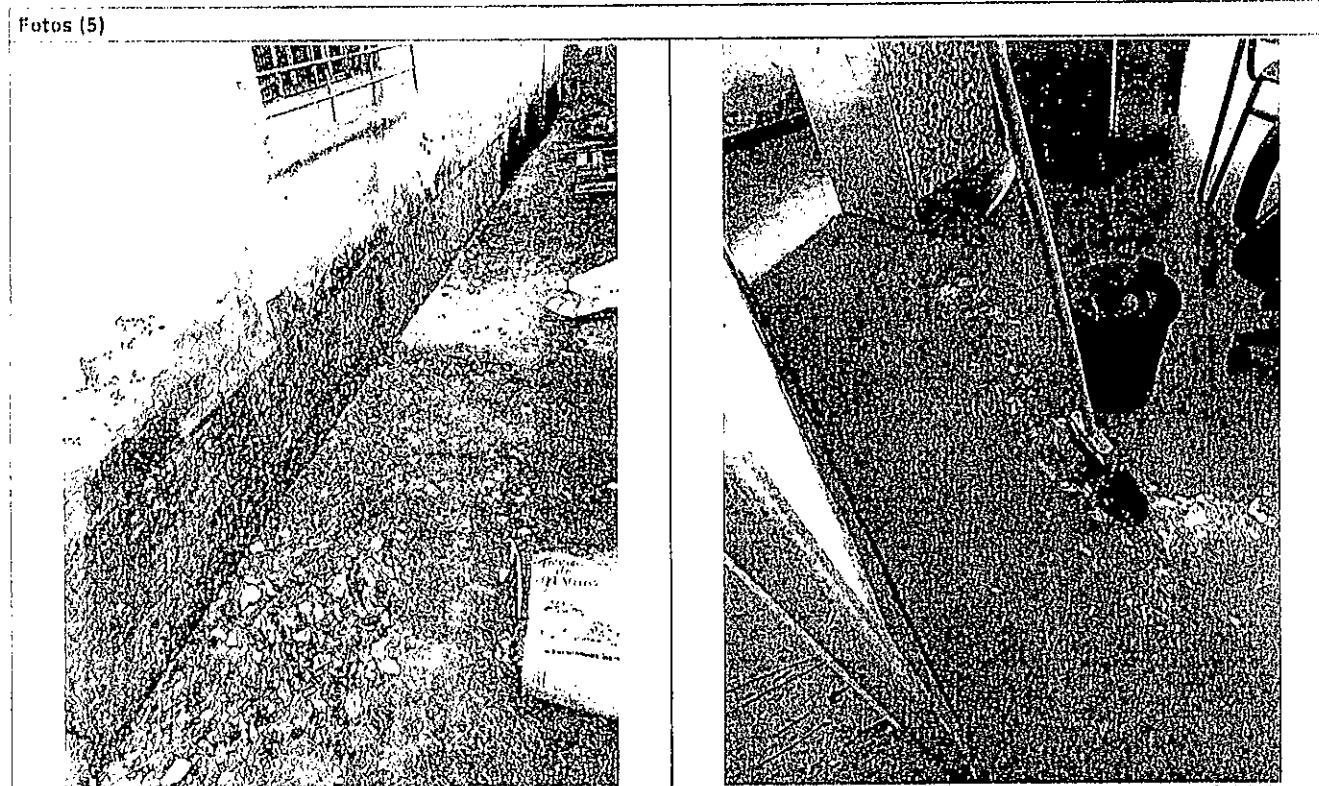



Assinatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paulo".


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	5
				Data do relatório	19/01/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	5 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	53 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

Fotos (5)

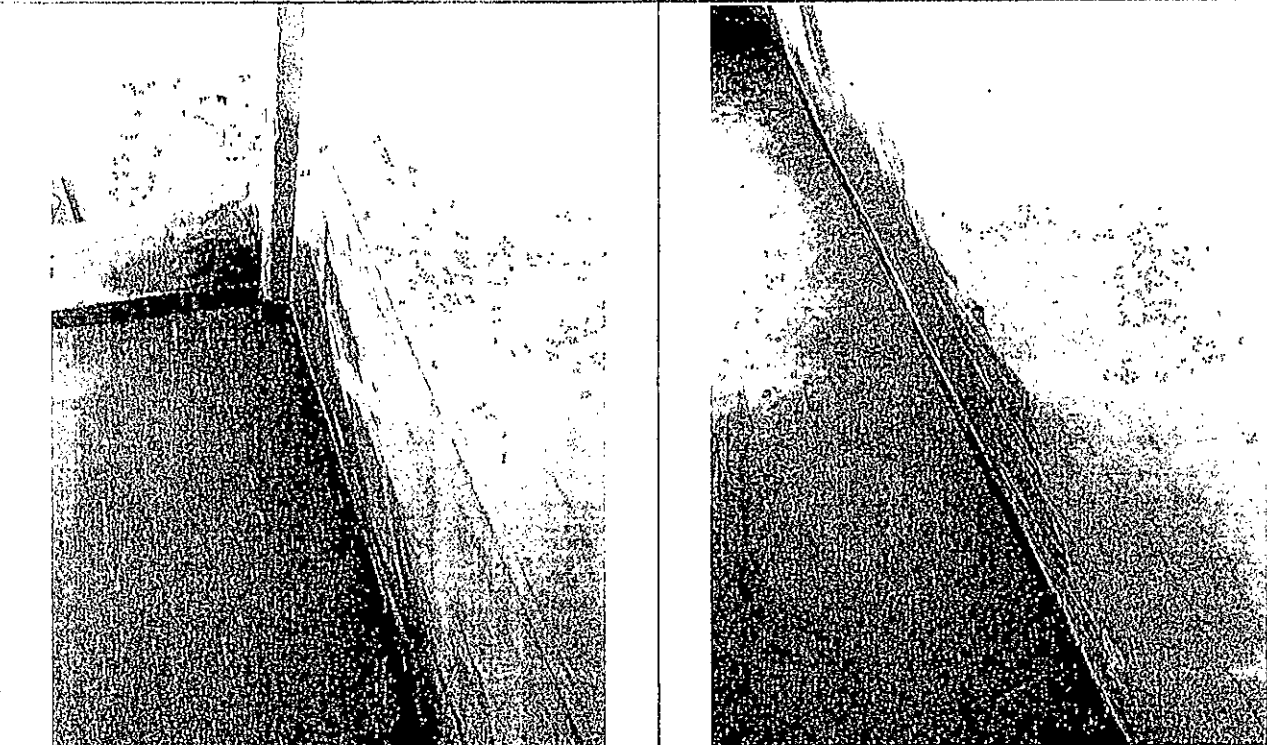

[Handwritten signature]

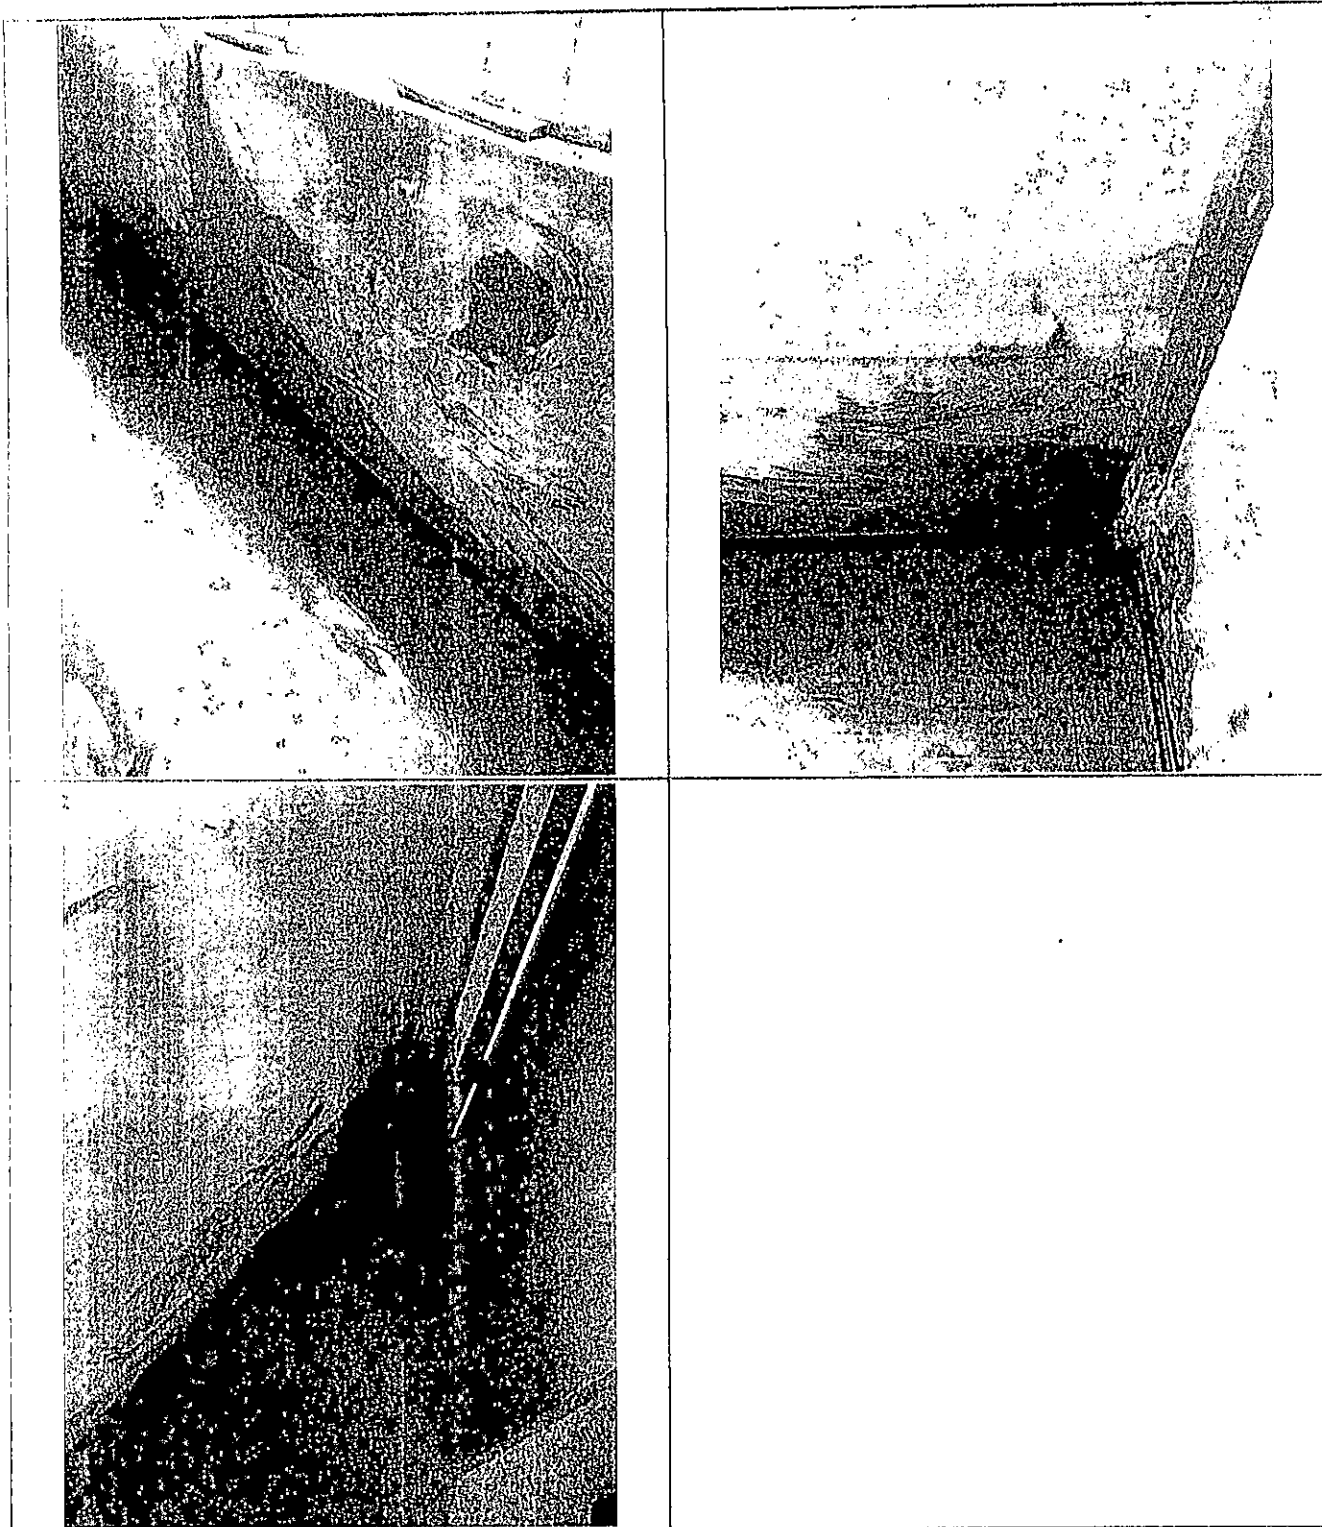

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	6
				Data do relatório	22/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	8 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	50 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)

INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA





Em Andamento

Fotos (10)

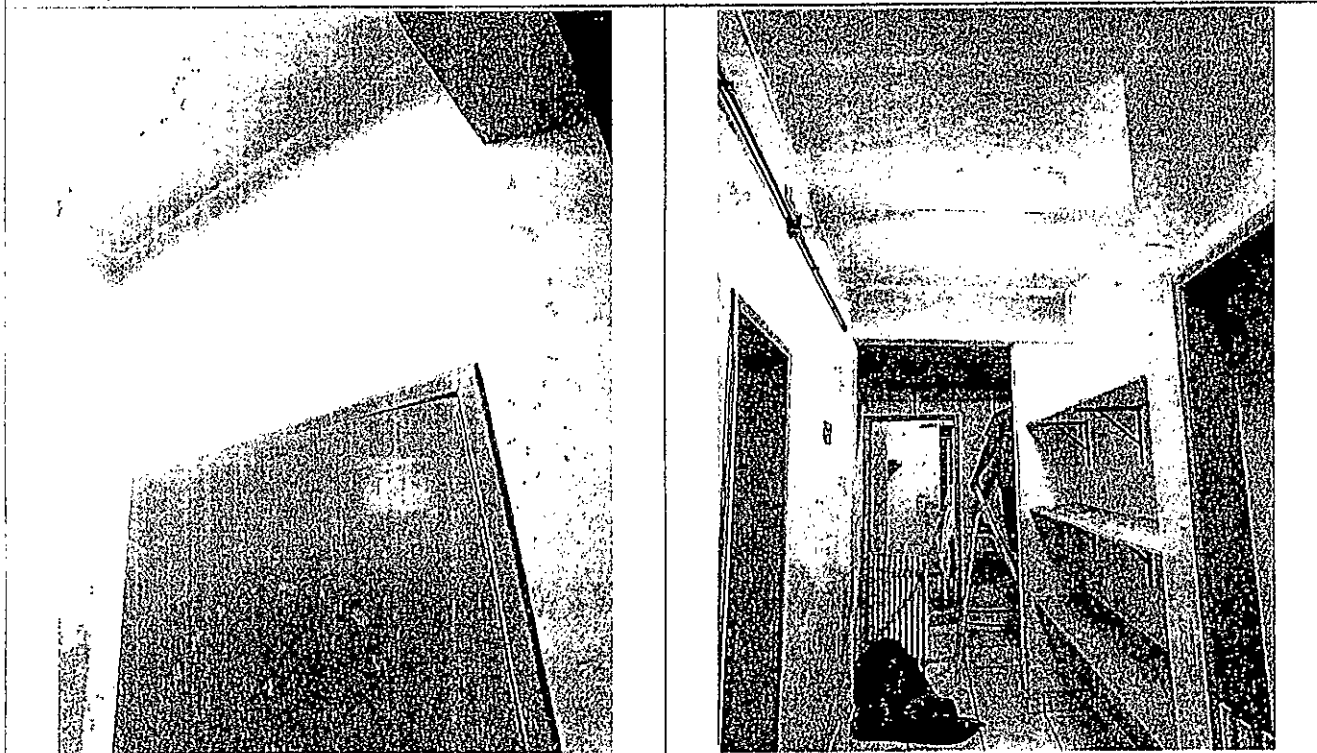*Daniel*

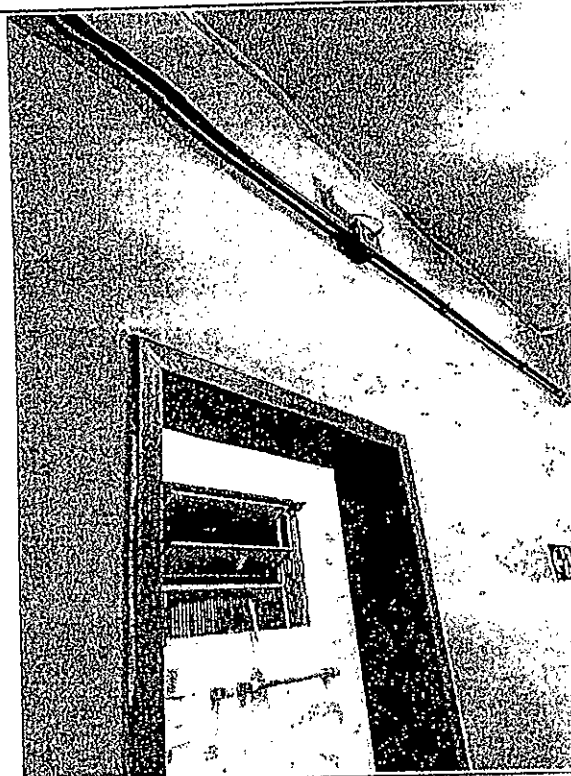

10/21

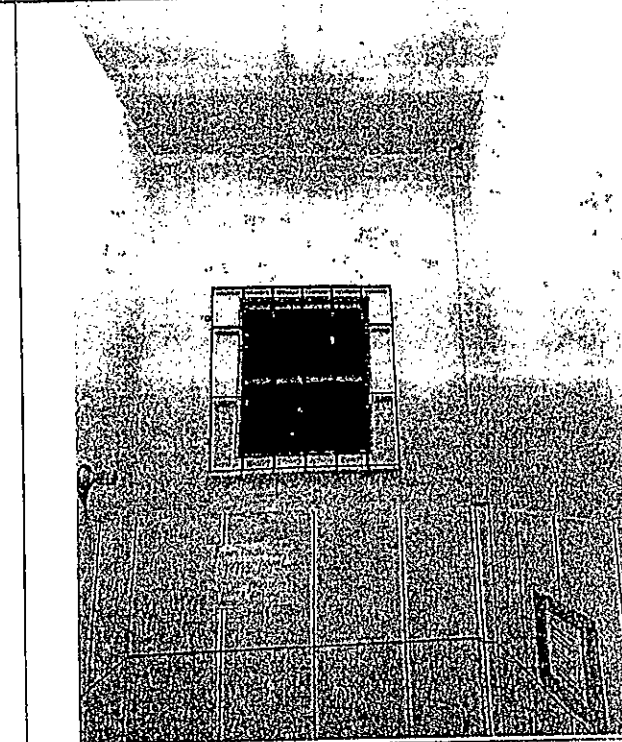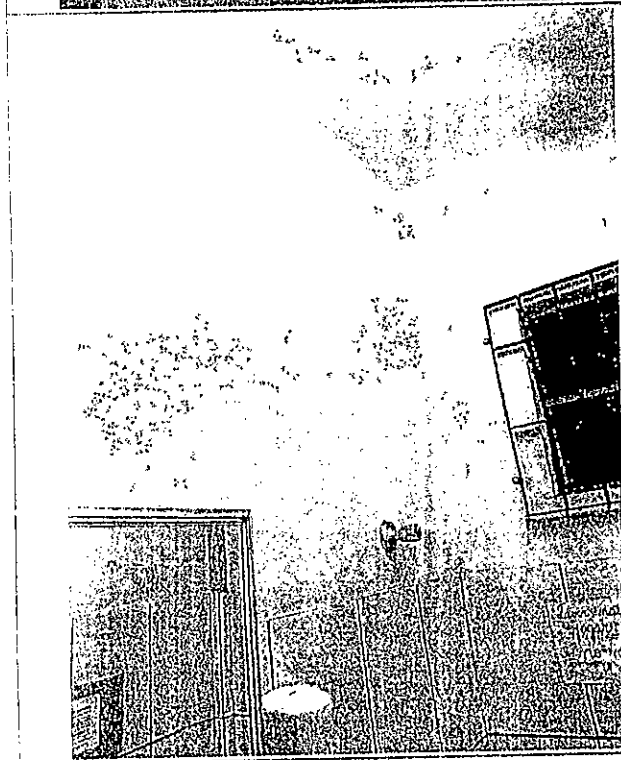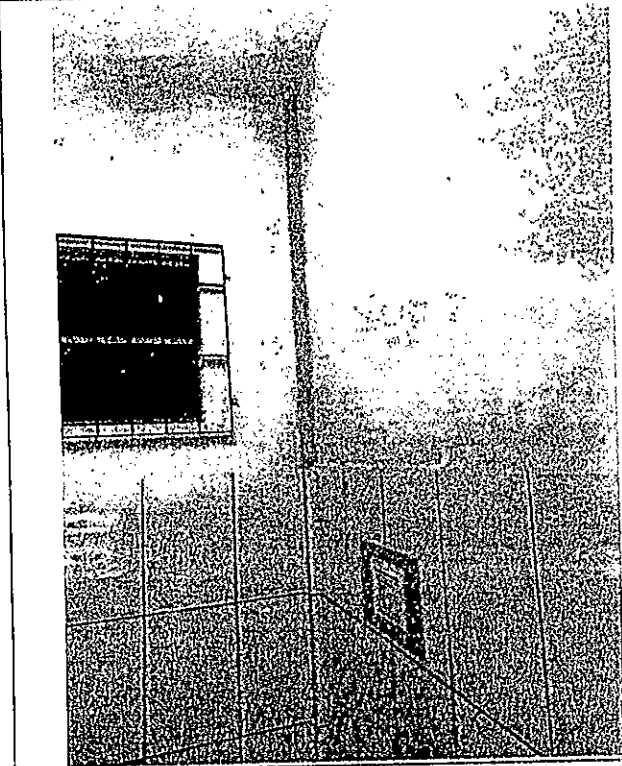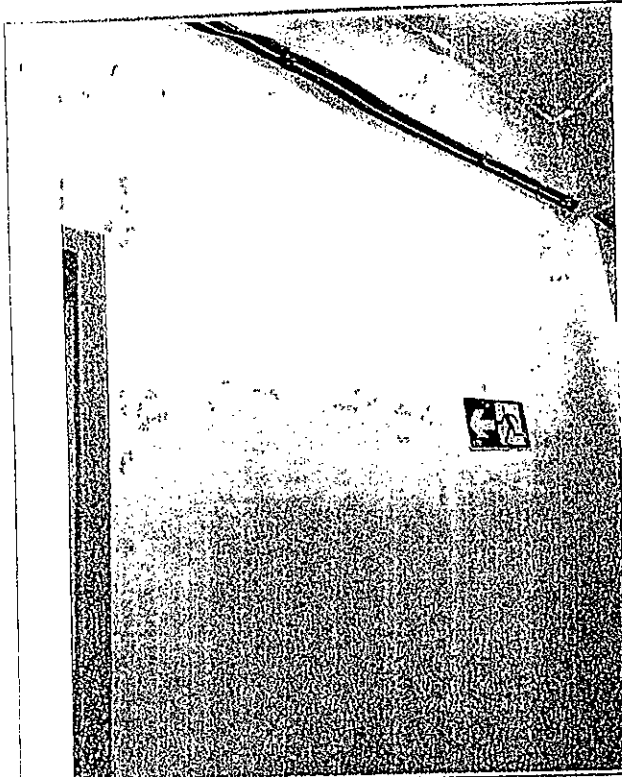

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	7
				Data do relatório	23/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	9 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	49 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável



Atividades (1)

INÍCIO DOS REPAROS NA ESCOLA



Em Andamento

Fotos (10)

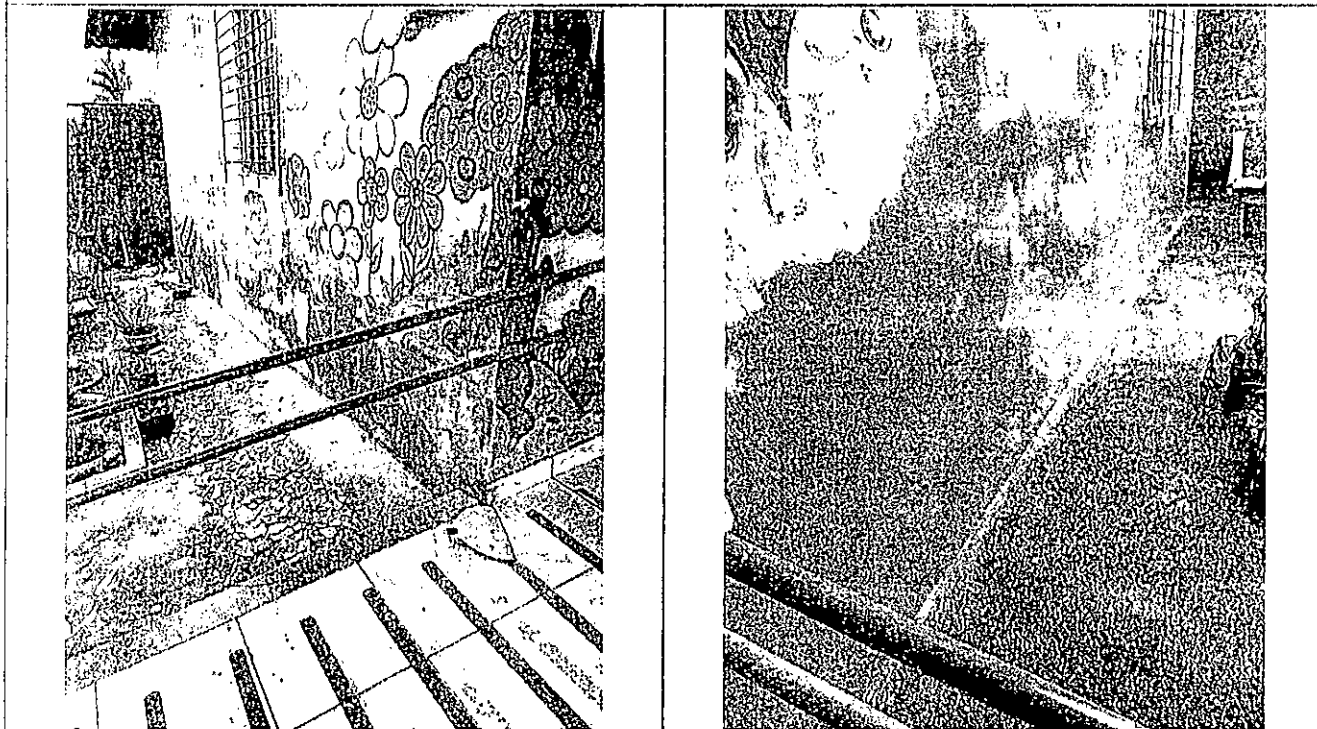

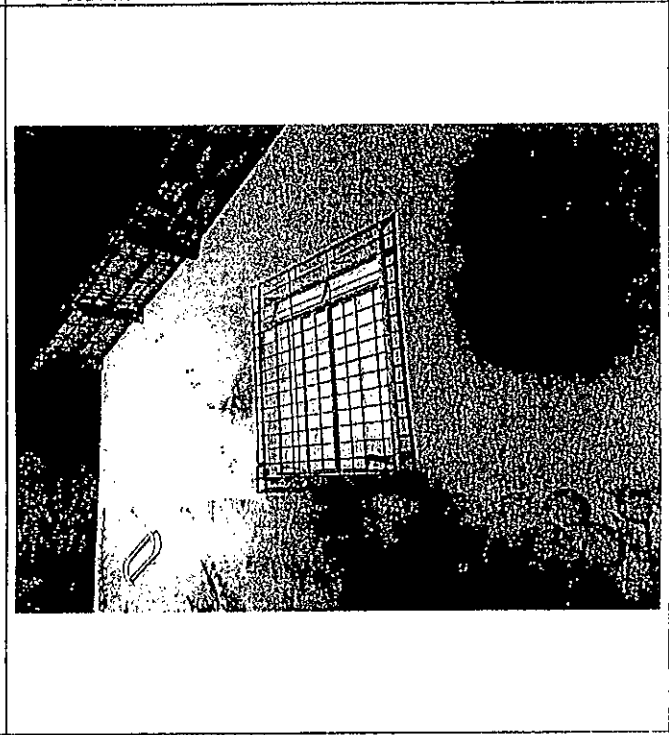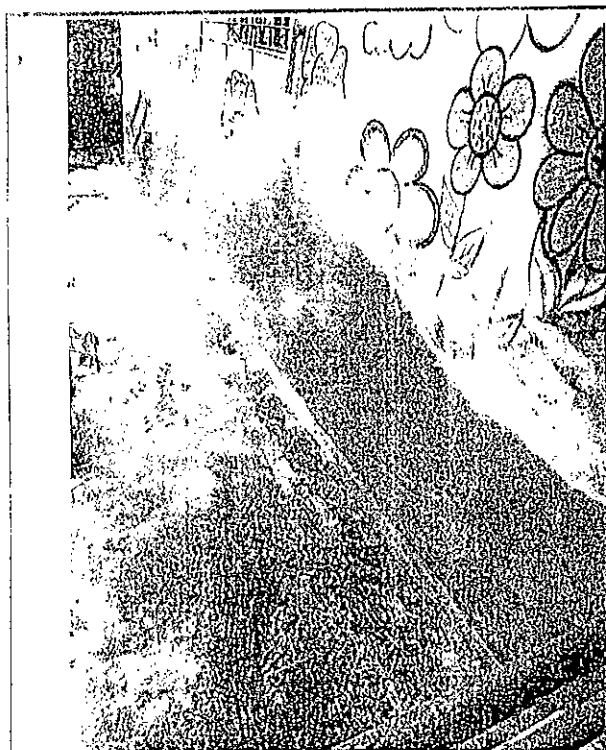

[Handwritten signature]

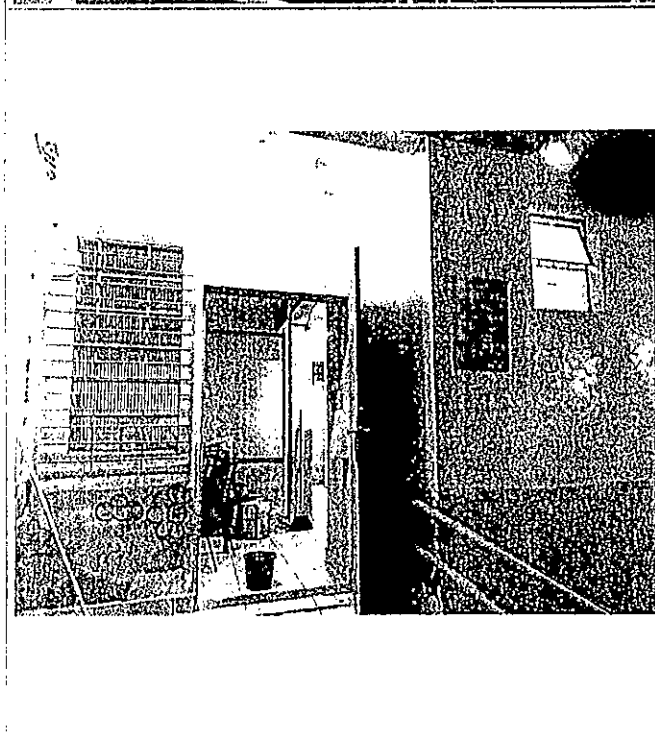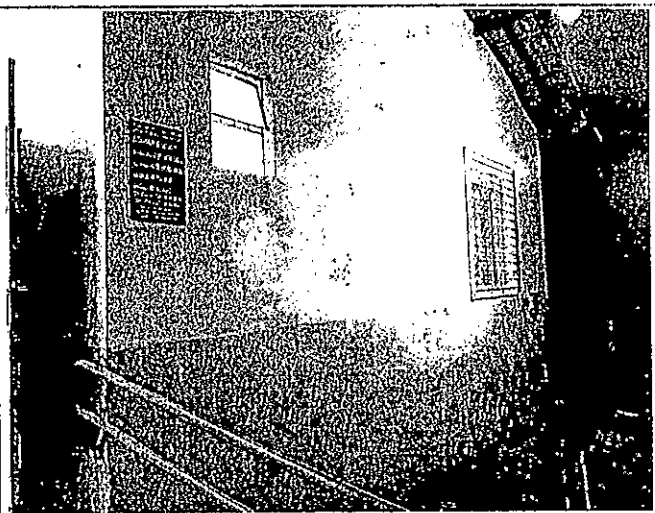

[Handwritten signature]


Assinatura

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	8
				Data do relatório	24/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	10 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	48 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

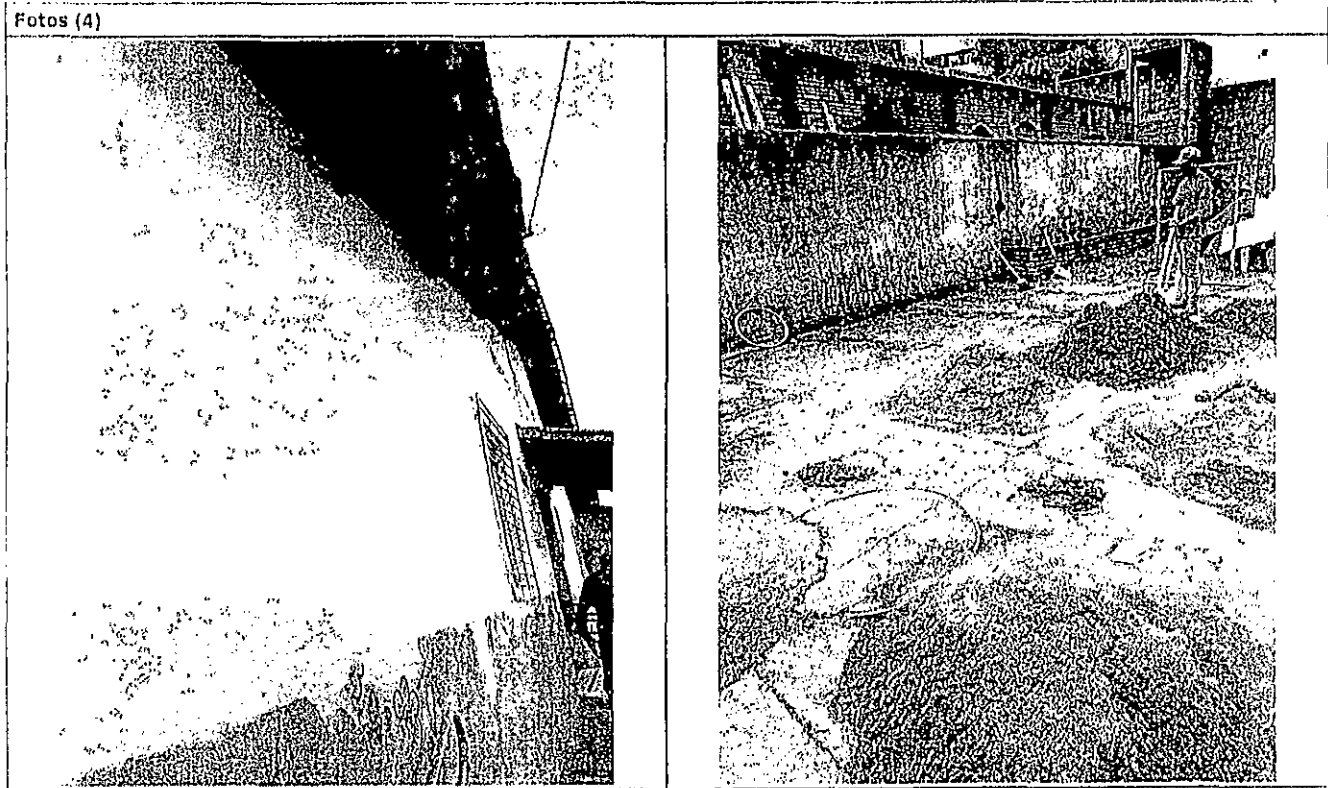

[Handwritten signature]

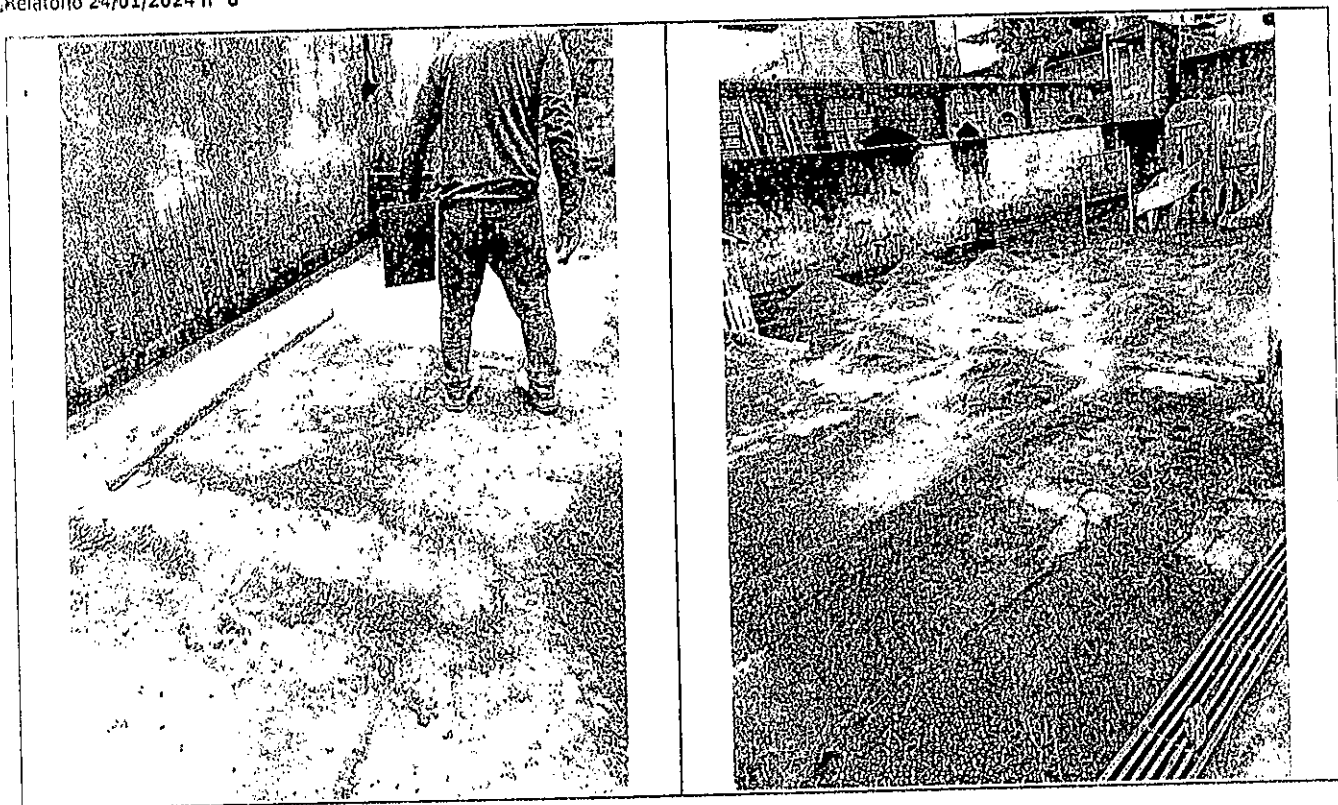

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura


Relatório 25/01/2024 nº 9

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	9
				Data do relatório	25/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
				Prazo contratual	58 dias
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo decorrido	11 dias
Local	GUARANY			Prazo a vencer	47 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA		




Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	Em Andamento
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	



Fotos (9)

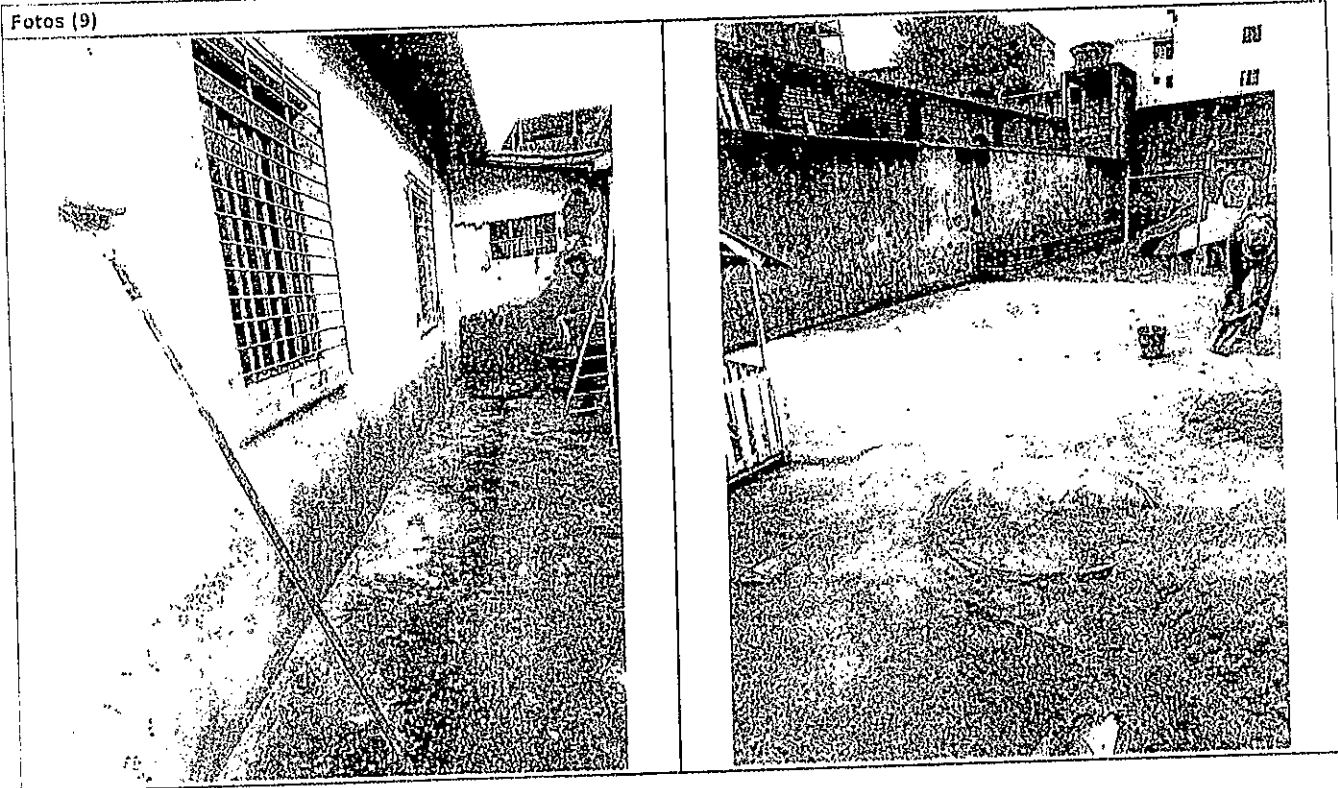

[Handwritten signature]

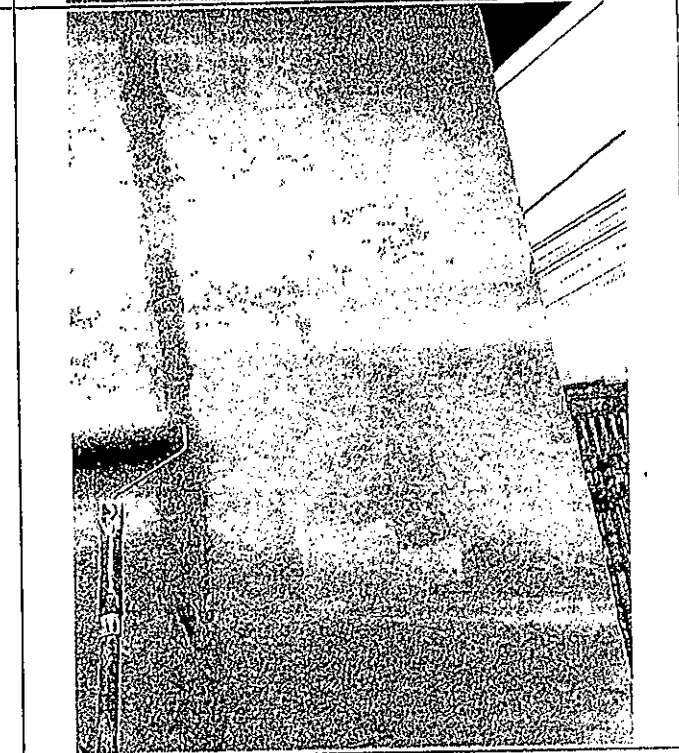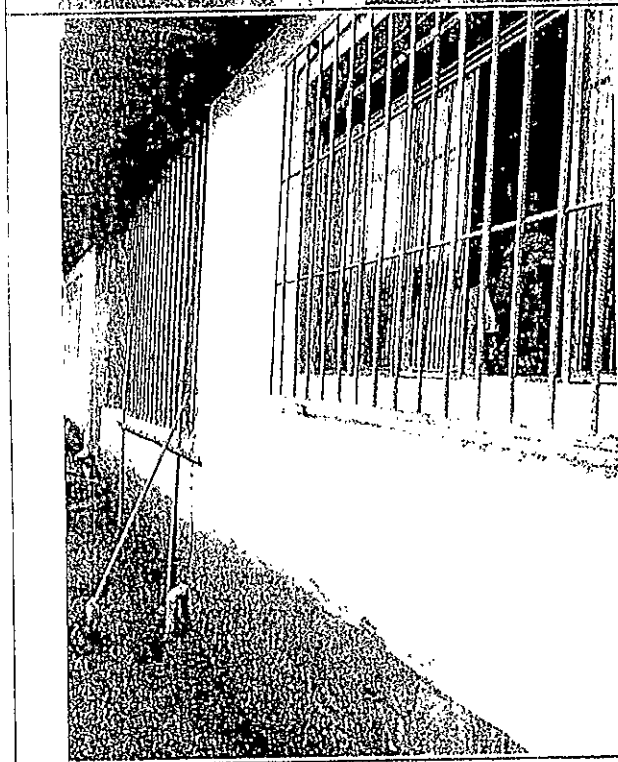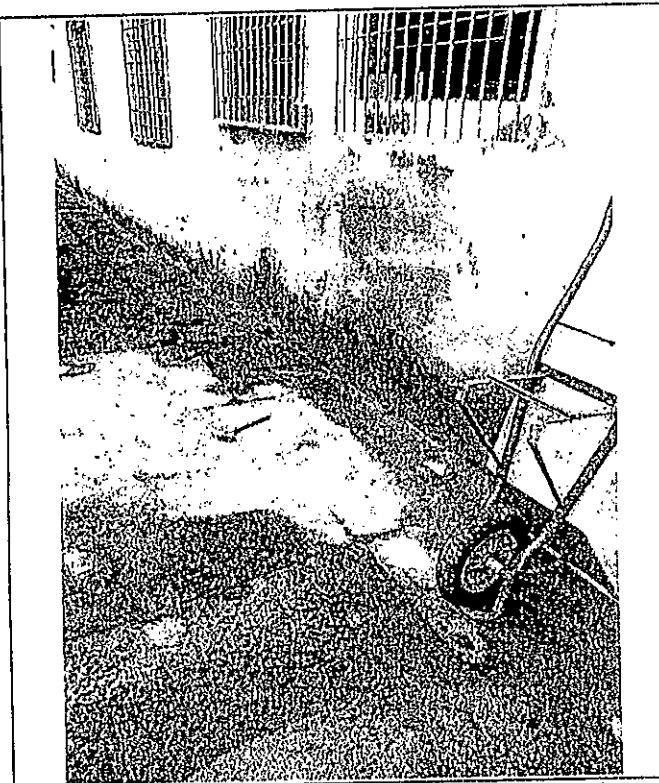

104

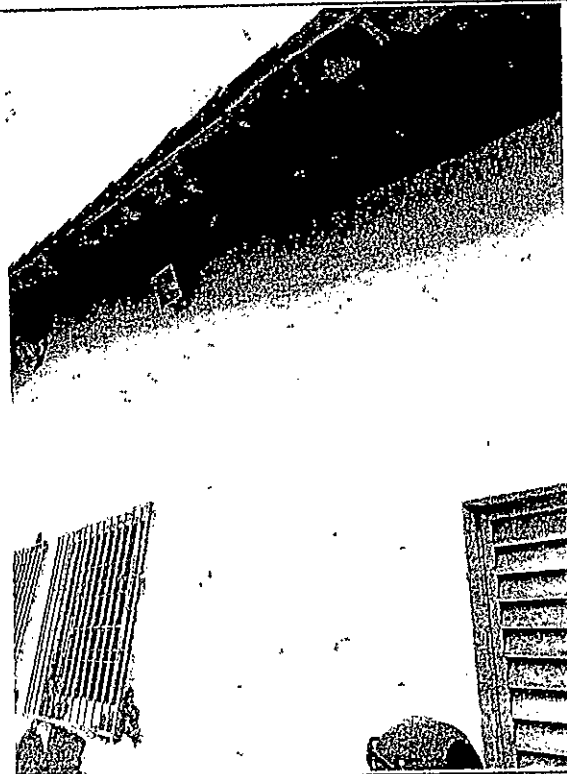

Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	10
				Data do relatório	26/01/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	12 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	46 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento


Fotos (8)

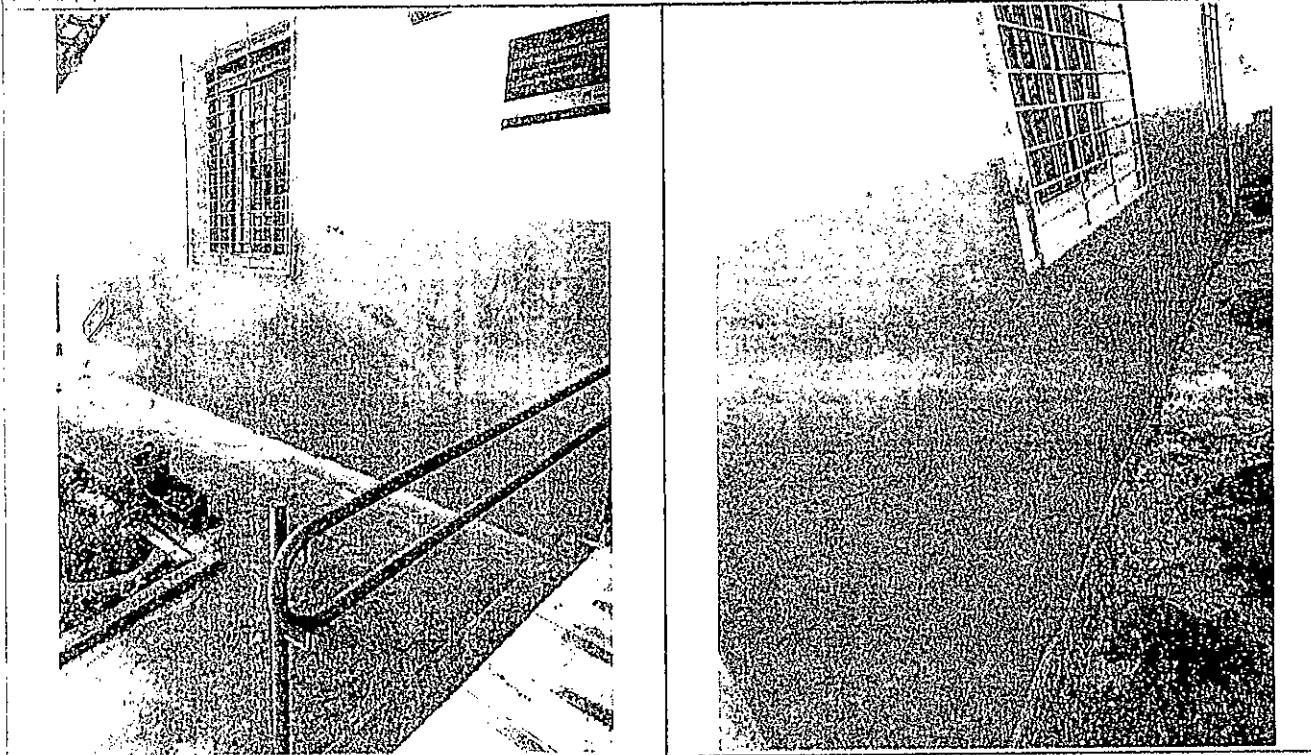

Dey

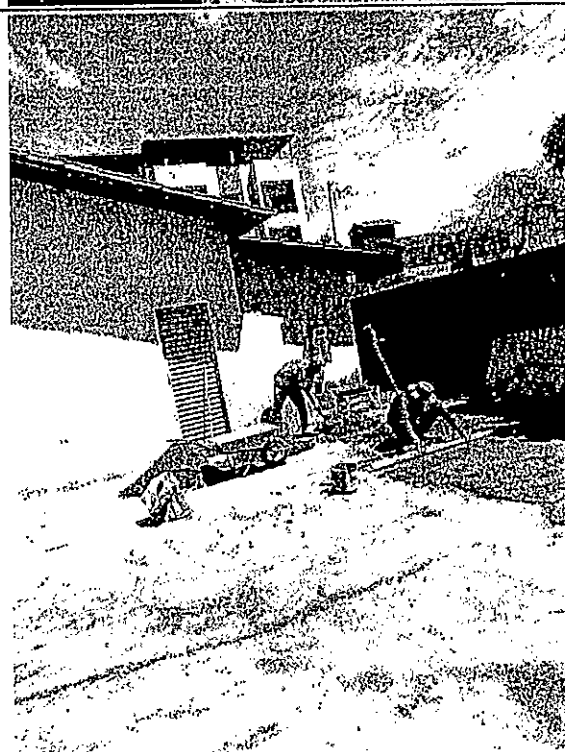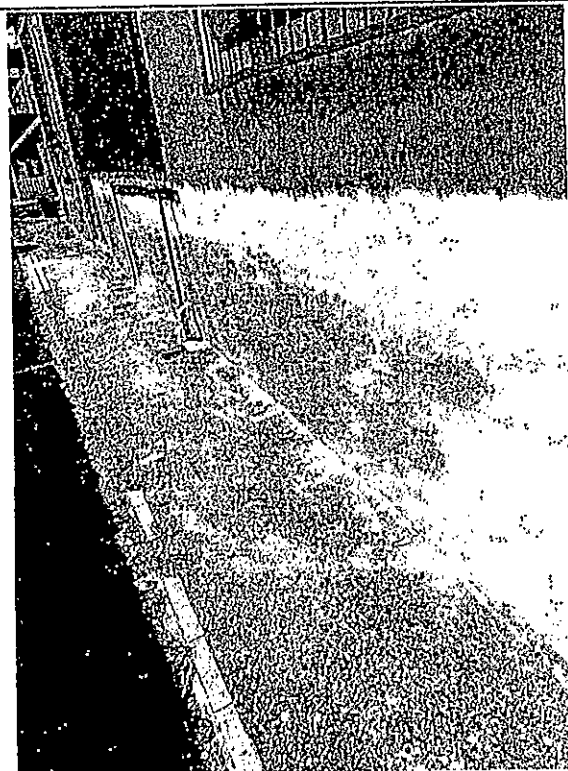

Handwritten signature or mark.

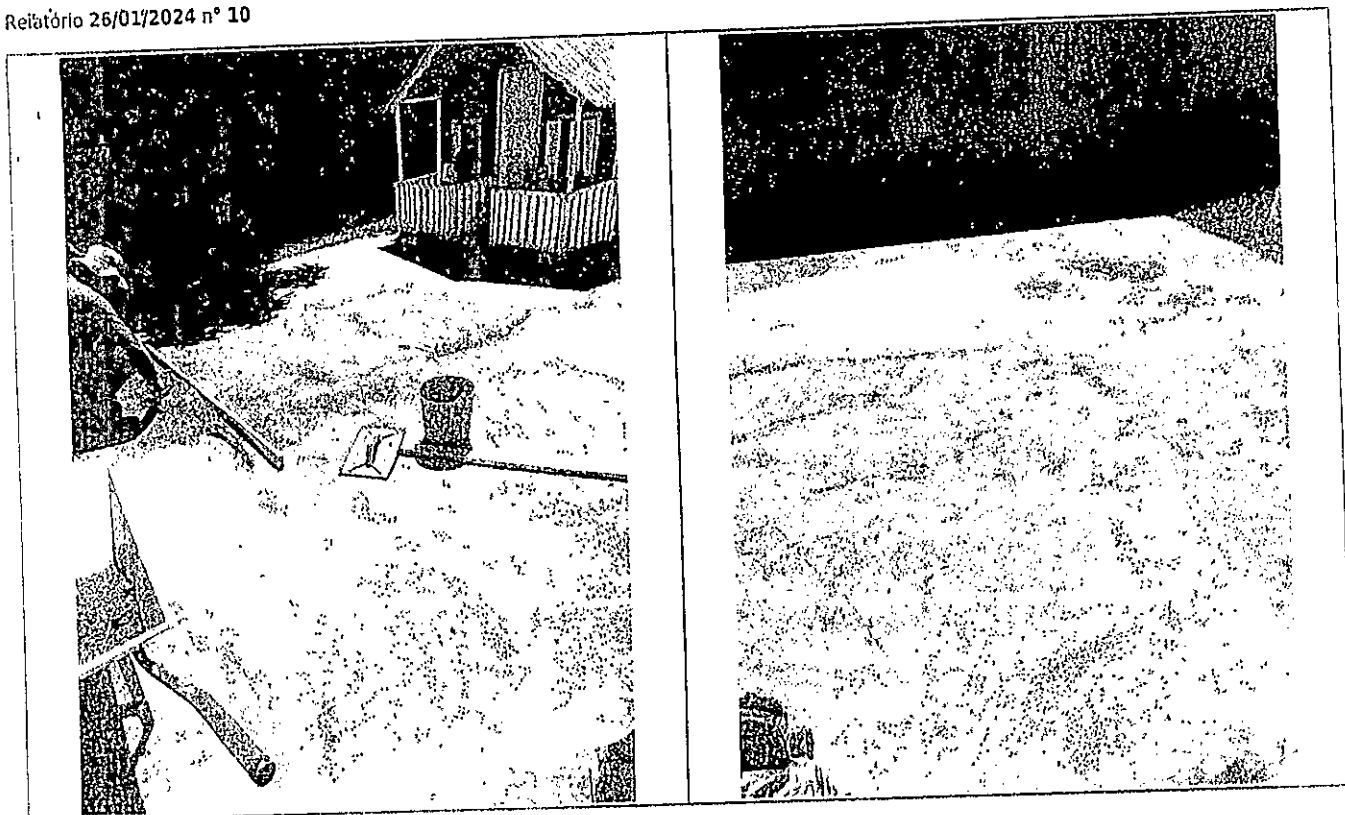

Assinatura


Assinatura




ARROJADO LISBOA				Relatório n°	11
				Data do relatório	29/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	15 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG, DANIELE SILVA	Prazo a vencer	43 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento



DDE

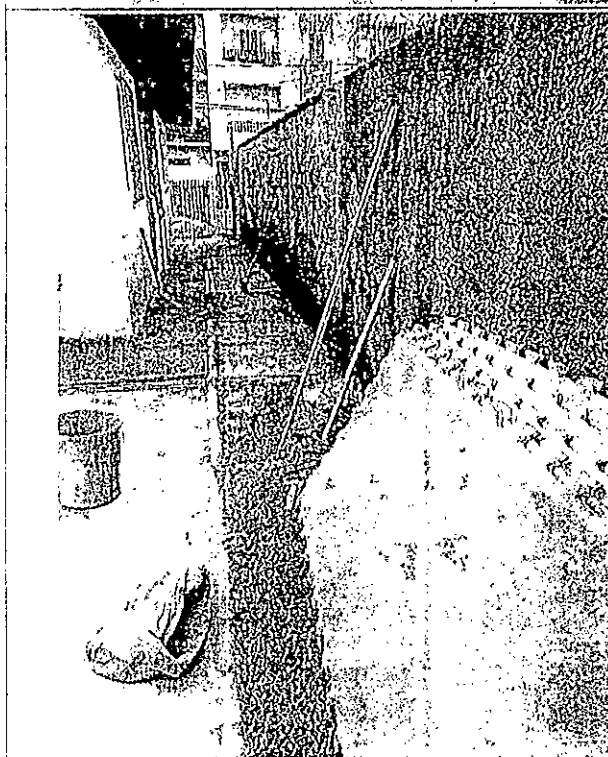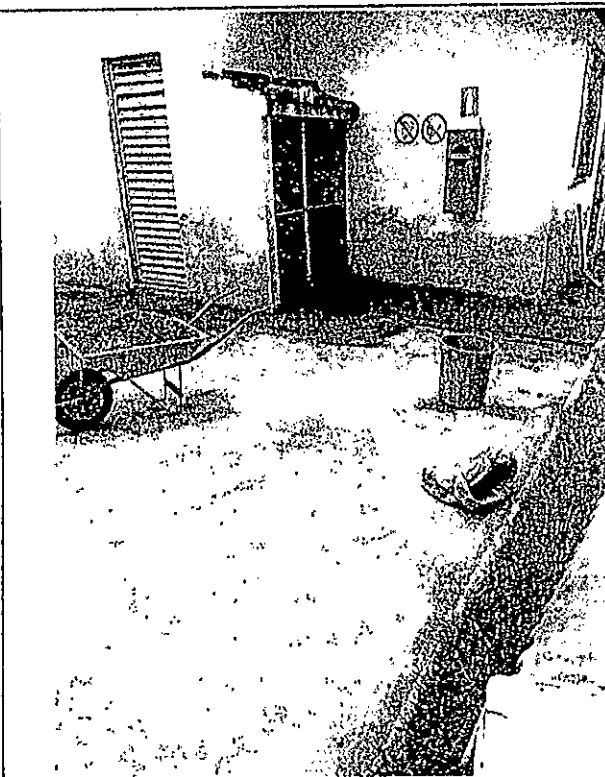

Assinatura

A handwritten signature in black ink, located above the signature line.

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	12
				Data do relatório	30/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	16 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG, DANIELE SILVA	Prazo a vencer	42 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável




Atividades (1)	
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento



[Handwritten signature]

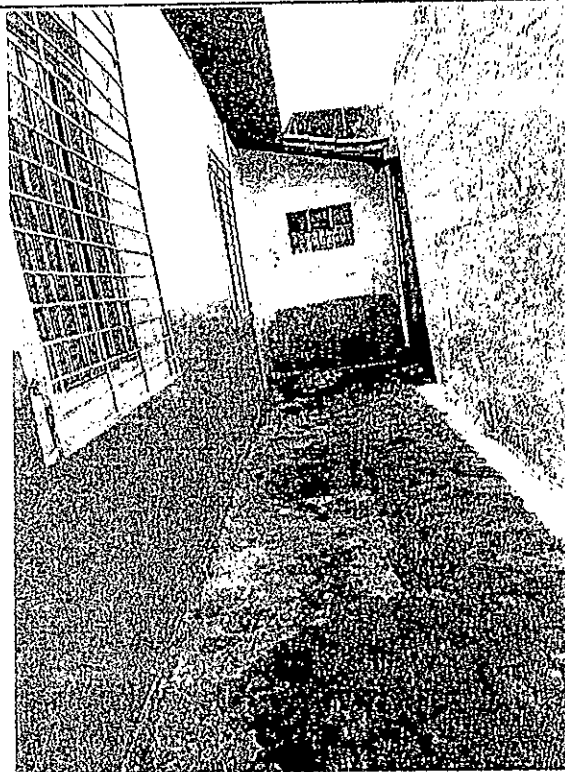

[Handwritten signature]

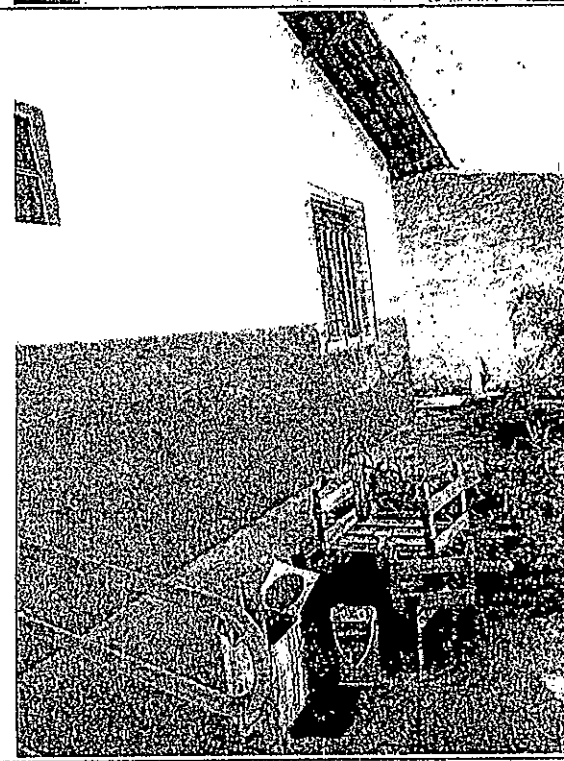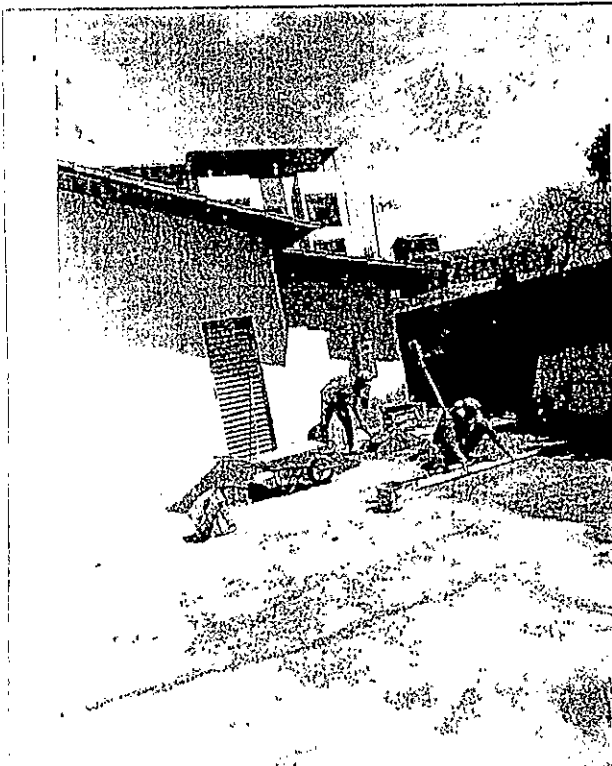

Assinatura


Assinatura





ARROJADO LISBOA				Relatório n°	13
				Data do relatório	31/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	17 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	41 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)	Em Andamento
INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA	

Fotos (9)

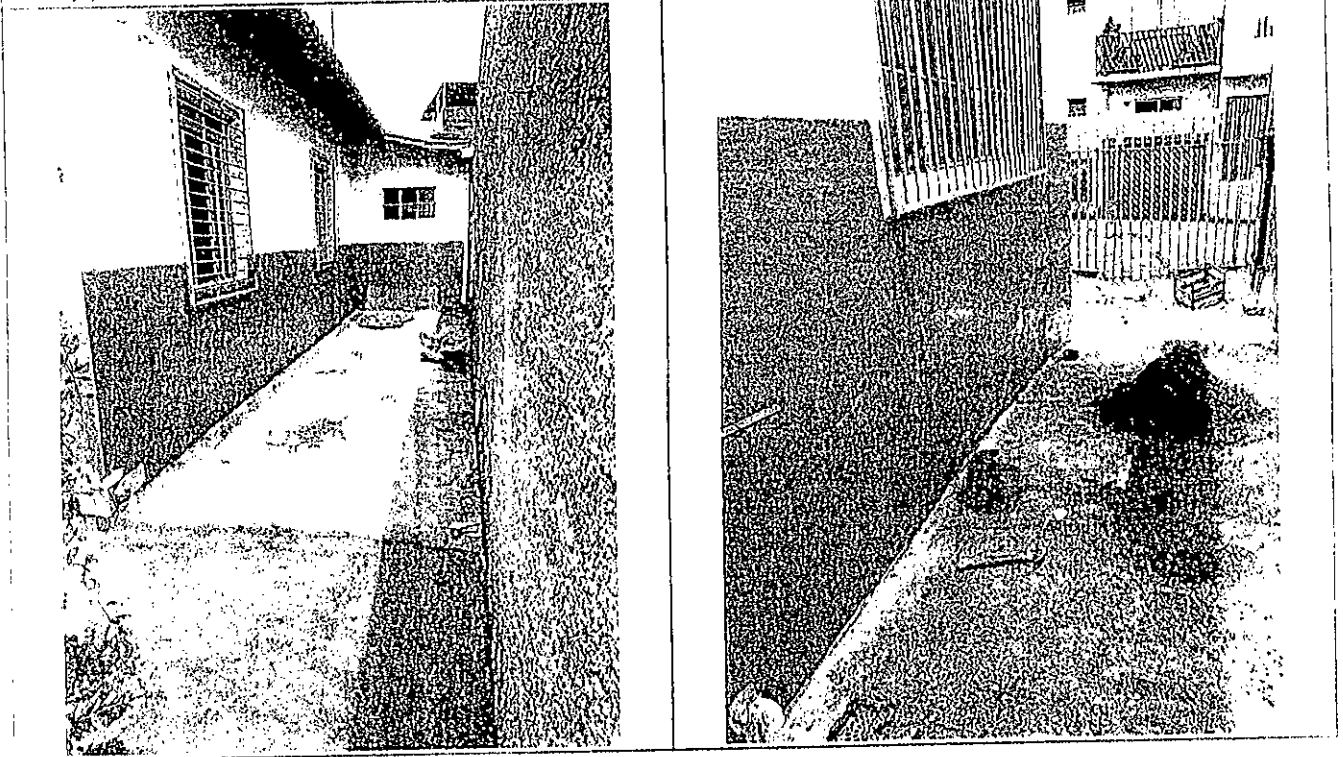*[Handwritten signature]*

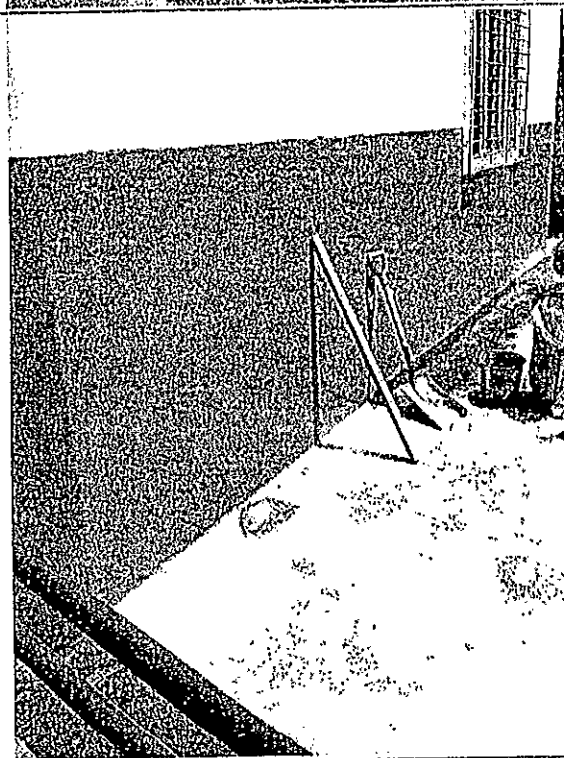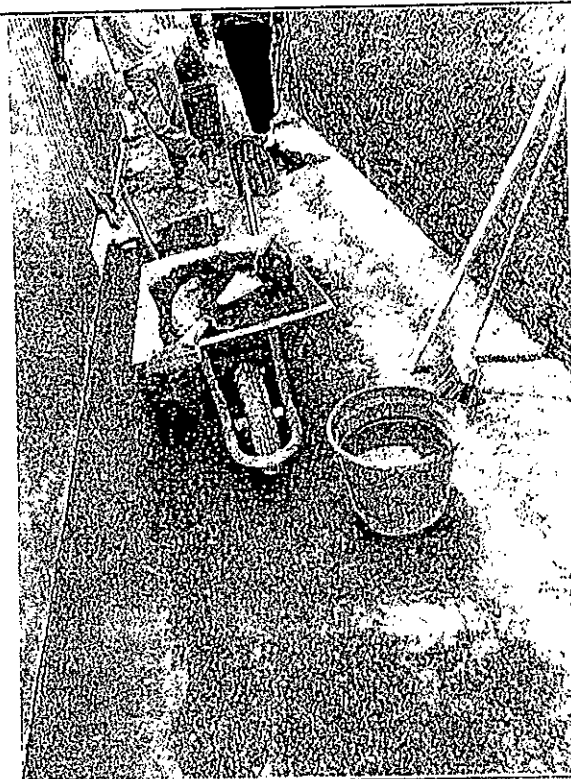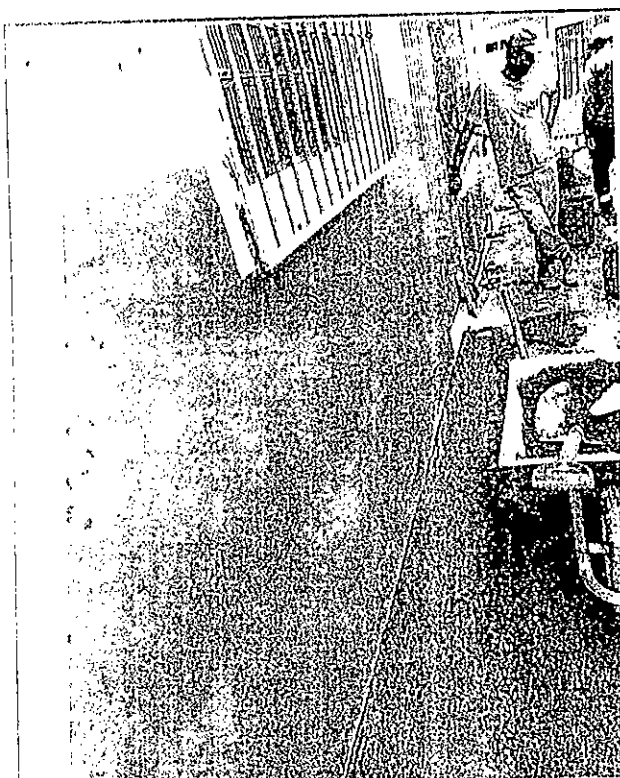

Handwritten signature

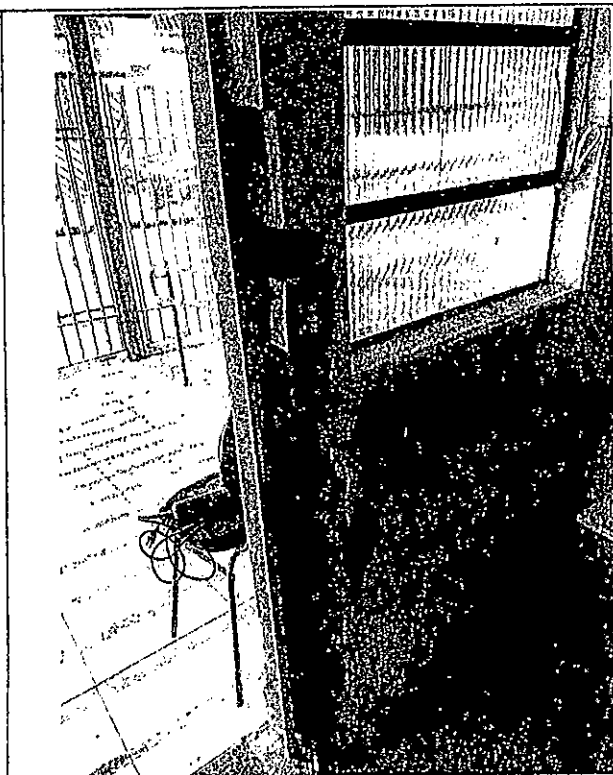

Assinatura

[Handwritten signature]

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	14
				Data do relatório	01/02/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	18 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	40 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável



Atividades (1)

INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA

Em Andamento

Fotos (10)



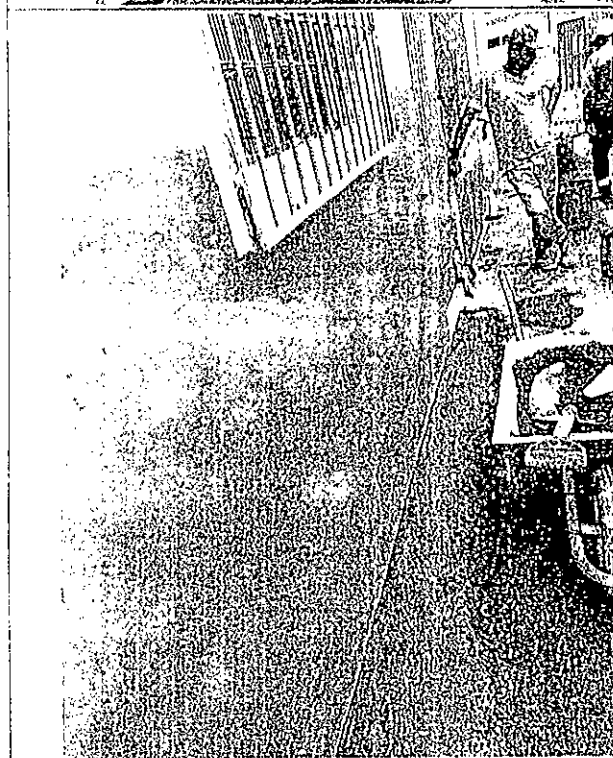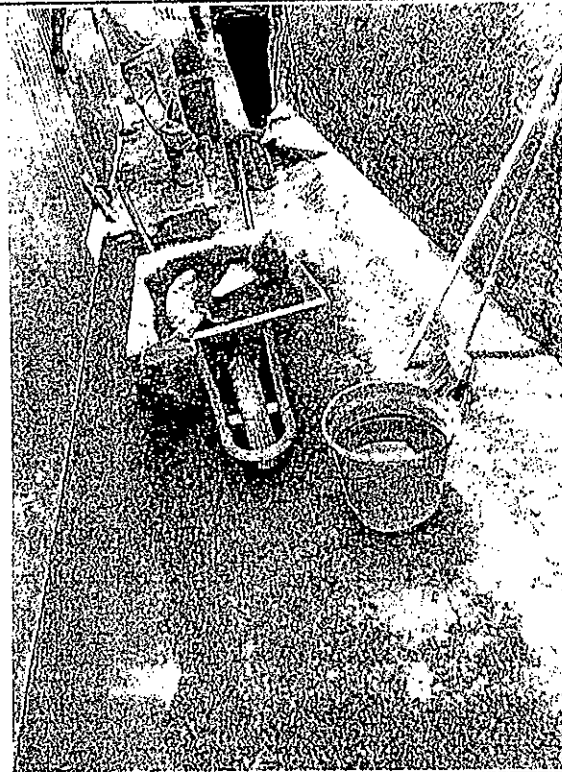

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	15
				Data do relatório	02/02/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	19 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	39 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)

FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA

Em Andamento

Fotos (3)






Assinatura

Assinatura



ARROJADO LISBOA				Relatório nº	16
				Data do relatório	03/02/2024
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	20 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	38 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☼ Claro	Praticável
Tarde	☼ Claro	Praticável

Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

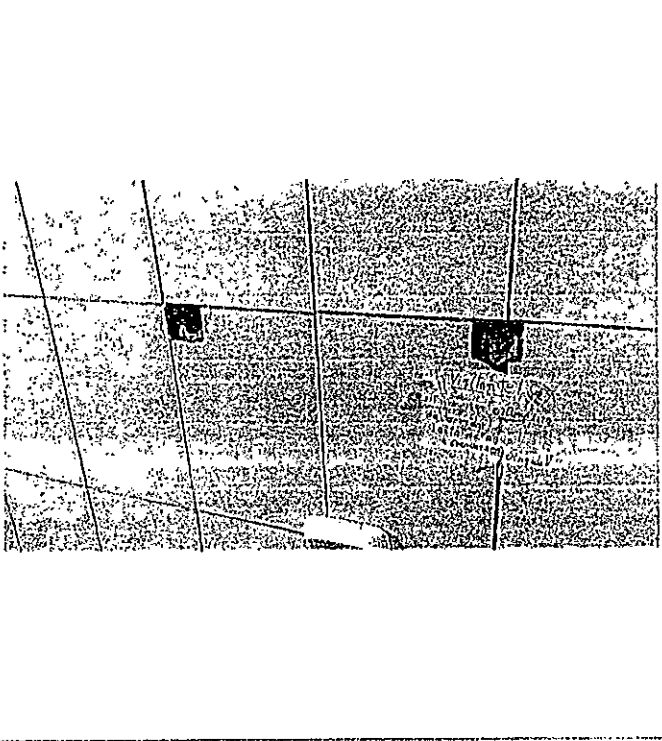Fotos (6)	
	

Daniel

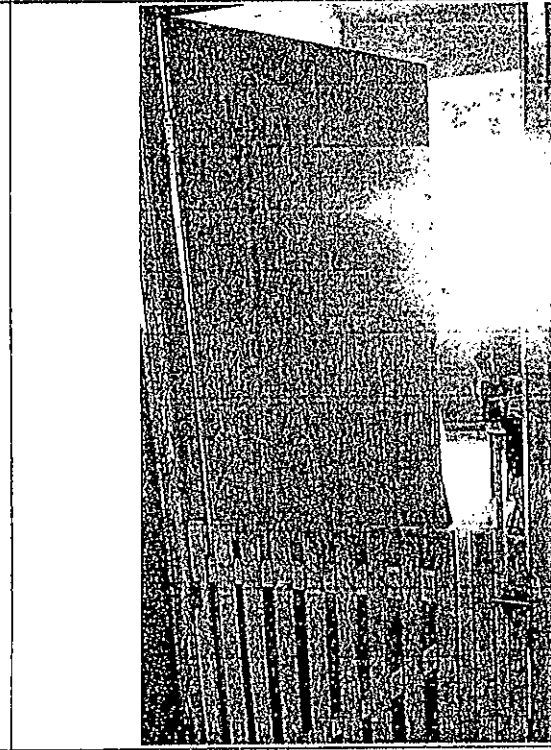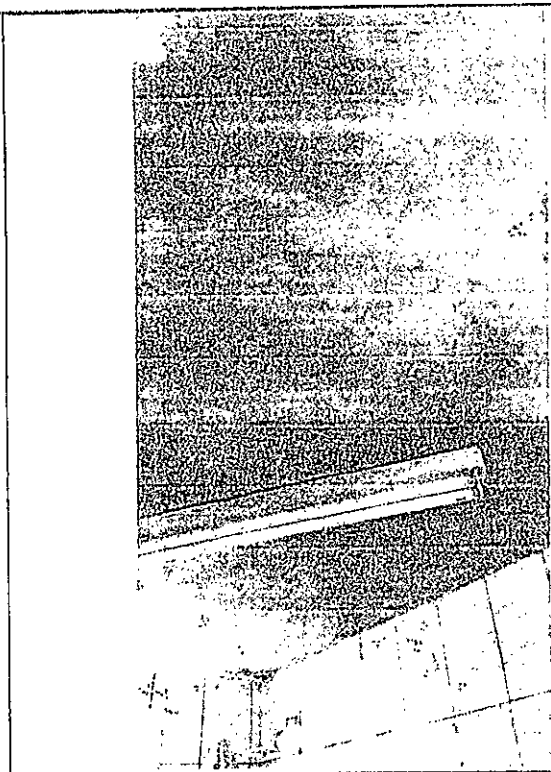


Assinatura

Assinatura




ARROJADO LISBOA				Relatório nº	17
				Data do relatório	04/02/2024
				Dia da semana	Domingo
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA MONSENHOR JOSE FERREIRA - GUARANY			Prazo contratual	58 dias
Local	GUARANY			Prazo decorrido	21 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	37 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)	
FINALIZANDO OS REPAROS NA ESCOLA	Em Andamento

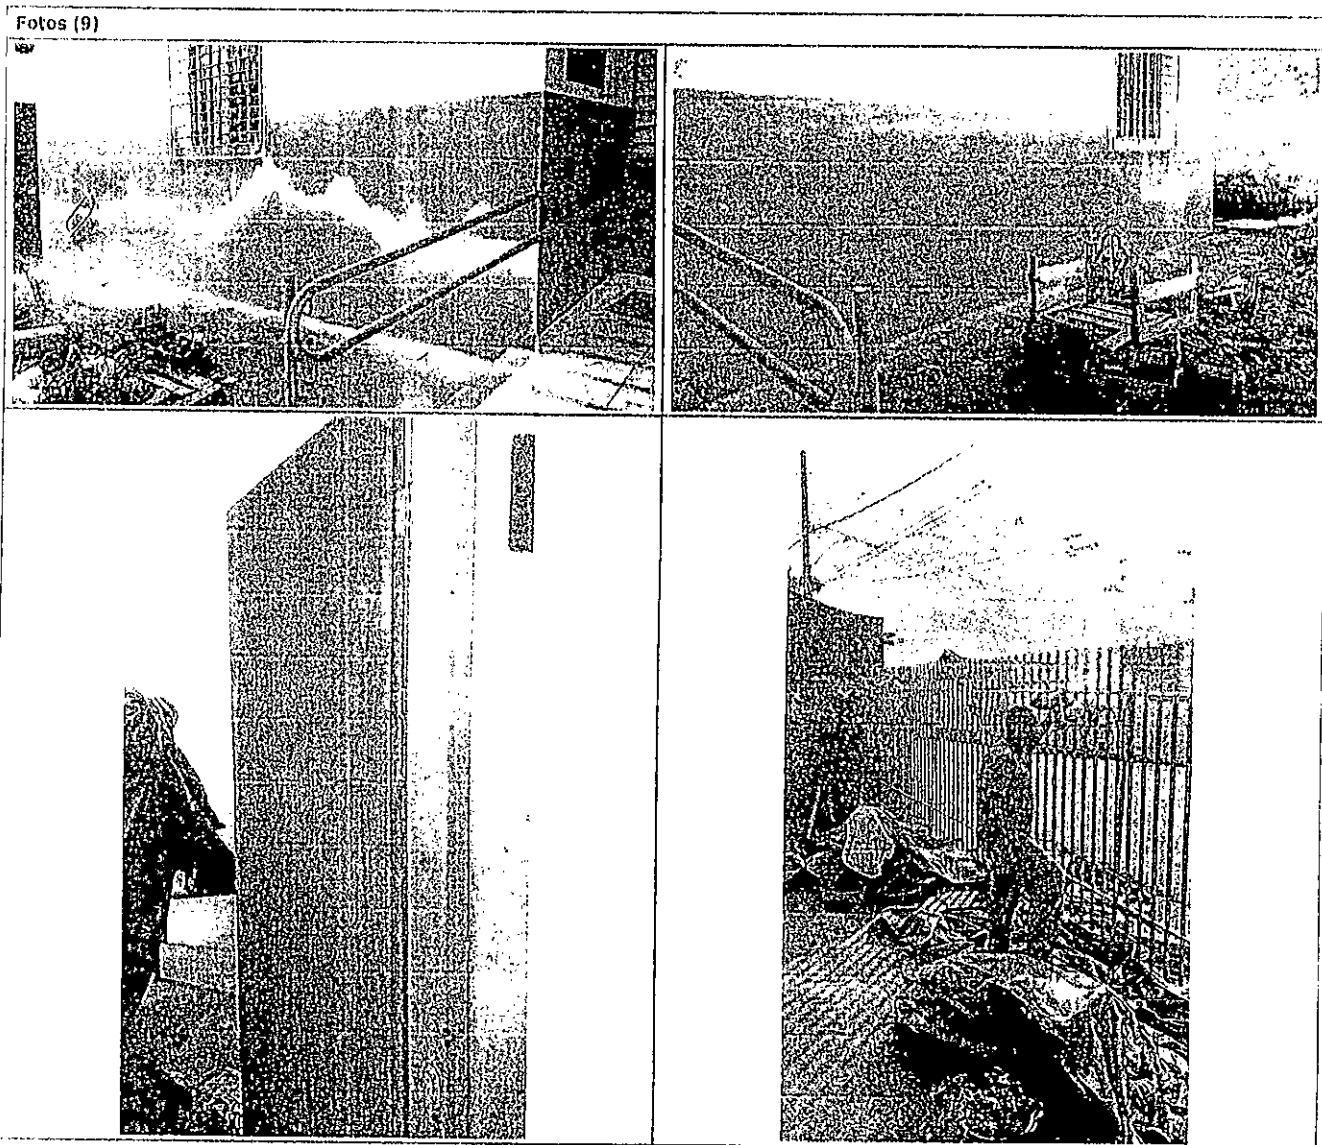

DS

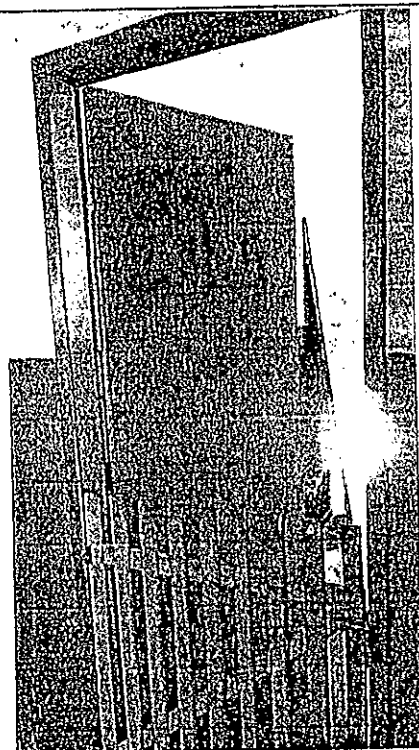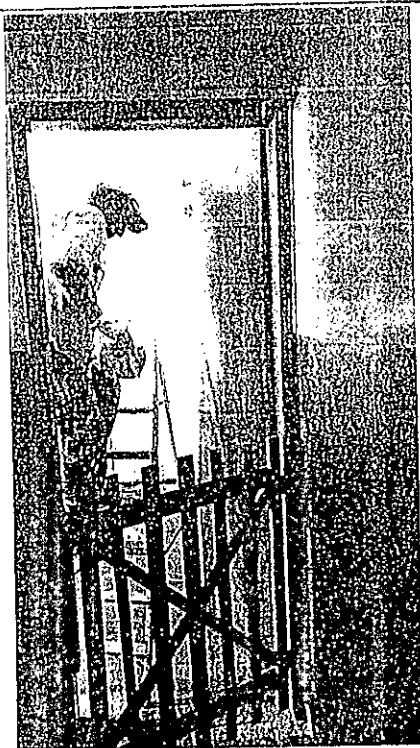

10/11



Def

Assinatura

Assinatura

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISHOA LTDA N° ARQUIVO: F1c3Q9FRhmd0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 EPAS: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: Jeceaba UF: MG CEP: 35498-000 TELEFONE: 31-85180219 CNAE: 7112000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COM ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12		
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abateidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.348, DE 17/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OSPA - RET

858600000039 116201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA:CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17	Nº ARQUIVO: F1C3Q9FRhmd0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:	SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	Nº CONTROLE: ANR0WuzRSn10000-0
TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17	Nº CONTROLE: HtDTH1UDelw0000-2
LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE
RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617	CENTRO	CEP
	JECEABA	UF
		35498000
		MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13º SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	414,66
		DEPÓSITO	311,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13º SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	414,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	277,12	DEPÓSITO	311,82
VAL DEVIDO PREV SOC	277,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17 N° ARQUIVO: F1C3Q9FRHND0000-3
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2023 N° CONTROLE: ANR0WUZRSNT10000-0

TOTAIS DA EMPRESA			
VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20	REM SEM 13° SALÁRIO	3.483,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	414,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	277,12	DEPÓSITO	311,82
VAL DEVIDO PREV SOC	277,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2
TOTAL A RECOLHER		311,82	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA				INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17				
COMP: 12/2023		COD REC:150	COD GPS: 2003	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA				INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM
ALLEX DOS ANJOS NASCIMENTO	1.741,60	207,33	212.72536.89-2	11/12/2023	01		155,91	07166
			0,00	138,56				0,00
MIGUEL MARCOS VIEIRA	1.741,60	207,33	113.40144.17-9	11/12/2023	01		155,91	07152
			0,00	138,56				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003
FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
Nº DE CONTROLE: HEDTHUDELM0000-2
Nº ARQUIVO: F1C3Q9Rhmd0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA UF: MG CEP: 35498-000 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00
TOTALS:	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617
CIDADE: JECEABA
UF: MG CEP: 35498-000 TELEFONE: 0031 8518 0219
Nº DE CONTROLE: HEDTHUDelw0000-2
Nº ARQUIVO: F1c3Q9Fhmd0000-3
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARHOJADO LISBOA LTDA N° DE CONTROLE: ANR0WUZRSN10000-0 N° ARQUIVO: F1C3Q9ZRhmdD0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JECEABA UF: MG CEP: 35498-000 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00
TOTAIS:	2	3.483,20	414,66	3.483,20	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000039 118201802405 107684180859 036105100014

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA	Nº DE CONTROLE: ANR0WUZRSN10000-0	Nº ARQUIVO: FL309FRHMD0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003	FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: JECEABA	UF: MG CEP: 35498-000	CNAE PREPONDERANTE: 7112000
		CNAE: 7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.483,20
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 414,66

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	311,82
311,82				

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA N° DE CONTROLE: ANR0WUZRSN10000-0
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA ENTRE RIOS DE MINAS 617 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JECEABA UF: MG CEP: 35498-000 TELEFONE: 0031 8518 0219 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 277.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 277.12
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (Lei 9.711/98) 0.06 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEFP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 50.361.051/0001-17
SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QUOTE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.897,86

DEPÓSITO

311,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

311,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 06/02/2024
HORA: 09:49:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES : SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA			50.361.051/0001-17			2003	507
277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	0,00
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES							



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000013
Emissão
20/03/2024 11:05:17
Código de Verificação
EBF4-E7F9

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA
CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17
Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG

Inscrição Municipal: 0000000000000004547
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
E-mail:

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

RADEQUAÇÃO REPARO ESCOLA TRES BARRAS

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 3.027,37
BASE DE CALCULO MATERIAIS : 7.063,87

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município

Data 20 1 03 20 24

Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.069-0
Sicob

Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

25/03

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
10.091,24	10.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPF	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,24
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Emp. 13 79/2024

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 20 1 03 20 24
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033 E-mail: licitalafaiete@conselhoirlafaiete.mg.gov.br Site: www.	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 671/2024
	Processo Administrativo: 90/2024 Contrato: 131/2024 Nº da Licitação: 98/2024 Modalidade: Concorrência Data da Contratação: 09/11/2024 Data da Solicitação: 23/02/2024 Sequencial do Contrato: 198

27/02/24

NE 1379

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA Data da tramitação: 23/02/2024

Fornecedor: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17 Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS, 617, Centro - 35498-000, JECEABA - MG E-mail: contabilidadejeceaba@outlook.com	Telefone(s): 3185180219
--	-------------------------

Prezados senhores, Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma:	020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Condição de Pagamento:	CONFORME CONTRATO
Prazo de Entrega:	05 DIAS ÚTEIS DA ORDEM DE SERVIÇO
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL
Objeto da Contratação:	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
Observações:	RIMS 88/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA E. M. SEBASTIÃO PEREIRA DA FONSECA.
Empenho:	
Despesas:	
102 - 25.001.12.361.0012.2057.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA	
Desdobramento:	
Recurso:	1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,004289	SV	73548	Serviço de engenharia - Prestação de serviços de		2.352.600,0000	10.091,2
						Total Geral:	10.091,2

Conselheiro Lafaiete/MG, 23 de Fevereiro de 2024

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	18/03/2024
NOME:	ESCOLA MUNICIPAL TRES BARRAS - READEQUAÇÃO		BDI:	25,92%
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%
OBJETO:	READEQUAÇÃO			
Nº AE	671/2024	Nº NE:	1379/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEN DE SERVIÇO	01./2024
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 10.091,2424
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$ 10.091,24
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIAS FERNANDES 09252216600 Assinado em 18/03/2024 por 167910216 Dados: 107142119 1310 33 41 00 Construtora Arrojado Lisboa LTDA	 Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:	SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildaro Bittencourt Dutra	 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME:		Escola Municipal "Sebastião Pereira da Fonseca" - Três Barras										
SETOR RESPONSÁVEL:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CONTRATADO:		ARROJOADO LISBOA										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023										
REFERÊNCIA:		2023/08 - SETOR LISTE COM DESONERAÇÃO 2023/11 - SINAPI - MG DESONERADO										
Nº AE		571/2024										
		Nº ME 1379/2024										
		ORDEM DE SERVIÇO										
		01/2024										
ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM B.O.E. E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	m	257,04	257,04			R\$ 21,14	R\$ 5.434,35	257,04	100,00%
2	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAUJ, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL.	m	30,24	30,24			R\$ 9,88	R\$ 298,80	30,24	100,00%
3	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m	30,24	30,24			R\$ 120,51	R\$ 3.644,16	30,24	100,00%
4	SEINFRA	ED-48459	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC., COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, RECAPO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCOALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL, REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	m2	120,00	120,00			R\$ 5,46	R\$ 654,96	120,00	100,00%
5	SEINFRA	ED-48493		m2	5,04	5,04			R\$ 11,70	R\$ 58,97	5,04	100,00%
				SUBTOTAL:					R\$ 10.091,24			
				TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:					R\$ 10.091,24			
				PERCENTUAL EXECUTADO:					100,00%			
				TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:					R\$ 10.091,24			
				SALDO					R\$ 0,00			
FISCALIZAÇÃO:				CONTRATADA:				RESPONSÁVEL TÉCNICA:				
Luísa Silva Engenheiro Civil				HUDSON DALMO FARIA FERNANDES 09252221660 FERNANDES 09252221660 FERNANDES 09252221660 Data: 2024.08.19 13:27:38 -03'00'				Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREB: 256530/D 18/03/2024				
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Kildare Bittencourt Dutra				V. Ad. Albano								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

18/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. / PERÍMETRO		LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)				(m ²)	(m ³)	(kg)	(kg/m ³)	(mm)	(unit)			
1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL.														257,04	m
	TELHADO														257,0400	
2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE TÉRMICA														30,24	m
	TELHADO														30,2400	
3	RIPIA DE MADEIRA, EM PARAUJ, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL.														30,24	m
	TELHADO														30,2400	
4	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLUMEA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL.														120,00	m
	TELHADO														120,0000	
5	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO ALZARGUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL.														5,04	m
	TELHADO														5,0400	

placa

Q

Prof

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	4
				Data do relatório	18/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	4 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	54 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável


Atividades (1)

INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA

Em Andamento

Fotos (7)

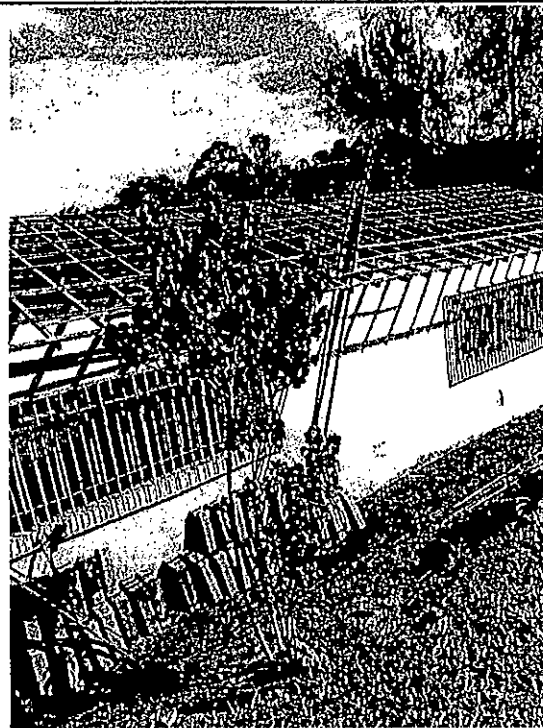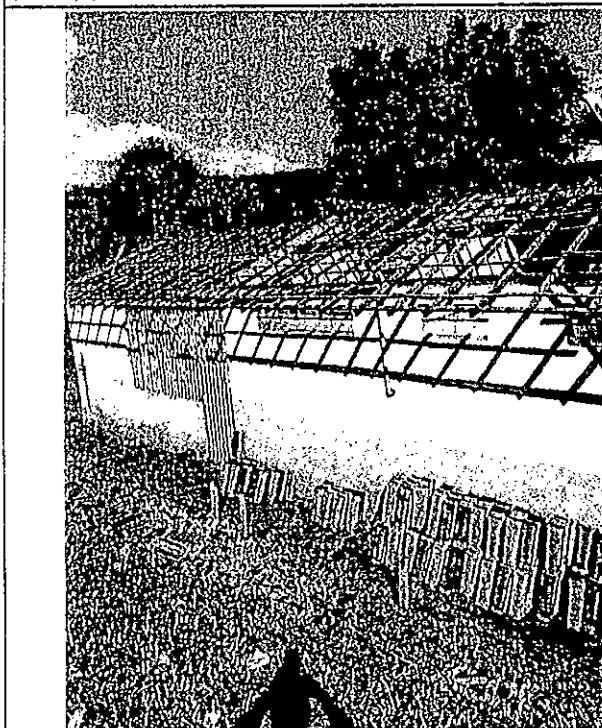

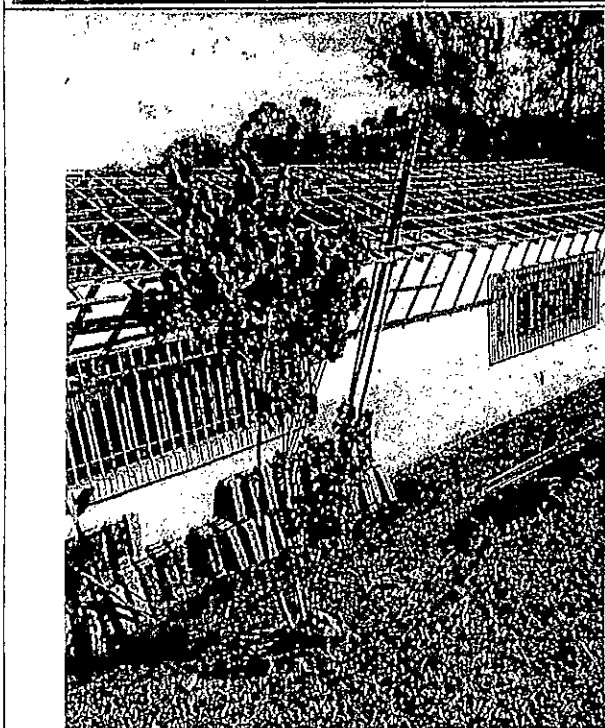

Duf

[Signature]

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	5
				Data do relatório	19/01/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA SEBASTIAO PEREIRA DA FONSECA - TRES BARRAS			Prazo contratual	58 dias
Local	TRES BARRAS			Prazo decorrido	5 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	53 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)

INICIO DOS REPAROS NA ESCOLA

Em Andamento

Fotos (5)

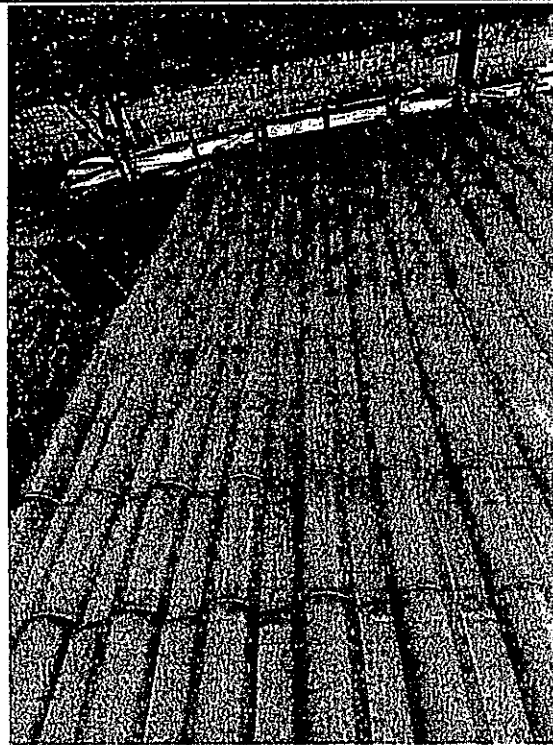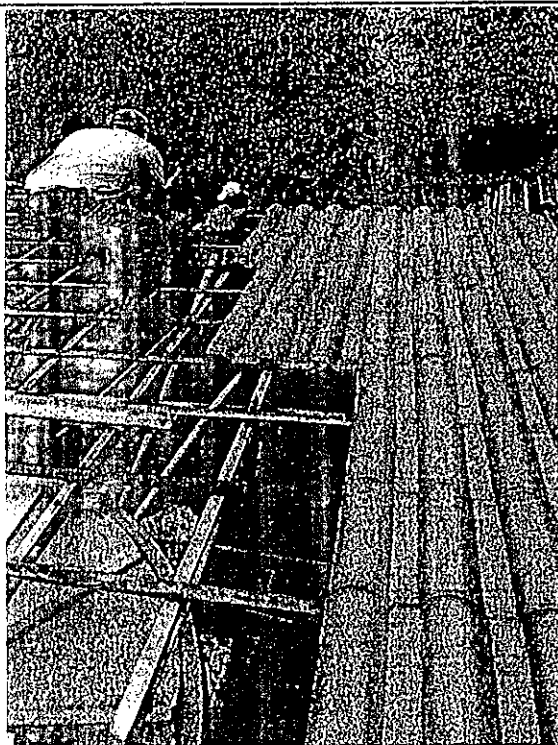



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000017
Emissão
27/03/2024 10:46:44
Código de Verificação
C84A-C8C3

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA**
CPF/CNPJ: **50.361.051/0001-17**
Endereço: **ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000**
Município: **3135407 - JECEABA/MG**

Inscrição Municipal: **0000000000000004547**
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: **19.716.360/0001-51**

Endereço: **AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO**
- CEP: **36400026**

Município: **3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG**

E-mail:

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA GAGE

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 2.228,48
BASE DE CALCULO MATERIAIS: 5.199,79

Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.069-0
Sicoob

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 01/04/2024
Assinatura Legível Doc. Identificada
Assinatura Legível Doc. Identificada

Kelly 03/04/24

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
7.428,27	7.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,27
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Impresso 1380/2024

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Assinatura Legível Doc. Identificada
Assinatura Legível Doc. Identificada





PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			DATA:	26/03/2024
NOME:	ESCOLA MUNICIPAL ROMEU GUIMARÃES - GAGÉ			BDI:	25,92%
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA			DESC. SINAPI:	25,45%
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023			DESC. SEINFRA:	21,58%
OBJETO:	REPAROS INTERNOS				
Nº AE	672/2024		Nº NE:	1380/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO			ORDEM DE SERVIÇO	18/2024
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 7.428,2677	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
				TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 7.428,27
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARI FERNANDES.09232216600 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniele de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME		CREMEI JUQUITA VIEIRA										
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CONTRATADO		ARROJADO LISBOA										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023										
REFERÊNCIA:		2023/08_SETOP_LISTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO										
Nº AE		672/2024										
		Nº NE 1380/2024										
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM 15% DE DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-48460	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	m²	112,74	112,74			R\$ 1,82	R\$ 205,11	112,74	100,00%
2	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	m²	112,74	112,74			R\$ 64,07	R\$ 7.223,15	112,74	100,00%
3	SEINFRA	ED-49502	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO 80X210CM, TIPO DE ABIRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURAVERNIZ, TIPO PRANCHETASARRAFADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURAVERNIZ	UNIDADE	1,00	0,00			R\$ 875,12	R\$ 0,00	0,00	0,00%
4	SEINFRA	ED-48493	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCOALZARGUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNIDADE	1,00	0,00			R\$ 11,70	R\$ 0,00	0,00	0,00%
5	SEINFRA	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20X25 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	32,50	0,00			R\$ 87,08	R\$ 0,00	0,00	0,00%
6	SEINFRA	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	23,00	0,00			R\$ 11,63	R\$ 0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL:										R\$ 7.428,27		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 7.428,27		
PERCENTUAL EXECUTADO:										65,09%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO										R\$ 11.412,59		
SALDO										R\$ 3.984,32		

FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisia Silva Engenheiro Civil		 HUDSON DALMO FABIA FERNANDES 0392371660 0 Assessor de Engenharia e Edificações Cadastrado no CREA/MG nº 0392371660		 Daniele da Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D	
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		26/03/2024	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

ESCOLA GAGE

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP/ PERIMETRO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO VÃO (m²)	AREA (m²)	VOLUME (m³)	PESO (kg)	DENSIDADE (kg/m³)	DMT (Kg)	QUANTIDADE (unit)	HORA h	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	REMOÇÃO NATURAL DE OBRAS DE FERRAGEM (CLOSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMIDA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E DEBARRAÇÃO DO MATERIAL PARA O LIXO DO MUNICÍPIO														
	Sala dos professores		5,70	3,5500			20,24								
	Sala Carfós		5,50	5,0000			27,50							20,24	
	Sala Real de Queiz		6,50	5,0000			32,50							27,50	
	Sala Minas de Ouro		6,50	5,0000			32,50							32,50	
2	FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E FERRAGENS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA														
	Sala dos professores		5,70	3,5500			20,24							112,74	m²
	Sala Carfós		5,50	5,0000			27,50							20,24	
	Sala Real de Queiz		6,50	5,0000			32,50							27,50	
	Sala Minas de Ouro		6,50	5,0000			32,50							32,50	
3	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL, PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETAS/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ														
	Sala Minas de Ouro		6,50	5,0000			32,50							32,50	
4	REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCOALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO PARA O LIXO DO MUNICÍPIO														
	Sala Minas de Ouro		6,50	5,0000			32,50								
5	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20X25 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO														
	Sala Minas de Ouro		6,50	5,0000			32,50								
6	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO														
	Sala Minas de Ouro		6,50	5,0000			32,50								


10/10/2024


ARROJADO LISBOA				Relatório nº	1
				Data do relatório	18/03/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	ESCOLA GAGE			Contrato	
Local	GAGE			Prazo contratual	4 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo decorrido	1 dias
				Prazo a vencer	3 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)
REMOÇÃO DE FORRO
Em Andamento

Fotos (4)

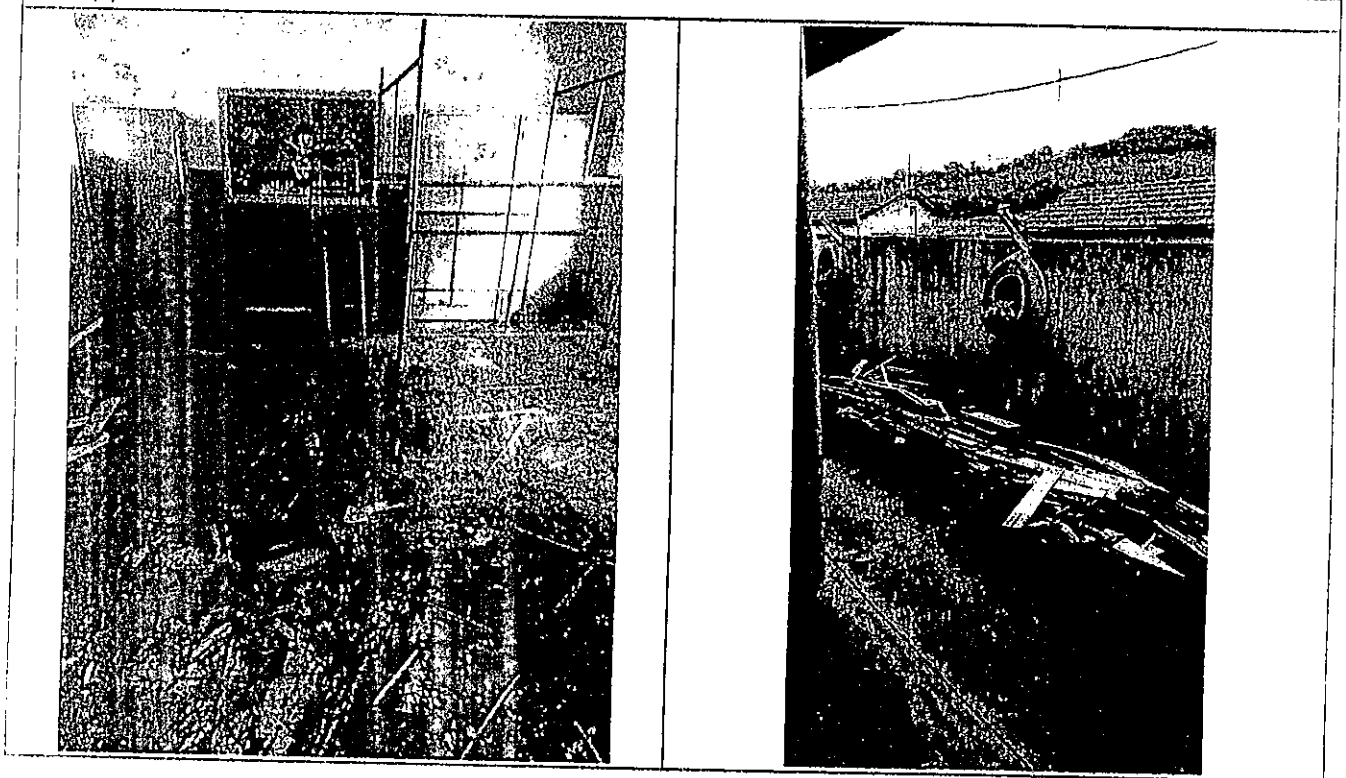

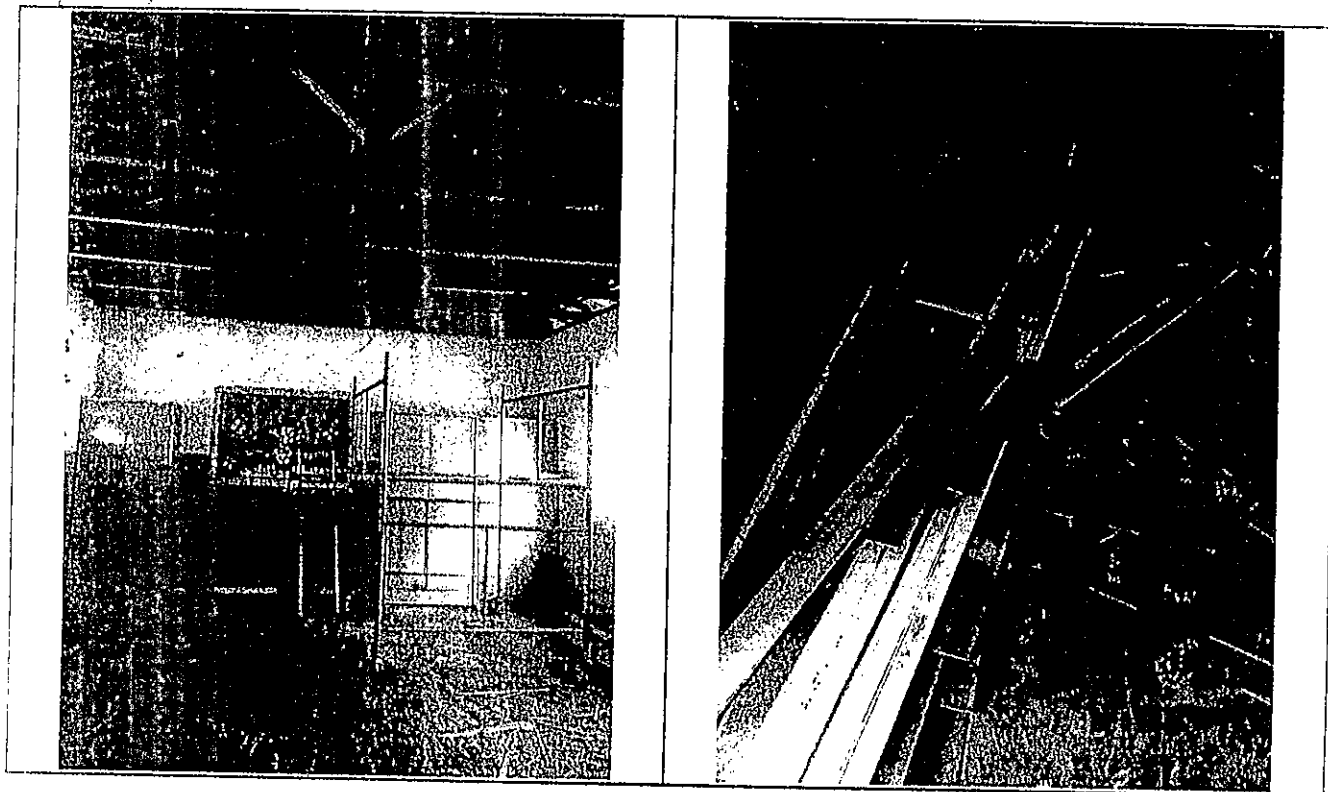

①


Assinatura

Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório n°	2
				Data do relatório	19/03/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	ESCOLA GAGE			Contrato	
Local	GAGE			Prazo contratual	4 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo decorrido	2 dias
				Prazo a vencer	2 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
INSTALAÇÃO DE FORRO	Em Andamento

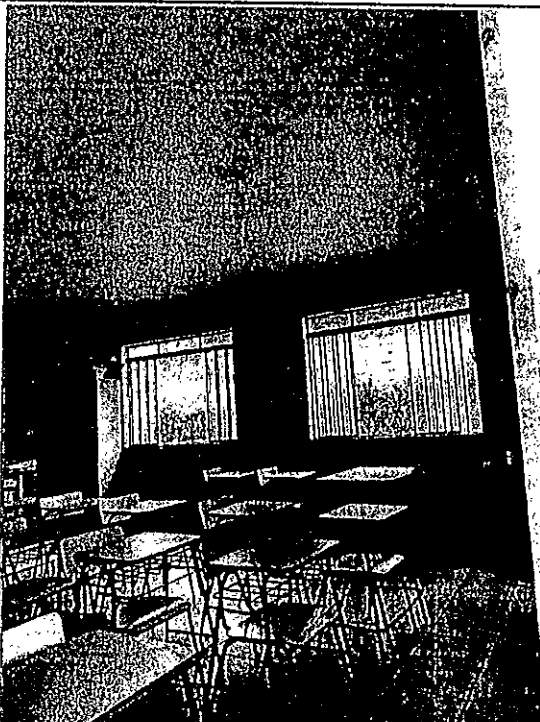Fotos (7)	
	





0

0004



①

Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000015
Emissão
20/03/2024 11:09:21
Código de Verificação
EC38-A6A9

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA
CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17
Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG
Inscrição Municipal: 0000000000000004547
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
E-mail:
CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

READEQUAÇÃO REPARO MATO DENTRO

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 1.008,00
BASE DE CALCULO-MATERIAIS : 2.351,98

Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.069-0
Sicoob

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município

Data 20/03/2024
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

25/03/2024

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	3.359,98	Deduções	3.359,98	PIS / PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00
CSLL	0,00	Base de Cálculo	0,00	Alíquota	5,00	Desc. Incondicionado	0,00	Desc. Condicionado	0,00	Outras Retenções	0,00
ICMS	0,00	IPI	0,00	IOF	0,00	CIDE	0,00	ISS Retido	0,00	Valor Líquido NFS-e	3.359,98
Exigibilidade do ISS	01 - Exigível									Valor do ISS	0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(5,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Emp. 1381/2024

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 20/03/2024
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

AV PREF MARIO RODRIGUES PEREIRA, 10 - centro - Conselheiro Lafaiete
CEP: 36400-026 CNPJ: 19.718.360/0001-51 Telefone: (31) 9239-2033
E-mail: licitalafaiete@conselhrolafaiete.mg.gov.br Site: www.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 673/2024

Processo Administrativo: 90/2024
Contrato: 131/2024
Nº da Licitação: 98/2024
Modalidade: Concorrência
Data da Contratação: 09/11/2023
Data da Solicitação: 23/02/2024
Sequencial do Contrato: 11

27/02/24

NE 1381

AUTORIZADA por JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Data da tramitação: 23/02/2024

Fornecedor: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA

Telefone(s): 3185180219

CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS, 617, Centro - 35498-000, JECEABA - MG

E-mail: contabilidadejeceaba@outlook.com

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 020250010060101 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Condição de Pagamento: CONFORME CONTRATO

Prazo de Entrega: 05 DIAS ÚTEIS DA ORDEM DE SERVIÇO

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Contratação: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

Observações: RIMS 87/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA E. M. ESPIRIDÃO PEREIRA.

Empenho:

Despesas:

102 - 25.001.12.361.0012.2057.3.3.90.39.00 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA

Desdobramento:

Recurso: 1.500.000.1001 - Recursos não vinculados de Impostos (Educação)

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço To
1	0,002385	SV	73548	Serviço de engenharia - Prestação de serviços de		2.352.600,0000	5.611

Total Geral: 5.611

Conselheiro Lafaiete/MG, 23 de Fevereiro de 2024

JUSSARA BEATRIZ DA CUNHA
Assinatura e Carimbo do Responsável



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	18/03/2024	
NOME:	ESCOLA MUNICIPAL ESPIRIDIÃO PEREIRA - MATO DENTRO		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	READEQUAÇÃO - MATO DENTRO				
Nº AE	673/2024		Nº NE:	1381/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	02./2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 3.359,9789	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 3.359,98	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luisa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALAID FARIA FERNANDES:09232216600 Arquiteto de Interiores registrado por nº051216 DALAIDY MARAFIEN-ARQ:09132216606 Data: 2014.06.18 12:23:56 -03:00 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniela Oliveira Silva Eng. Civil/TÓREA: 268.630/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Albano Tiburcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME: ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDÃO PEREIRA - MATO DENTRO												
SETOR RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
CONTRATADO: ARROJADO LISBOA												
ATA REGISTRO DE PREÇO: 029/2023												
REFERÊNCIA: 2023/08_SETOR_LESTE_COM_DESONERAÇÃO												
2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO												
Nº AE: 673/2024												
Nº ME: 1381/2024												
ORDEN DE SERVIÇO: 02/2024												
ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM 50% DE DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-48508	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m2	221,79	221,79			R\$ 7,84	R\$ 1.739,28	221,79	100,00%
2	SEINFRA	ED-48457	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO	m2	40,00	40,00			R\$ 19,61	R\$ 784,51	40,00	100,00%
3	SEINFRA	ED-50835	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	20,00	0,00			R\$ 112,56	R\$ 0,00	0,00	0,00%
4	SEINFRA	ED-48502	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	46,24	46,24			R\$ 18,08	R\$ 836,19	46,24	100,00%
SUBTOTAL:										R\$ 3.359,98		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 3.359,98		
PERCENTUAL EXECUTADO:										59,88%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO										R\$ 5.611,26		
SALDO										R\$ 2.251,28		
RESPONSÁVEL TÉCNICA:												
CONTRATADA: HUDSON DALMO FARIAS DALMO FARIAS FERNANDES DES.0725 2216600												
FISCALIZAÇÃO: Luisa Silva Engenheiro Civil												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
18/03/2024												

ESCOLA MUNICIPAL ESPIRIDIAO PEREIRA

1561


India



ARROJADO LISBOA				Relatório nº	9
				Data do relatório	24/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)					
Obra	ESPIRIDIAO PEREIRA			Contrato	
Local				Prazo contratual	21 dias
Contratante		Responsável	ENG. Daniele sliva	Prazo decorrido	0 dias
				Prazo a vencer	21 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
ESTRUTURA METALICA DO TELHADO	
	Em Andamento

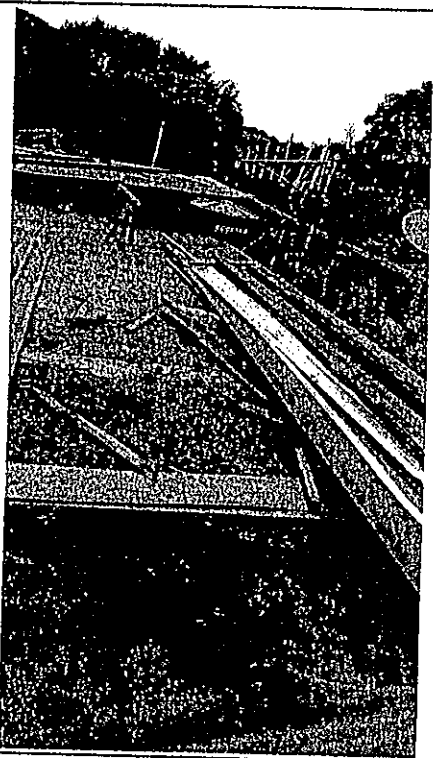Fotos (4)	
	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

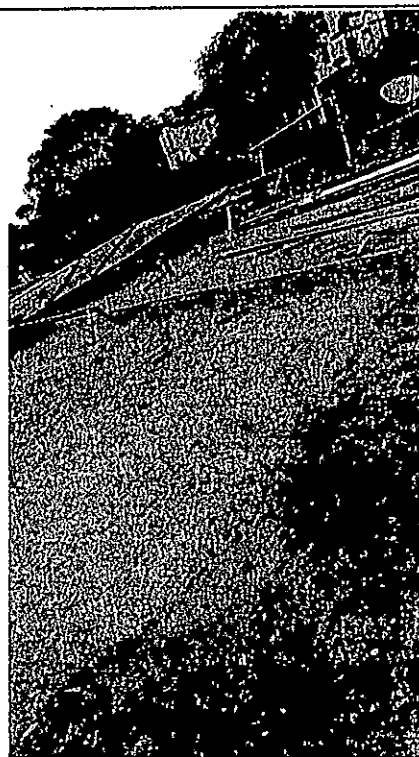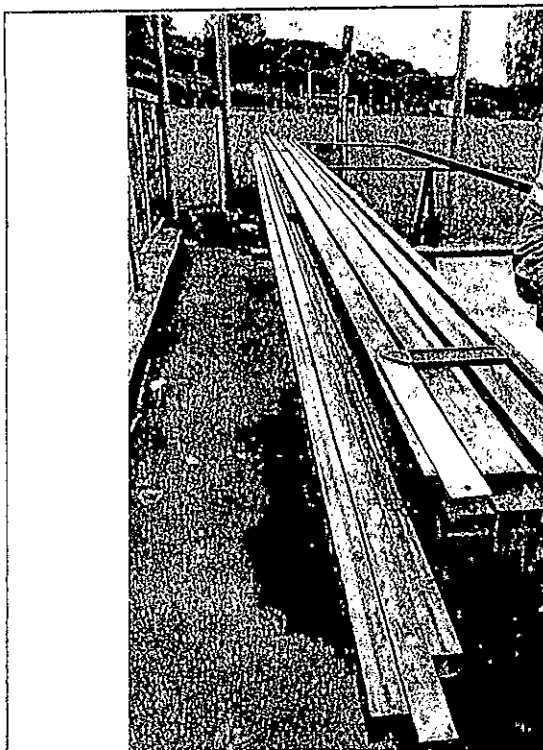

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000014
Emissão
20/03/2024 11:07:36
Código de Verificação
D735-9823

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA
CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17
Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG

Inscrição Municipal: 0000000000000004547
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
E-mail:

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

READEQUAÇÃO REPARO ESCOLA RANCHO NOVO

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 3.529,32
BASE DE CALCULO MATERIAIS : 8.235,06

Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.089-0
Sicob

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município

Data 20/03/2024
Assinatura Legível MG 16630428
Assinatura Legível Doc. Identidade
Assinatura Legível Doc. Identidade

[Handwritten Signature]

[Handwritten Stamp: Imposto 1382/2024]

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
11.764,38	11.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,38
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(5,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 20/03/2024
Assinatura Legível MG 8049834
Assinatura Legível Doc. Identidade



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	18/03/2024	
NOME:	ESCOLA RANCHO NOVO - READEQUAÇÃO		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	READEQUAÇÃO				
Nº AE	674/2024		Nº NE:	1382/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	04./2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 11.426,0449	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 338,3383	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 11.764,38	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIAS FERNANDES:09252216600 CNPJ:09.252.216/0001-90 Insc. Est. 001.015.711.023-04-0194 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniela de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 259.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra		 Adriano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME DA OBRA:		ESCOLA RANCHO NOVO										
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CONTRATADO		ARROJO DO LISBOA										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023										
REFERENCIA:		2023/08 SETOP LESTE COM DESONERAÇÃO 2023/11 SINAPI MG DESONERADO										
Nº AE		674/2024										
		Nº NE 1382/2024										
		ORDEN DE SERVIÇO										
		04/2024										
ITEM	REF	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES				VALOR UNITÁRIO COM B.O.E. DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE ESTIMADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO				
1	SEINFRA	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDOR POR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	30,00	30,00			R\$ 228,41	R\$ 6.852,42	30,00	100,00%
2	SEINFRA	FN-48599	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REAPROVEITÁVEL	M2	150,00	150,00			R\$ 7,94	R\$ 1.191,30	150,00	100,00%
3	SEINFRA	ED-48459	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEX, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTação, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, REMOVENDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	150,00	150,00			R\$ 5,46	R\$ 818,70	150,00	100,00%
DIVISÓRIA												
4	SEINFRA	ED-48537	DIVISÓRIA EM PAINEL, REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	M2	150,00	26,00			R\$ 99,18	R\$ 2.578,62	26,00	17,33%
5	SINAPI	1214insunos	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	m	150,00	1,00			R\$ 20,02	R\$ 20,02	1,00	0,67%
6	SINAPI	11137insunos	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL, EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM	M2	150,00	1,68			R\$ 104,64	R\$ 175,79	1,68	1,12%
7	SINAPI	2432insunos	DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UNIDADE	150,00	4,00			R\$ 20,07	R\$ 80,28	4,00	2,67%
N												

100

100

100

100

ITEM	REF.	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO PERÍODO	2ª MEDIÇÃO PERÍODO	3ª MEDIÇÃO PERÍODO	UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
8	SNAP1	39421Insurnos	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	m	150,00	9,80			R\$ 6,35	R\$ 62,25	9,80	6,53%
SUBTOTAL:										R\$ 11.764,38		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 11.764,38		
PERCENTUAL EXECUTADO:										25,36%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO										R\$ 46.386,54		
SALDO										R\$ 34.622,16		
FISCALIZAÇÃO:										RESPONSÁVEL TÉCNICA:		
Lúcia Silva Engenheira Civil										Hudson Dalmo Faria ACIONISTA DE LUCRO LÍQUIDO 00 FERNANDES09252166 18/03/2024 Dadas: 20/03/19 13:26:11 - 07:37		
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:										SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Kildare Brittanourt Dutra										Danielle de Oliveira Silva Eng. Civil / CREX: 2565300D 18/03/2024		

READEQUAÇÃO


MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	PERCENTUAL /	TOTAL GERAL	UNIDADE
			PERÍMETRO	(m)	(m)	(m)	(m²)	(m²)	(m³)	(kg)	(kg/m³)	(kg/m)	(unit)		
1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA ONDULADA TIPO COMPACTO, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, COM AFASTAMENTO ENTRE ONDAS DE 100MM, COM REFORÇO EM AÇO GALVANIZADO, 1,50MM DE ESPESURA, 100% DE COBERTURA, 100% DE PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO.													30,000	M²
2	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO TELHADO													150,000	M²
3	REMOÇÃO MANUAL DE TUBO DE PLASTICO 193,30X193,30X1,50MM, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC., COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO TELHADO													150,000	M²
4	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA													26,00	M²
5	Sala													26,0000	
5	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS													1,00	b
6	1 porta											1,00		1,0000	
6	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1800 MM, E = 20 MM													1,68	M²
7	1 porta											1,00		1,6800	
7	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS													4,00	UNIDADE
8	1 porta											1,00		4,0000	
8	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)													9,80	m
	1 porta											1,00		9,8000	

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	7
				Data do relatório	23/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	9 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	10 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Início reparos na escola Troca de telhados	Em Andamento

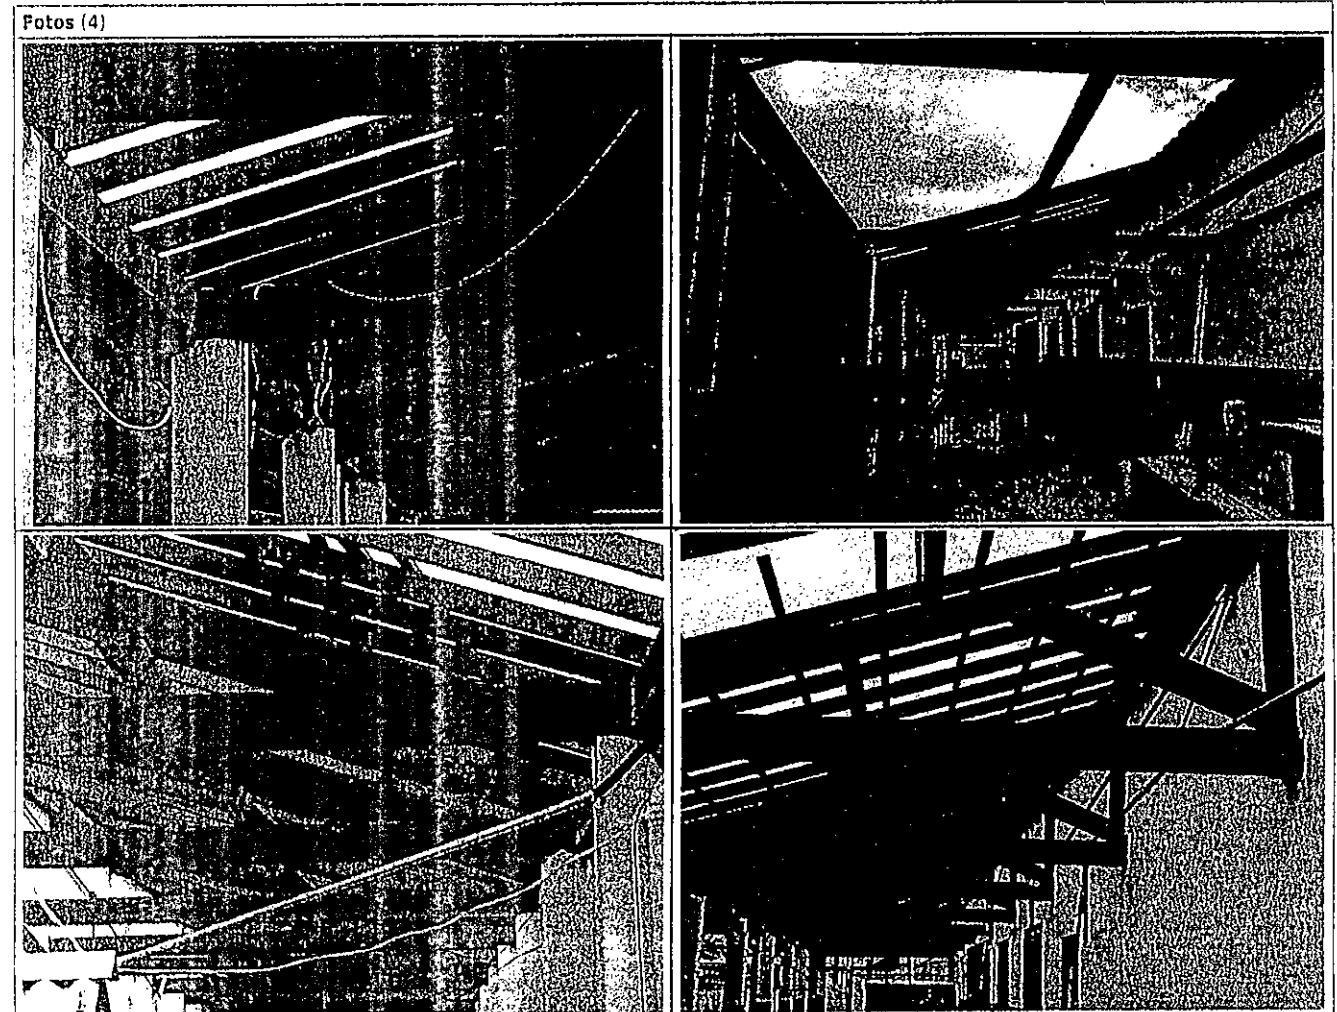


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	8
				Data do relatório	24/01/2024
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	10 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANJELE SILVA	Prazo a vencer	9 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Início reparos na escola	Em Andamento

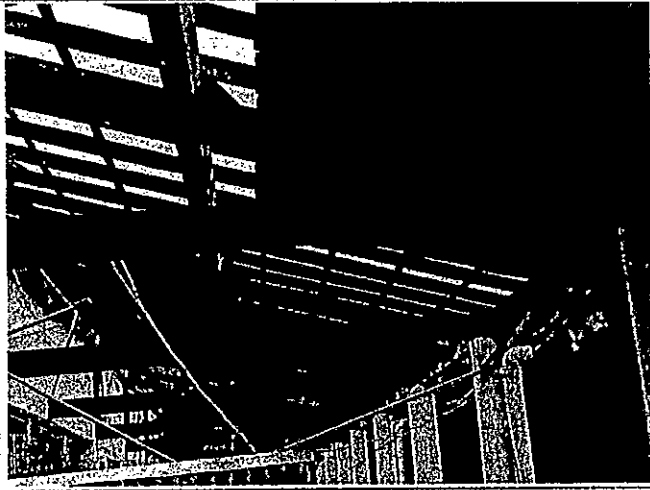Fotos (2)	
	




Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório.nº	9
				Data do relatório	25/01/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	11 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	8 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Início reparos na escola	Em Andamento

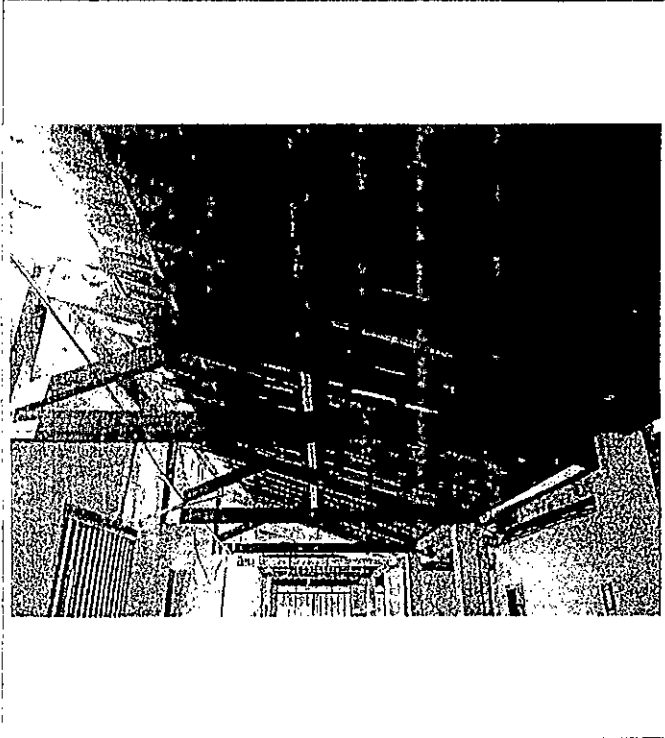Fotos (2)	
	



Assinatura




Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	10	
				Data do relatório	26/01/2024	
				Dia da semana	Sexta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias	
Local				Prazo decorrido	12 dias	
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA		Prazo a vencer	7 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Finalizados os reparos na escola.	Em Andamento

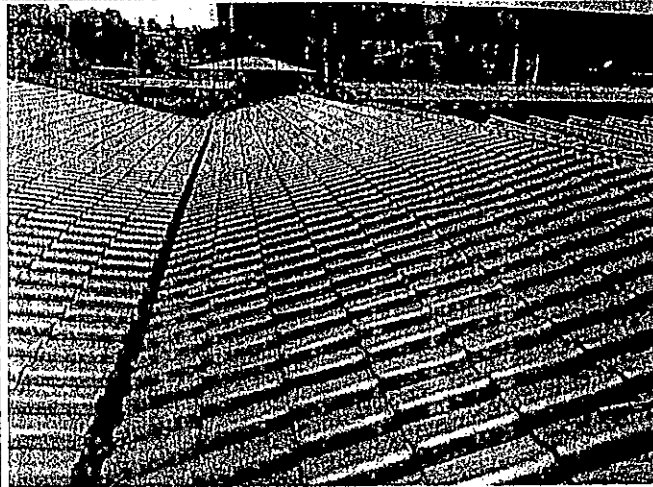Fotos (3)	
	
	


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	11
				Data do relatório	29/01/2024
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	15 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	4 dias




Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
Finalizados os reparos na escola.	Em Andamento

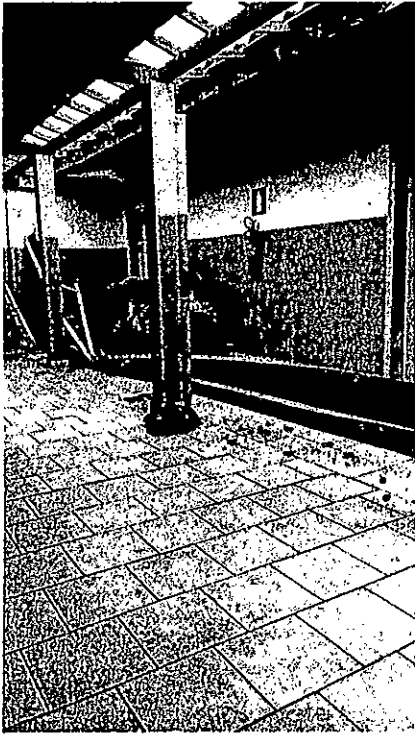Fotos (5)	
	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

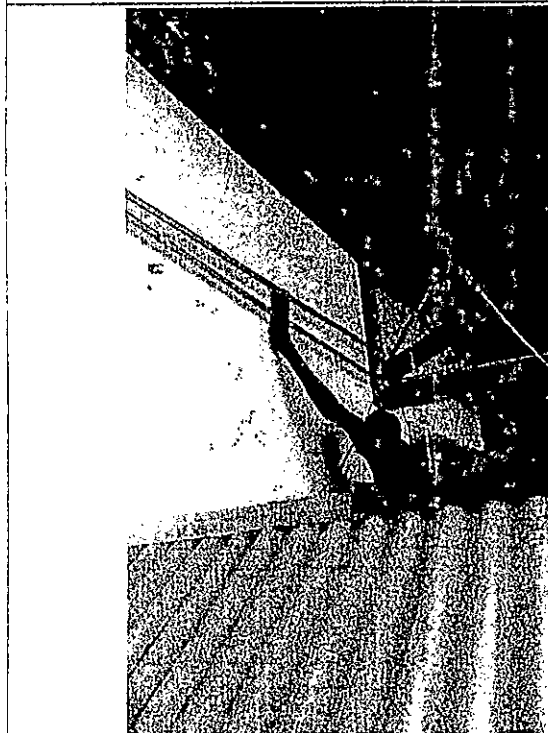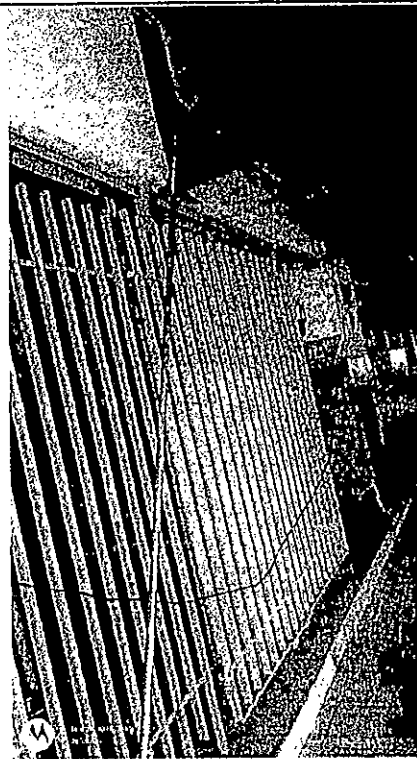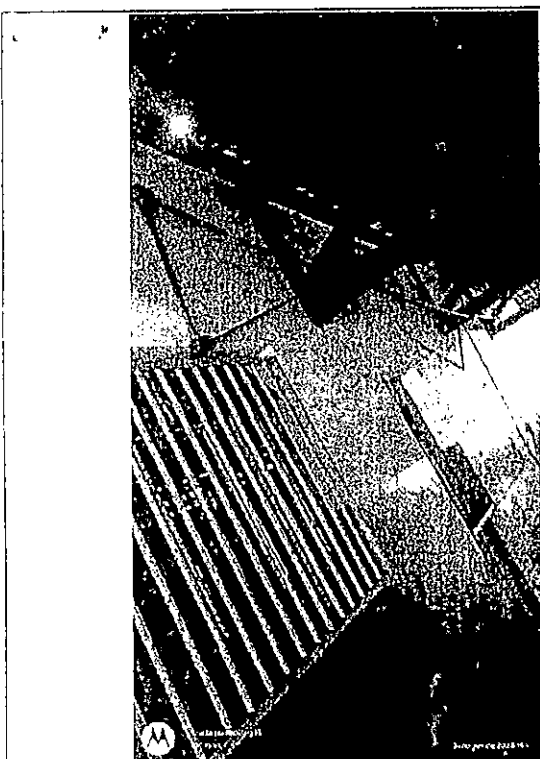

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA		Relatório nº	12		
		Data do relatório	30/01/2024		
		Dia da semana	Terça-Feira		
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato			
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO		Prazo contratual	19 dias	
Local			Prazo decorrido	16 dias	
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	3 dias





Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS FINALIZADOS	Em Andamento

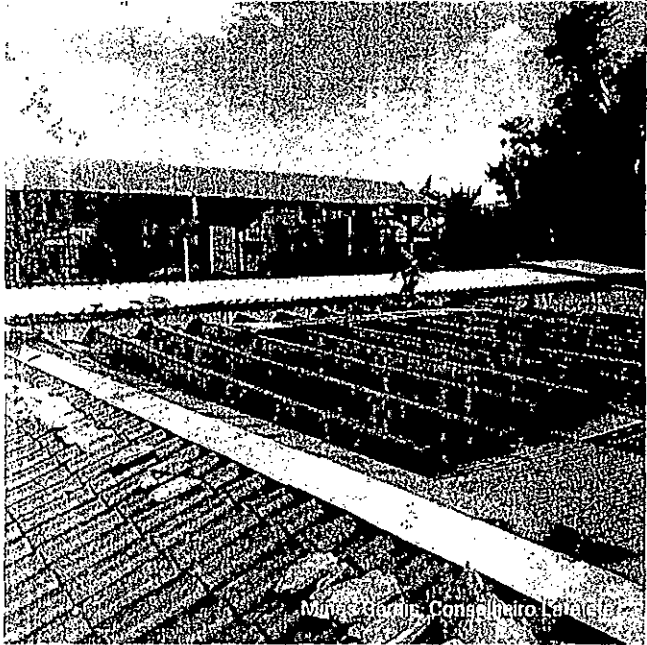Fotos (9)	
	




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

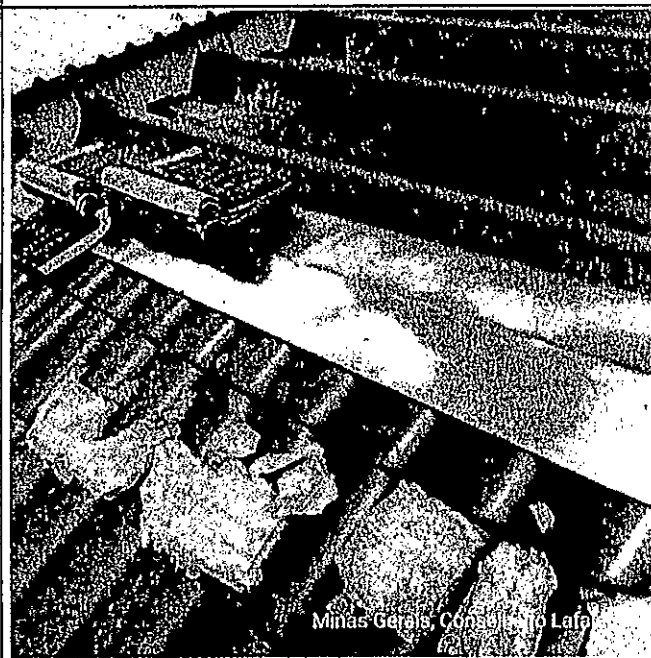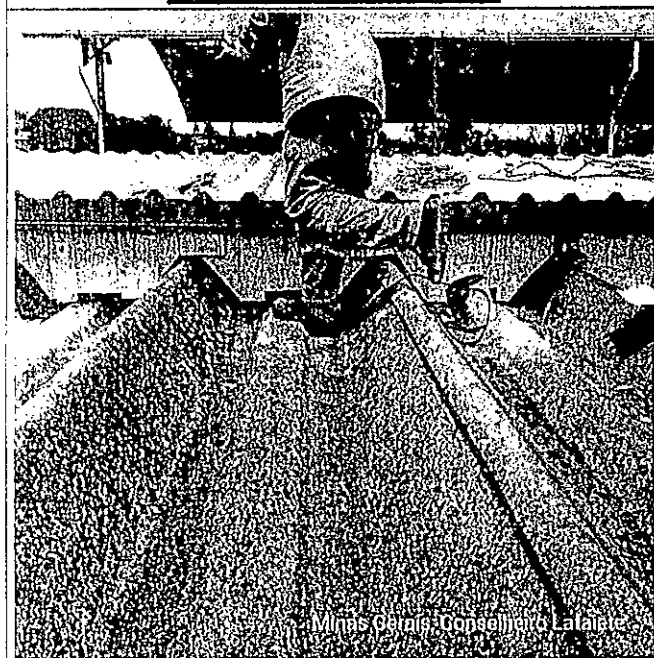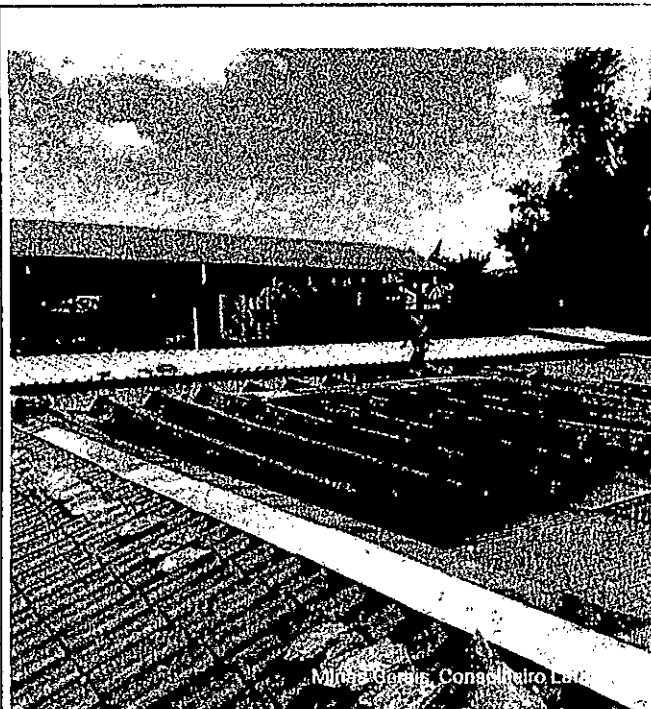

Q

Quf

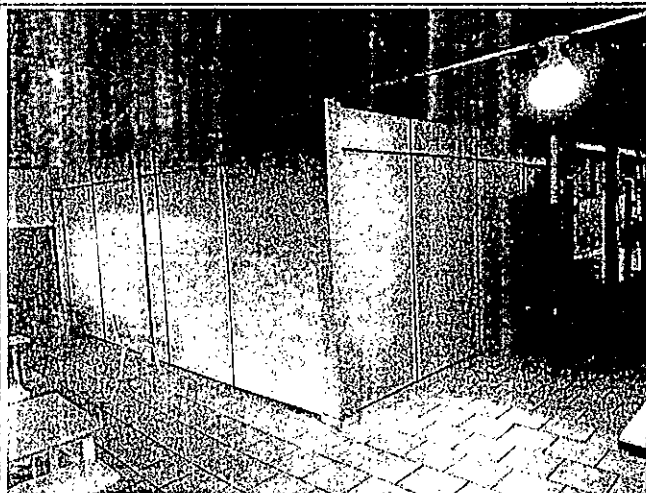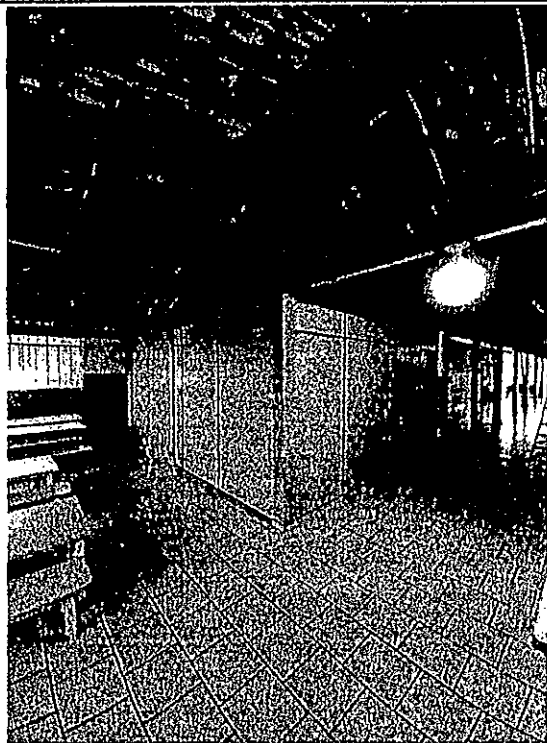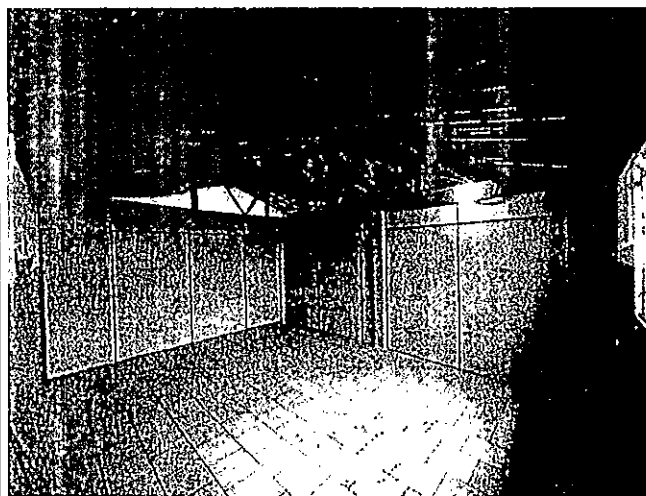

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000008
Emissão
08/03/2024 09:35:17
Código de Verificação
BF16-C61D

Informações do PrestadorNome/Razão Social: **CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA**CPF/CNPJ: **50.361.051/0001-17**Endereço: **ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO -**
CEP: **35498000**Município: **3135407 - JECEABA/MG**

Inscrição Municipal:

0000000000000004547

Inscrição Estadual:

Informações do TomadorNome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**CPF/CNPJ: **19.718.360/0001-51**Endereço: **AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO**
- CEP: **36400026**Município: **3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG**

E-mail:

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

Declaro que os materiais e serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 08/03/2024

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS

REPARO TELHADO ESCOLA JUQUITA VIEIRA

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 49.890,39
BASE DE CALCULO MATERIAIS : 116.410,91Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.069-0
Sicoob

Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade

Declaro que os materiais e serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.

Data 08/03/2024

Assinatura Legível Doc. Identidade

Assinatura Legível Doc. Identidade

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
166.301,30	166.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.301,30
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.





PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	08/03/2024	
NOME:	ESCOLA JUQUITA VIEIRA		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO				
Nº AE	675/2024		Nº NE:	1383/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	17/2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 188.301,3049	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:		R\$ 188.301,30
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIA FERNANDES:09252216600 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniele do Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 268.630/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Blitencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDICAO

NOME		CREME JUQUITA VIEIRA										
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CONTRATADO		ABROUADO LISBOA										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		02/2023										
REFERENCIAL		2023/08_SETOR_LESTE_COM_DESONERACAO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO										
N° AE		575/2024										
		N° ME 1383/2024										
ITEM	REF	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDICAO PERIODO	2ª MEDICAO PERIODO	3ª MEDICAO PERIODO	VALOR UNITARIO COM B.D.E. E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDICAO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLANHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	430,65	430,65			R\$ 21,14	R\$ 9.104,82	430,65	100,00%
2	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	1237,60	1237,60			R\$ 9,88	R\$ 12.228,63	1237,60	100,00%
3	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	480,00	480,00			R\$ 13,70	R\$ 6.575,99	480,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m	430,65	430,65			R\$ 120,51	R\$ 51.896,78	430,65	100,00%
5	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLANHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	193,00	0,00			R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	0,00%
6	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m²	193,00	0,00			R\$ 120,51	R\$ 0,00	0,00	0,00%
7	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	227,22	0,00			R\$ 13,70	R\$ 0,00	0,00	0,00%
8	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	956,48	0,00			R\$ 9,88	R\$ 0,00	0,00	0,00%
9	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPLANHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	216,00	0,00			R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	0,00%
10	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m²	216,00	0,00			RS 120,51	R\$ 0,00	0,00	0,00%
11	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	222,38	0,00			R\$ 13,70	R\$ 0,00	0,00	0,00%
12	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	606,98	0,00			R\$ 9,88	R\$ 0,00	0,00	0,00%

10/10/24

10/10/24

10/10/24

ITEM	REF	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM IPI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
13	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	180,00	180,00			R\$ 21,14	R\$ 3.805,57	180,00	100,00%
14	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMIKA	m²	180,00	180,00			R\$ 120,51	R\$ 21.691,44	180,00	100,00%
15	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	131,61	131,61			R\$ 13,70	R\$ 1.803,05	131,61	100,00%
16	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	351,02	351,02			R\$ 9,88	R\$ 3.488,40	351,02	100,00%
17	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	256,50	256,50			R\$ 21,14	R\$ 5.422,93	256,50	100,00%
18	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMIKA	m²	256,50	256,50			R\$ 120,51	R\$ 30.910,31	256,50	100,00%
19	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	240,00	240,00			R\$ 13,70	R\$ 3.287,99	240,00	100,00%
20	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	663,80	663,80			R\$ 9,88	R\$ 6.558,95	663,80	100,00%
21	SEINFRA	ED-48412	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA, EM PARAJU, DIMENSÃO (12X8)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	256,50	256,50			R\$ 37,22	R\$ 9.546,45	256,50	100,00%
SUBTOTAL:										R\$ 166.301,30		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 166.301,30		
PERCENTUAL EXECUTADO:										67,65%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:										R\$ 245.844,11		
SALDO										R\$ 79.542,80		

FISCALIZAÇÃO:

Luisa Silva
Engenheira Civil

CONTRATADA:
Hudson Dalmo Faria Fernandes
DES:0023
2216600
Assinado de forma digital por Hudson Dalmo Faria Fernandes em 18/05/2024 15:14:25 -03'31'32"Z
ID: 201151-0170

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Daniele de Oliveira Silva
Eng. Civil / GREC: 2565301D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/03/2024
Prof. Albano
Kildare Britencourt Dutra

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

JUQUITA VIEIRA

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

06/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. PERÍMETRO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO VÃO (m²)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	PESO (kg)	DENSIDADE (kg/m³) (t/m³)	DMT (Km)	QUANTIDADE (unit)	HORA (h)	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL													430,65	m³
	TELHADO 1													430,65	
2	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL													1.237,60	m³
	TELHADO 1													1.237,60	
3	CAIRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL													480,00	m³
	TELHADO 1													480,00	
4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA													430,65	m³
	TELHADO 1													430,65	
5	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL													430,65	m³
	TELHADO 2													430,65	
6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA													430,65	m³
	TELHADO 2													430,65	
7	CAIRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL													480,00	m³
	TELHADO 2													480,00	

isba

01

Amo

[illegible]

Willa


A handwritten signature, possibly reading "S. J.", written in black ink at the bottom left of the page.

Deu. 7.

ARROJADO LISBOA		Relatório nº	1
		Data do relatório	20/02/2024
		Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	
Obra	JUQUITA VIEIRA	Prazo contratual	11 dias
Local	LIMA DIAS	Prazo decorrido	2 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA
		Prazo a vencer	9 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADO 1	Em Andamento

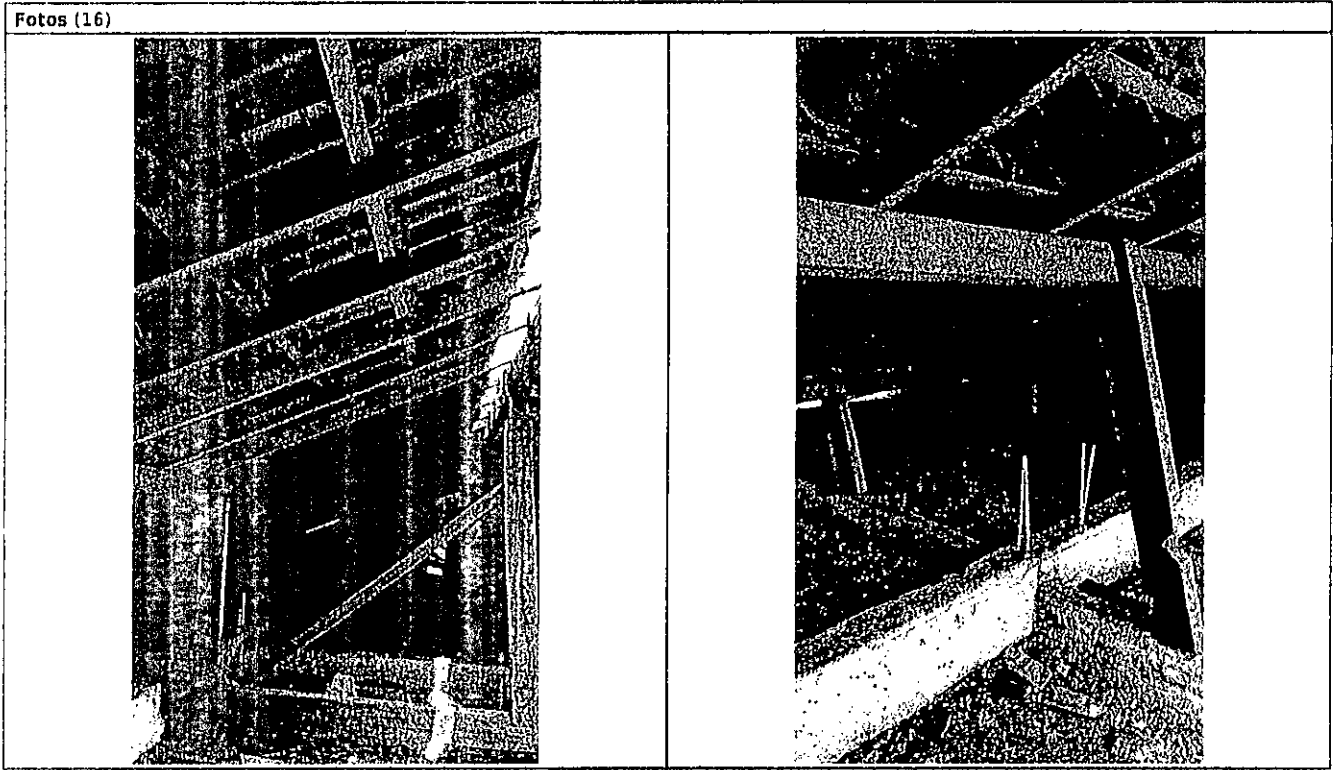



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

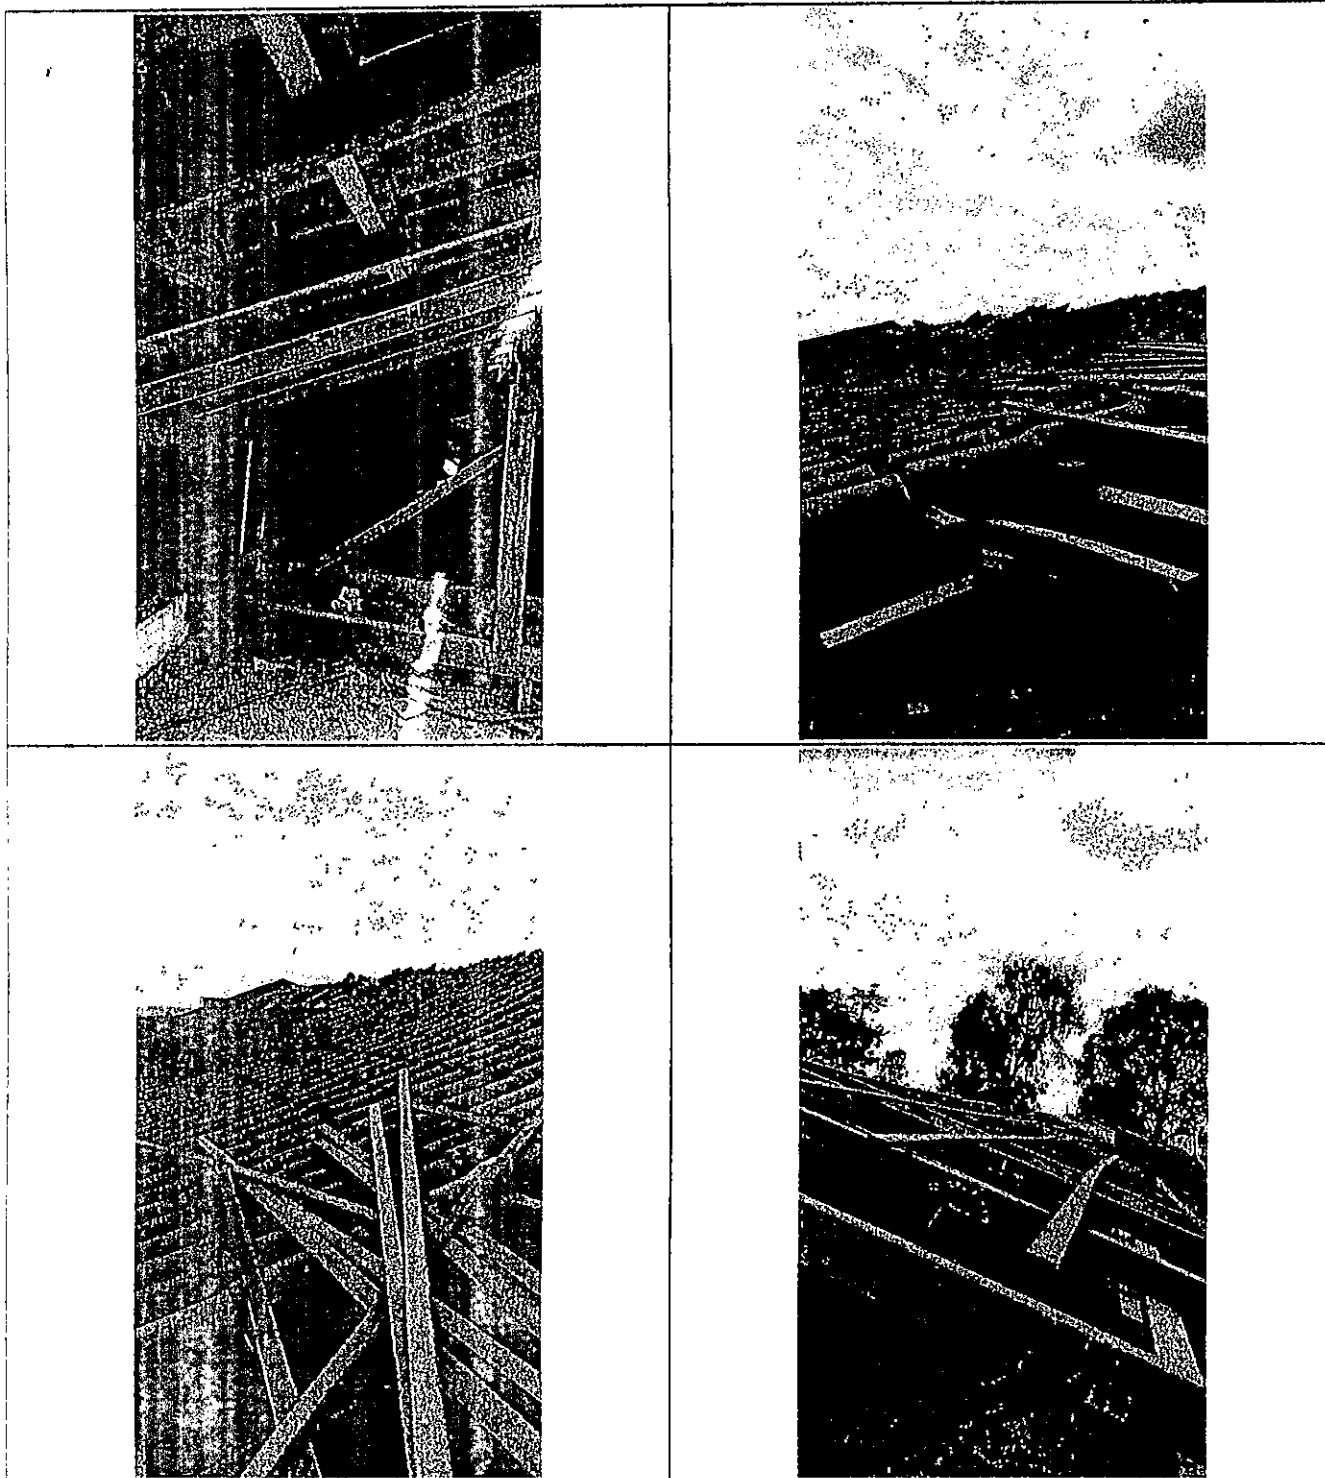


Q

20/02/2024

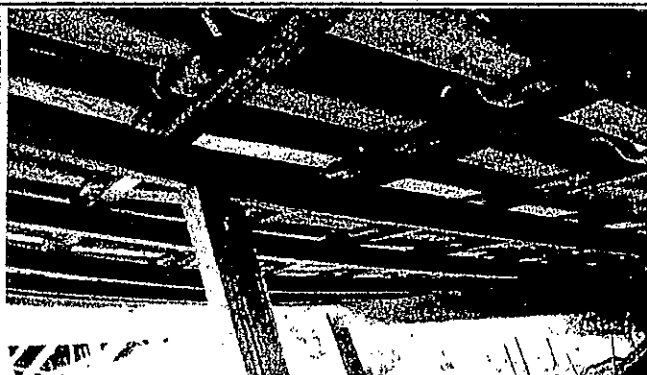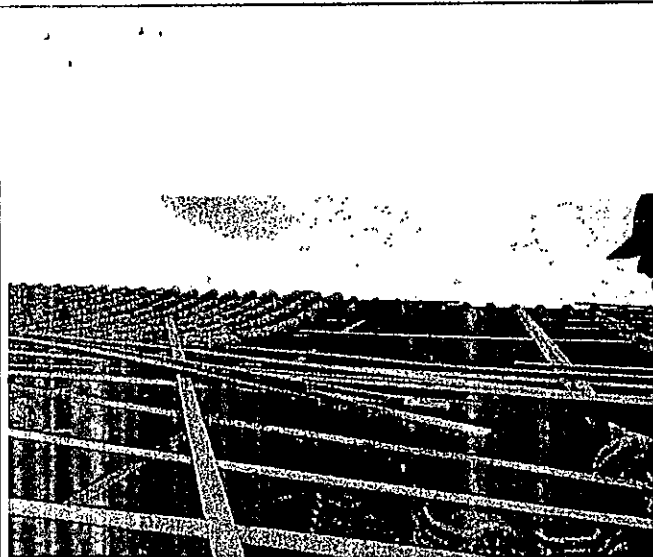

Q4

Q4

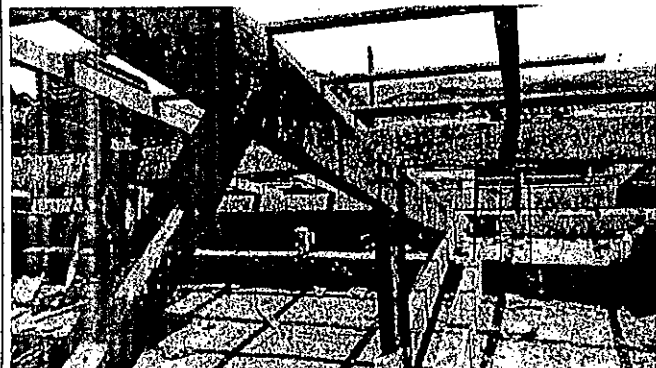


②

Prof

ARROJADO LISBOA				Relatório n°	2
				Data do relatório	21/03/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA	Prazo a vencer	-21 dias





Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

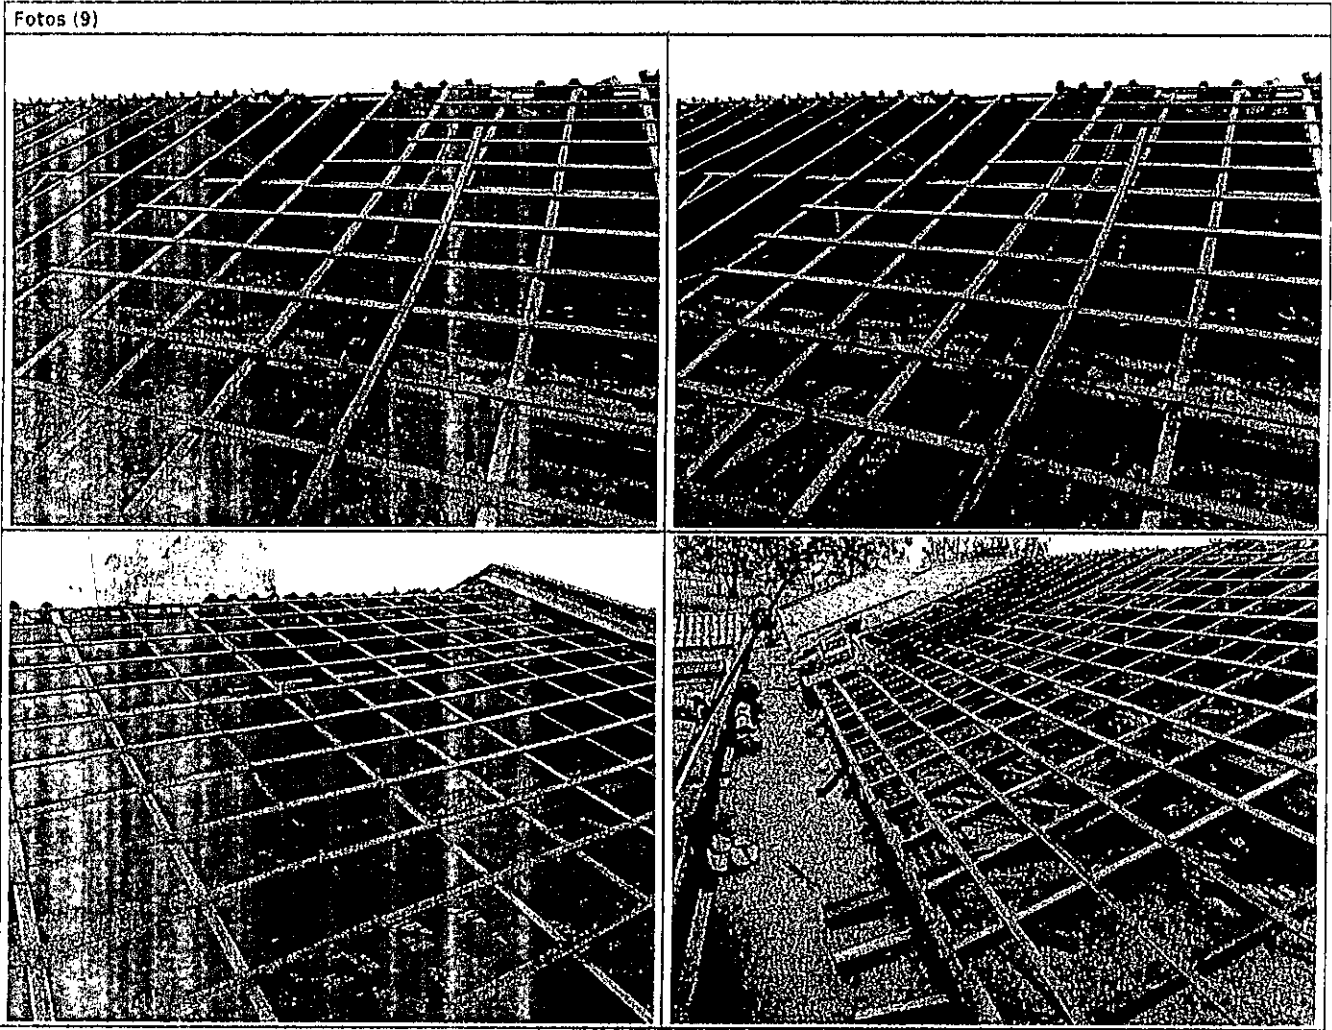

①

[Handwritten signature]

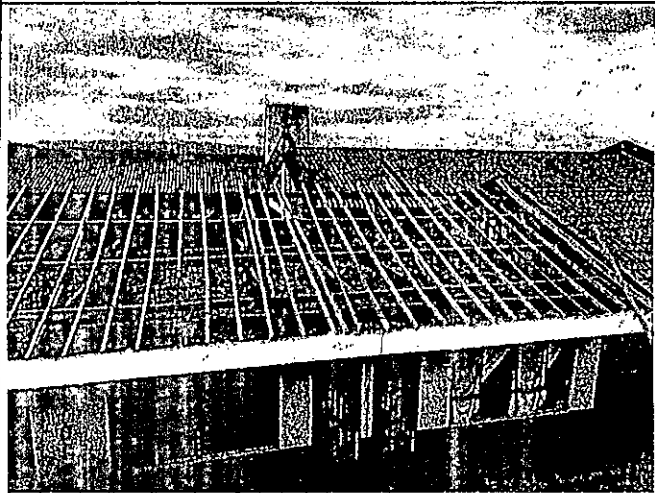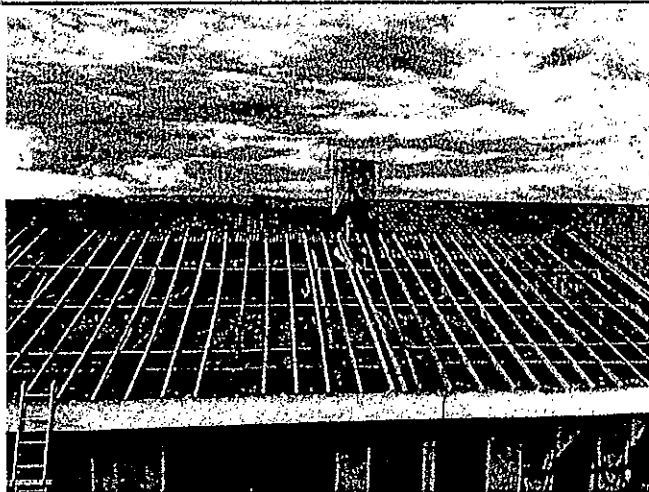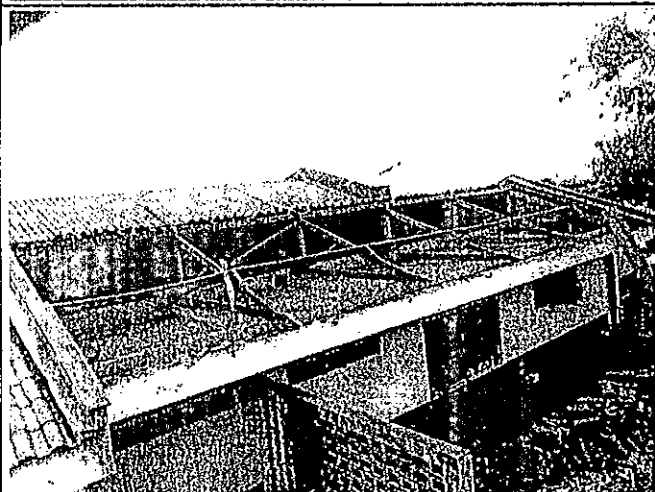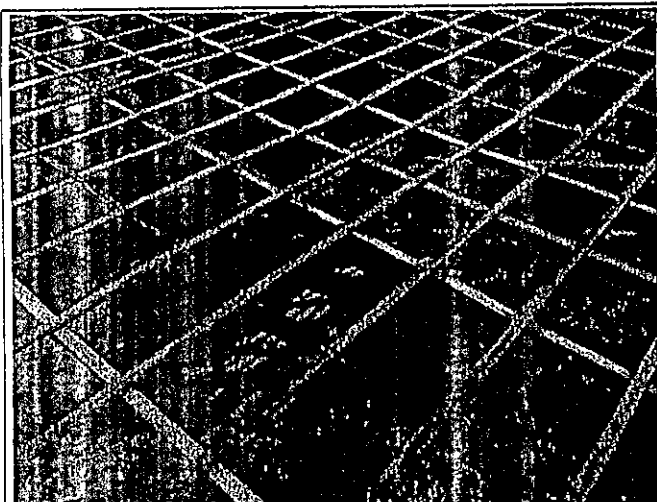

Q

Q




Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	3	
				Data do relatório	22/03/2024	
				Dia da semana	Sexta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias	
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA		Prazo a vencer	-22 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

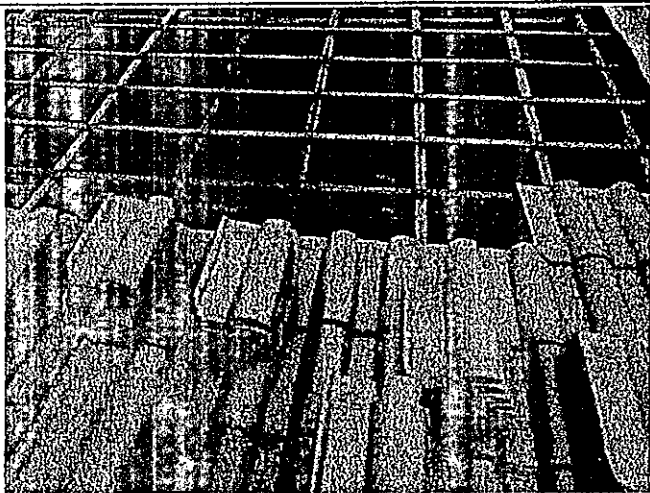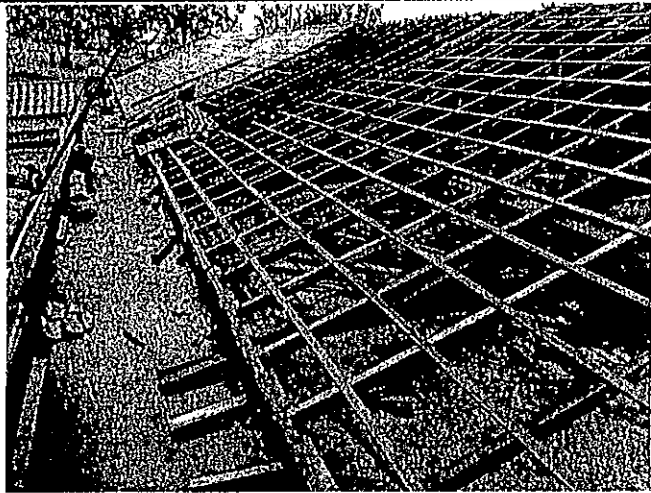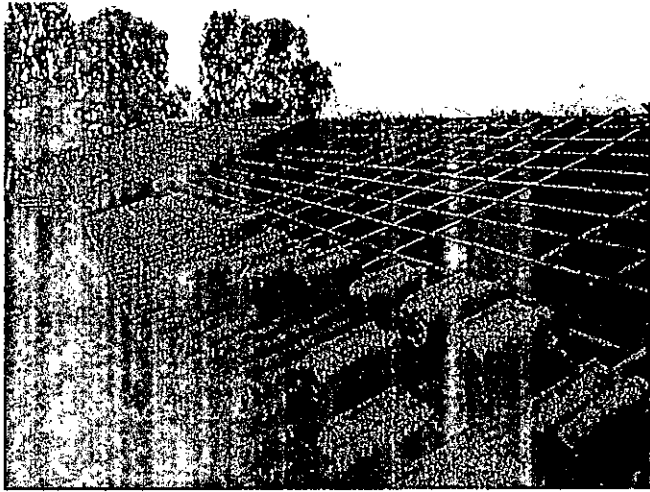Fotos (3)	
	
	







ARROJADO LISBOA				Relatório nº	4	
				Data do relatório	25/03/2024	
				Dia da semana	Segunda-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias	
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA		Prazo a vencer	-25 dias


Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☼ Claro	Praticável
Tarde	☼ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

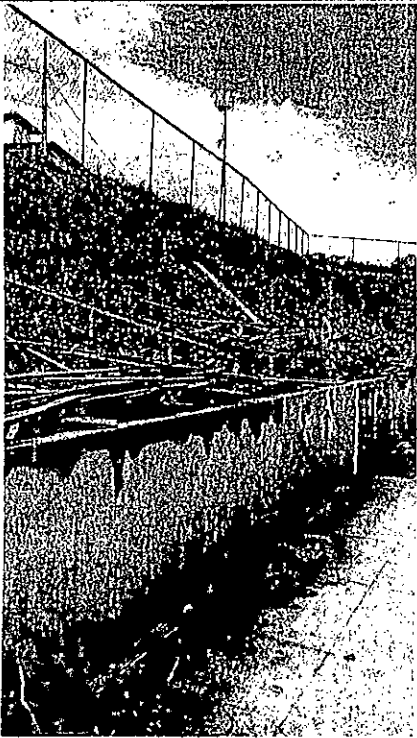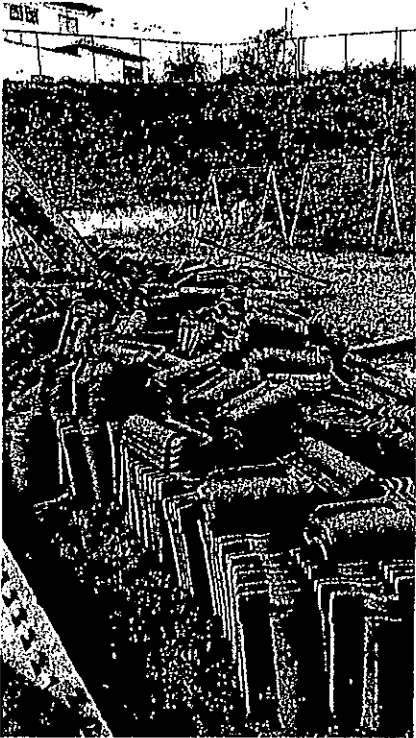Fotos (5)	
	

①

[Handwritten signature]

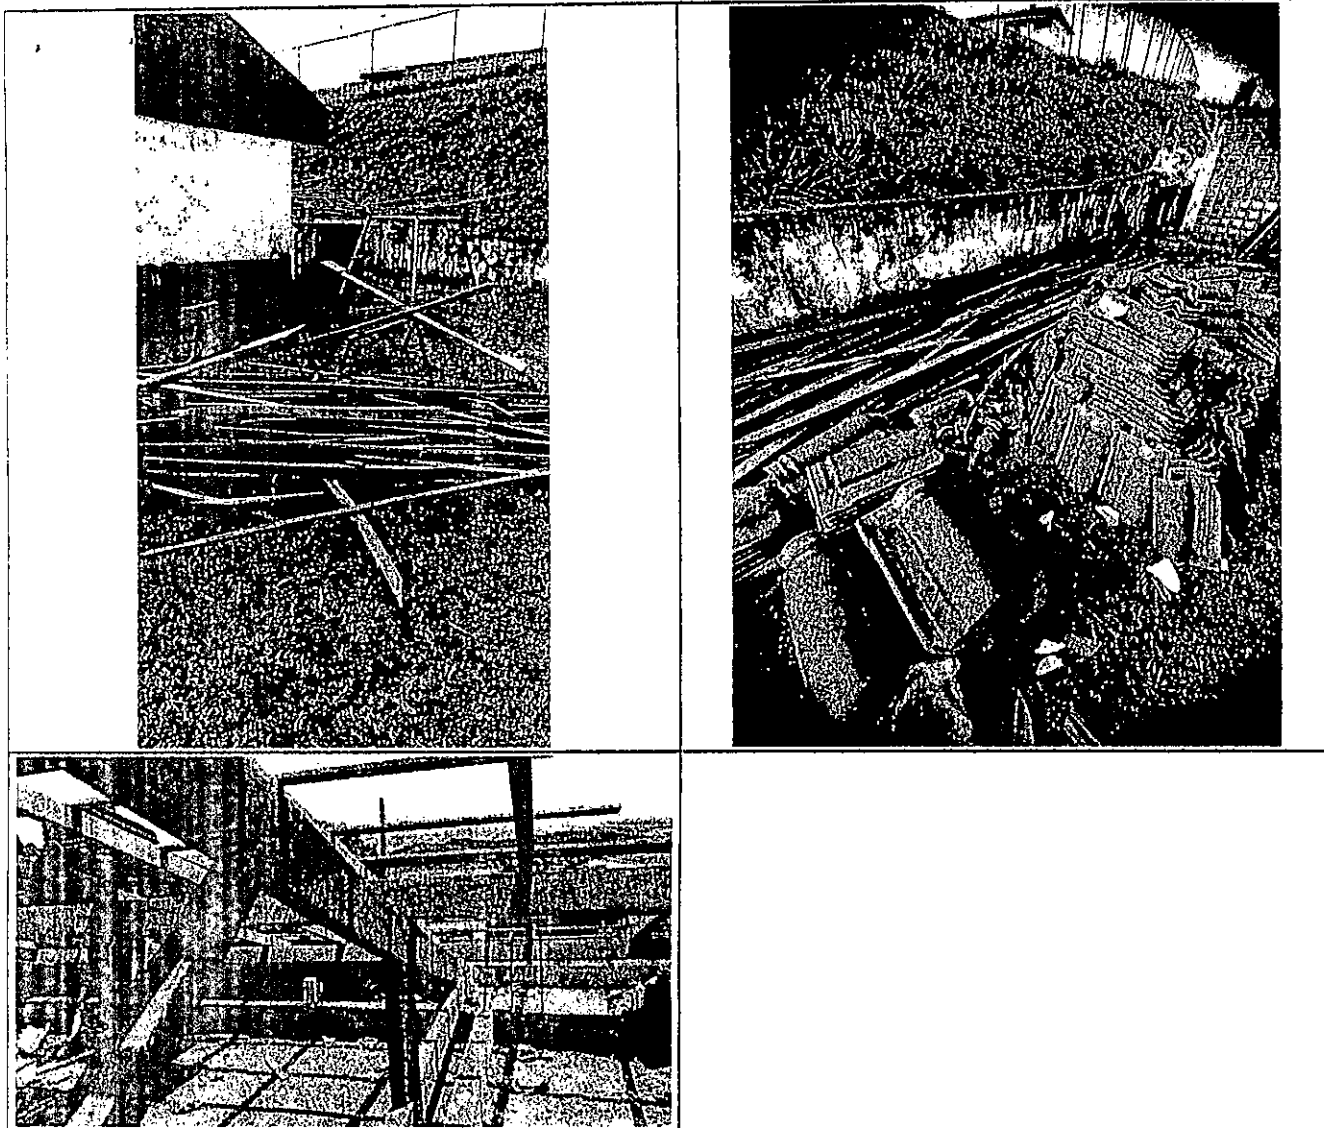

②

[Handwritten signature]


Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	5
				Data do relatório	26/03/2024
				Dia da semana	Terça-Felra
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA	Prazo a vencer	-26 dias





Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

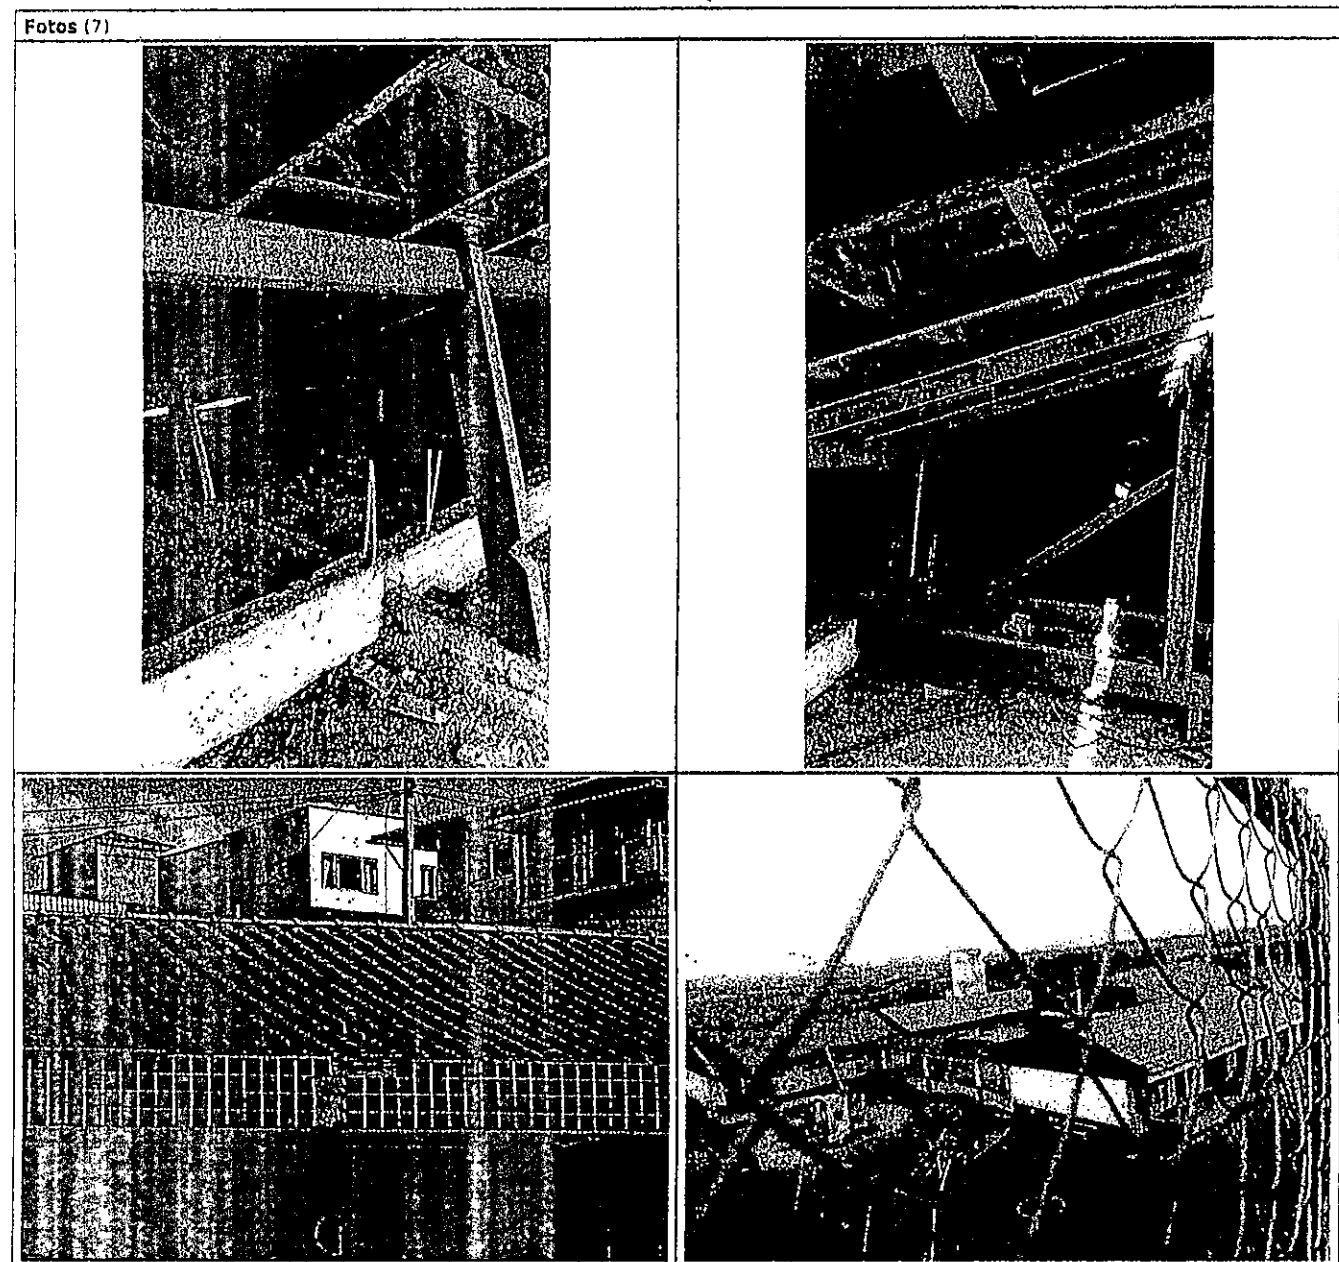

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

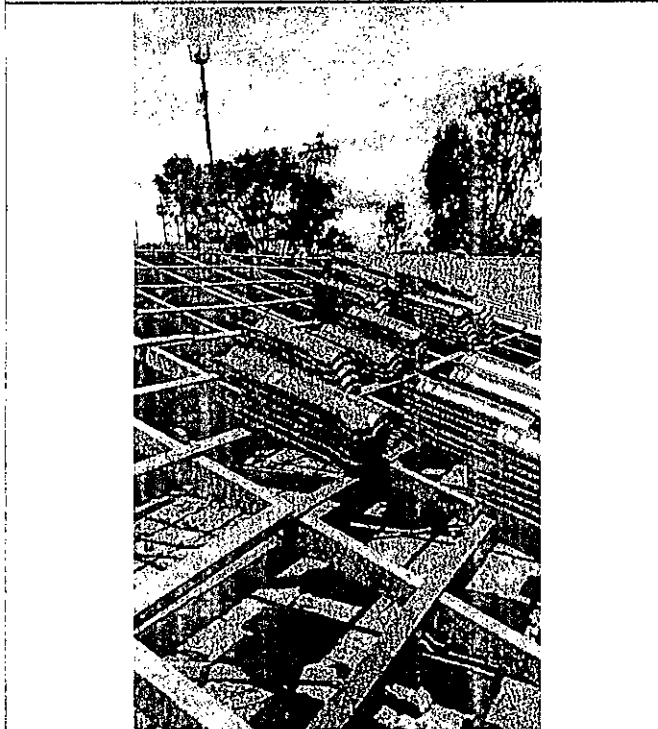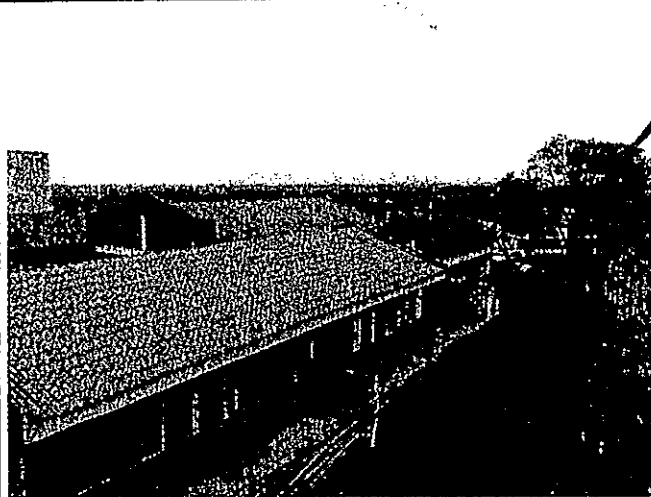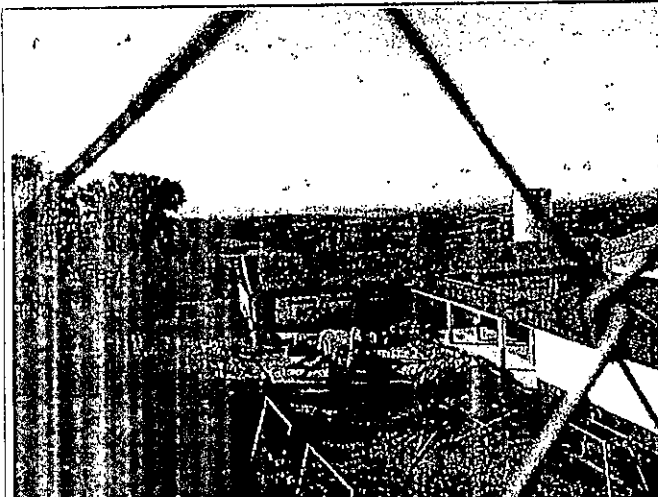

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000018
Emissão
27/03/2024 10:50:50
Código de Verificação
F1E9-A39A

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA**
CPF/CNPJ: **50.361.051/0001-17**
Endereço: **ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000**
Município: **3135407 - JECEABA/MG**

Inscrição Municipal: **0000000000000004547**
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE**
CPF/CNPJ: **19.718.360/0001-51**
Endereço: **AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO - CEP: 36400026**
Município: **3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG**
E-mail:

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO TELHADO ESCOLA JUQUITA VIEIRA 2 MEDIÇÃO

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 23.862,84
BASE DE CALCULO MATERIAIS : 55.679,96

Dados Bancários
Agência: 3116
C/C: 39.069-0
Sicob

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município
Data 03/04/2024
Luiza Liba 101684
Assinatura Legível Doc. Identidade
55644
Assinatura Legível Doc. Identidade

Reilly 03/04/24

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
79.542,80	79.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	GIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.542,80
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
01 - Exigível					0,00

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- Retido na Fonte pelo tomador.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(5,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Empenho 1583/2024

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, conferidos e aceitos, estando em condições satisfatórias para o Município.
Data 1 / 12 / 20
1290 ME8079935
Assinatura Legível Doc. Identidade Assinatura Legível Doc. Identidade



PLANILHA RESUMO DE 2ª MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	27/03/2024	
NOME:	ESCOLA JUQUITA VIEIRA		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO				
Nº AE	675/2024		Nº NE:	1383/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	17/2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 79.542,8003	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$ 79.542,80	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIA FERNANDES:09252216600 Assinatura eletrônica registrada em MDT/DF CNPJ nº 16.040.177/0001-00 Data de emissão: 27/03/2024 09:07 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniele da Silveira Silva Eng. Civil / CREA: 258.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Briencourt Dutra		 Albano Tibúrcio	



PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME:		CREMEI JUQUITA VIEIRA										
SETOR RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CONTRATADO		ARROJADO LISBOA										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023										
REFERÊNCIA:		2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MIG_DESONERADO										
N° AE		675/2024										
		N° NE 1383/2024										
ITEM	REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	430,65	430,65	0,00		R\$ 21,14	R\$ 0,00	430,65	100,00%
2	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	1237,60	1237,60	0,00		R\$ 9,88	R\$ 0,00	1237,60	100,00%
3	SEINFRA	ED-48414	CABRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	480,00	480,00	0,00		R\$ 13,70	R\$ 0,00	480,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m	430,65	430,65	0,00		RS 120,51	R\$ 0,00	430,65	100,00%
5	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	193,00	0,00	193,00		R\$ 21,14	R\$ 4.080,41	193,00	100,00%
6	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m²	193,00	0,00	193,00		RS 120,51	R\$ 23.258,05	193,00	100,00%
7	SEINFRA	ED-48414	CABRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	227,22	0,00	227,22		R\$ 13,70	RS 3.112,91	227,22	100,00%
8	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	956,48	0,00	956,48		RS 9,88	R\$ 9.450,90	956,48	100,00%
9	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	216,00	0,00	216,00		RS 21,14	R\$ 4.566,68	216,00	100,00%
10	SEINFRA	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA	m²	216,00	0,00	216,00		RS 120,51	R\$ 26.029,73	216,00	100,00%
11	SEINFRA	ED-48414	CABRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	222,38	0,00	222,38		RS 13,70	R\$ 3.046,60	222,38	100,00%
12	SEINFRA	ED-48415	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	606,98	0,00	606,98		RS 9,88	R\$ 5.997,52	606,98	100,00%

Idalva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA DE EDUCACAO

JUQUITA VIEIRA

MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRICAO	OBSERVACAO	COMP./ PERIMETRO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO VAO (m2)	AREA (m2)	VOLUME (m3)	PESO (kg)	DENSIDADE (kg/m3) (t/m3)	DMT (KM)	QUANTIDADE (unit)	HORA h	TOTAL GERAL	UNIDADE
1	REMOCAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL														m3
	TELHADO 1														
2	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL														m3
	TELHADO 1														
3	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL														m3
	TELHADO 1														
4	COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL INCLUSIVE FIXACAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA														m3
	TELHADO 1														
5	REMOCAO MANUAL DE TELHA CERAMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITAVEL													0,0000	m3
	TELHADO 2													193,00	
6	COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL INCLUSIVE FIXACAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TERMICA													193,0000	m3
	TELHADO 2													193,0000	
7	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL													227,22	m3
	TELHADO 2													227,2200	

27/03/2024

Wagner and

8	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL																		956,48	M3
	TELHADO 2																		956,4800	
9	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																		216,00	M3
	TELHADO 3																		216,0000	
10	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE TÉRMICA																		216,00	M3
	TELHADO 3																		216,0000	
11	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL																		222,38	M
	TELHADO 3																		222,3800	
12	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL																		606,98	M
	TELHADO 3																		606,9800	
13	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			M
	TELHADO 4																			
14	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE TÉRMICA																			M
	TELHADO 4																			
15	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAJU, DIMENSÃO (7X4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL																			M
	TELHADO 4																			
16	RIPA DE MADEIRA, EM PARAJU, DIMENSÃO (4X1,5)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL																			M
	TELHADO 4																			
17	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL																			M
	TELHADO 5																			

Wiba

Wiba

[illegible]

Wish




ARROJADO LISBOA				Relatório.n°	6	
				Data do relatório	18/03/2024	
				Dia da semana	Segunda-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias	
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA		Prazo a vencer	-18 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

Fotos (2)

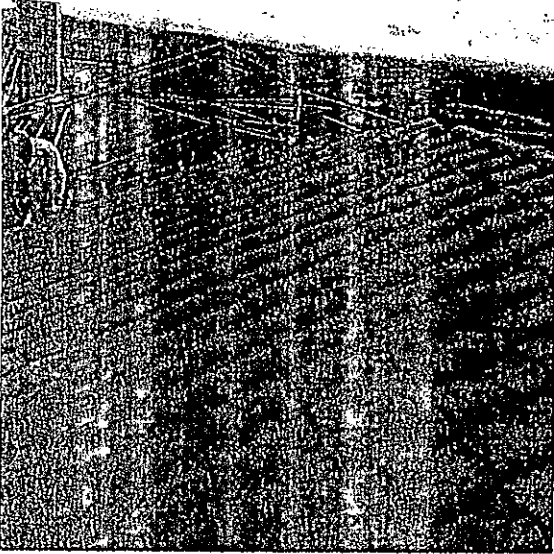





Assinatura



Assinatura


ARROJADO LISBOA				Relatório n°	7
				Data do relatório	19/03/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA	Prazo a vencer	19 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

Fotos (2)

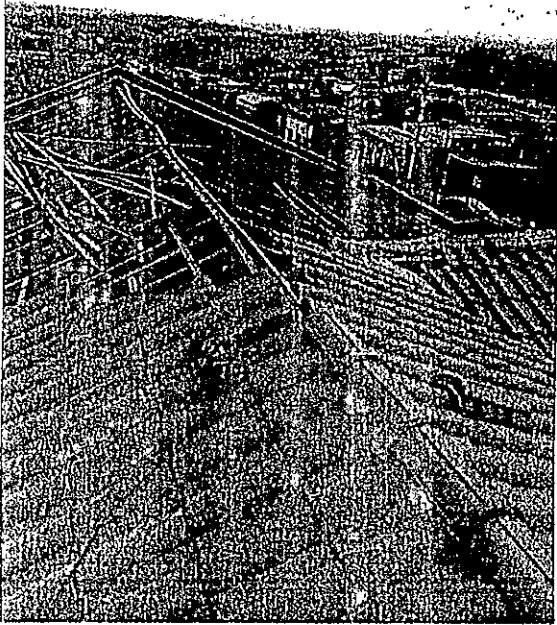

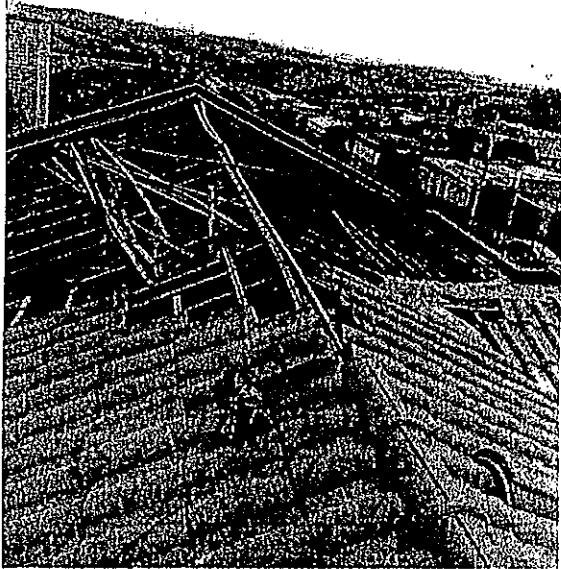




Assinatura


Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório.nº	8	
				Data do relatório	20/03/2024	
				Dia da semana	Quarta-Felra	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias	
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG,DANIELE SILVA		Prazo a vencer	-20 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☼ Claro	Praticável
Tarde	☼ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

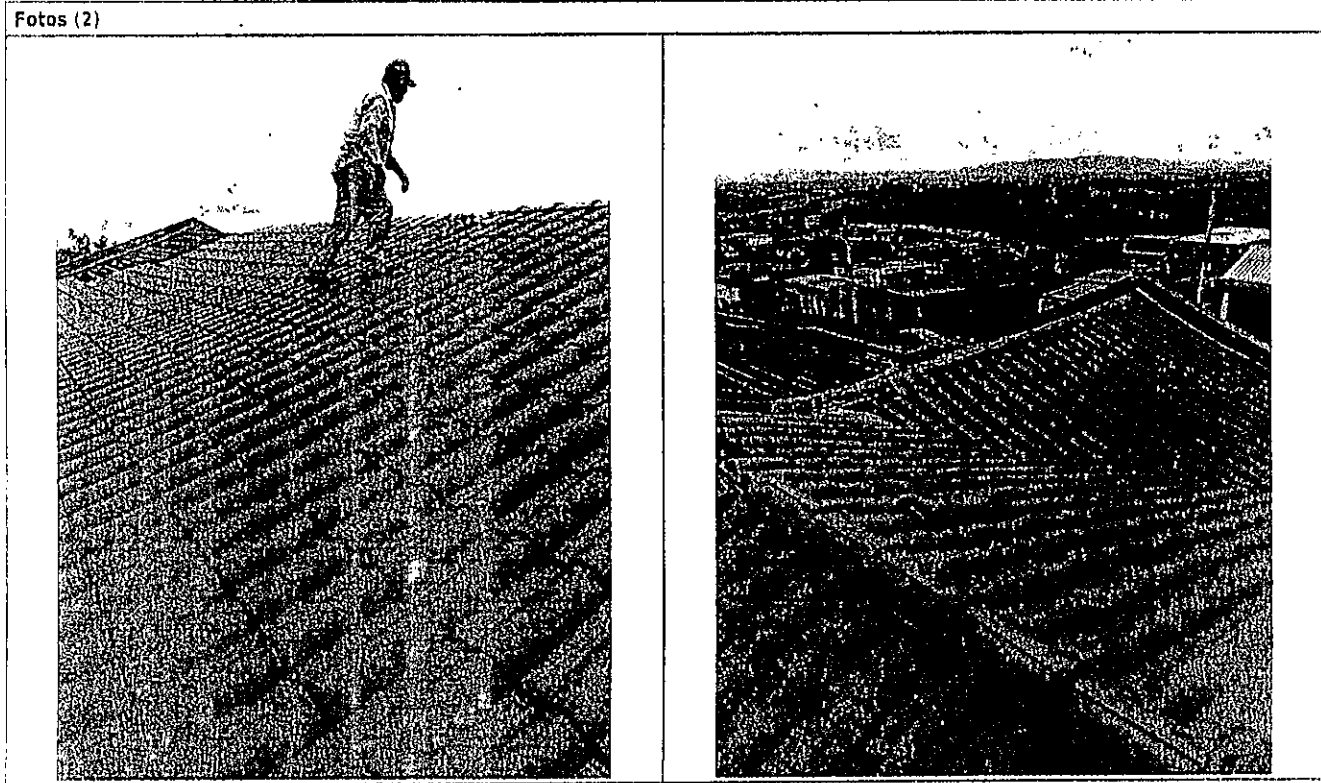

[Handwritten signature]


Assinatura

[Handwritten signature]
Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	9	
				Data do relatório	21/03/2024	
				Dia da semana	Quinta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias	
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA		Prazo a vencer	-21 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

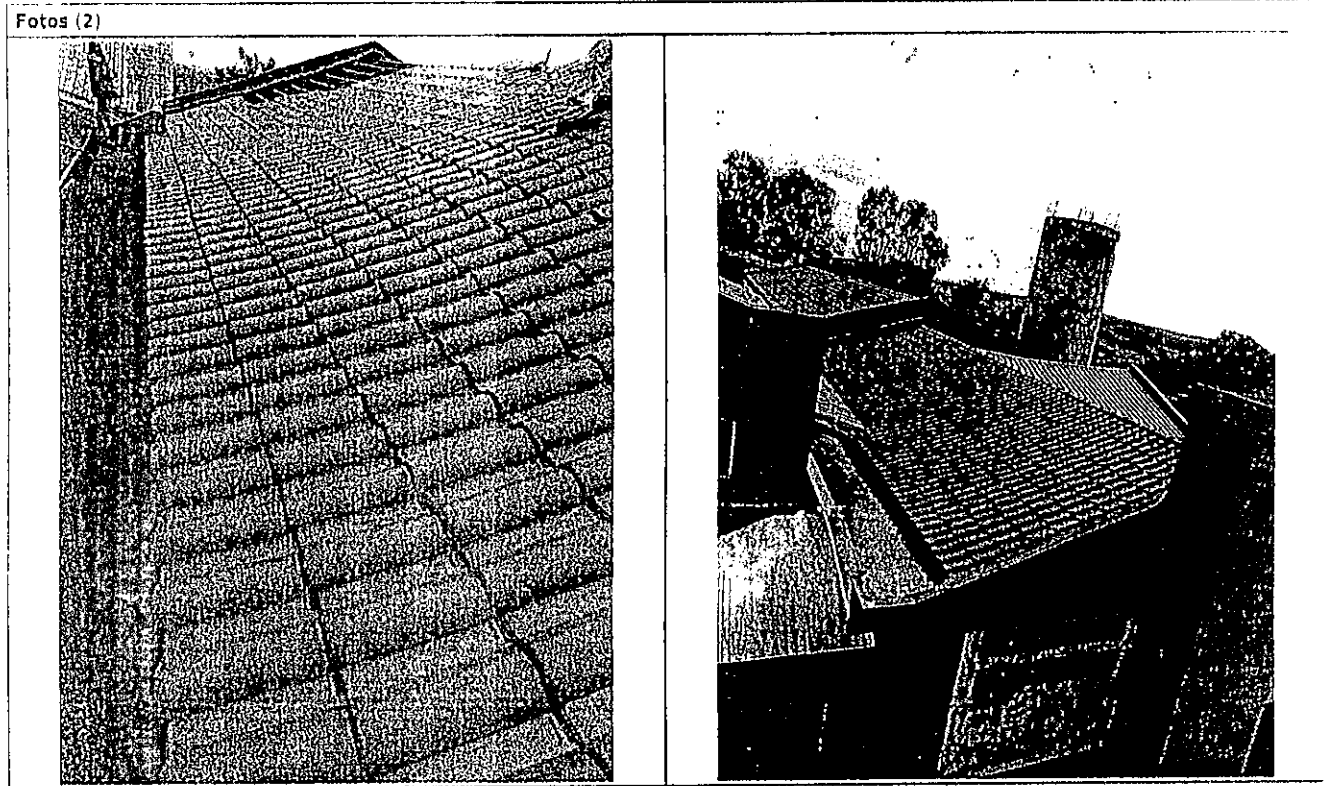

②

Assinatura

Assinatura



Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202400000000024
Emissão
08/05/2024 14:20:00
Código de Verificação
6E13-6F89

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA

CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17

Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000

Município: 3135407 - JECEABA/MG

Inscrição Municipal: 0000000000000004547

Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51

Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
- CEP: 36400026

Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

E-mail:

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA JUQUITA VIEIRA READEQUAÇÃO

BASE DE CALCULO MAO DE OBRA: 2.051,60

BASE DE CALCULO MATERIAIS : 4.787,08

Dados Bancários

Agência: 3116

C/C: 39.069-0

Bancoob

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos, contidos e aceitos, sob as condições substanciais para o pagamento.

Data: 09/05/2024

Assinatura Legível: Jairo César da Silva Moraes

Doc. Identidade: 51644

Assinatura Legível: Jairo César da Silva Moraes

Doc. Identidade: 51644

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

For dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
6.838,69	6.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
IS	PI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,69
Exigibilidade do ISS - Exigível					Valor do ISS
					0,00

Informações Adicionais

Contribuinte optante pelo simples nacional.

Retido na Fonte pelo tomador.

de 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que uenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(5,00 %) + PIS: 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00

o contribuinte pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.






Assinatura
13/05/24

Recebido
10/05/24



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	08/05/2024	
NOME:	ESCOLA JUQUITA VIEIRA		BDI:	25,92%	
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%	
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%	
OBJETO:	REPARO INTERNO E READEQUAÇÃO DE PARTES DO TELHADO				
Nº AE	1334/2024		Nº NE:	2984/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEN DE SERVIÇO	65/2024	
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA).	1,0000	R\$ 6.838,6945	
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000	
			TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 6.838,69	
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:		RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIAS CPF: 09252116600 Insc. Est. 001.123.456-78 Insc. Prof. 000.000.000-00 Construtora Arrojado Lisboa LTDA		 Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 258.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:		SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildere Blomcourt Dutra		 Albano Tibúrcio	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NOME: **CRÊMEI JUQUITA VIEIRA**

SETOR RESPONSÁVEL: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

CONTRATADO: **ARROJADO LISBOA**

ATA REGISTRO DE PREÇO: **029/2023**

REFERÊNCIA: **2023/08 SETOR LESTE, COM DESONERAÇÃO**

Nº AE: **2023/11 SINAPI MG DESONERADO**

1334/2024

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIÇÕES			VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
					QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:				
1	SEINFRA	ED-48414	CABELO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAU, DIMENSÃO (7x4)CM, INCLUSIVE ICAMAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	12,00	12,00		R\$ 13,70	R\$ 164,40	12,00	100,00%
2	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m²	1435,00	0,00		R\$ 13,92	R\$ 0,00	0,00	0,00%
3	SEINFRA	ED-28438	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO INVELADOR E MASSA ACRILICA	m²	1435,00	0,00		R\$ 19,32	R\$ 0,00	0,00	0,00%
4	SEINFRA	ED-48417	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	77,00	77,00		R\$ 47,43	R\$ 3.651,99	77,00	100,00%
5	SEINFRA	ED-48400	CUNEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m²	94,00	94,00		R\$ 32,15	R\$ 3.022,31	94,00	100,00%
6	SEINFRA	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m²	957,00	0,00		R\$ 15,44	R\$ 0,00	0,00	0,00%
7	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	2870,00	0,00		R\$ 6,21	R\$ 0,00	0,00	0,00%
8	SEINFRA	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	957,00	0,00		R\$ 7,75	R\$ 0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL:									R\$ 6.838,69	0,00	0,00%
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:									R\$ 6.838,69		
PERCENTUAL EXECUTADO:									7,23%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO:									R\$ 94.558,16		
SALDO:									R\$ 87.719,47		

FISCALIZAÇÃO:

Luiza Silva
Engenheira Civil

SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:

Kildare Bittencourt Dura

CONTRATADA:

HUDSON DA SILVA PARA
FERNANDES 09032166
00

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Danielle de Oliveira Silva
Eng. Civil / CREB: 256530/D

08/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAYETE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

READEQUAÇÃO JUQUITA VIEIRA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES

08/05/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP./	LARGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	ÁREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	HORA	TOTAL GERAL	UNIDADE
			PERÍMETRO												
			(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m ²)	(m ³)	(kg)	(kg/m ³) (t/m ³)	(t/m)	(unit)	h		
1	CAIBRO DE MADEIRA PARA TELHADO, EM PARAUJ, DIMENSÃO (7x4)CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL.													12,00	m ²
	TELHADO													12,00	
2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)													-	M ²
	ÁREA INTERNA E EXTERNA													-	
3	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A OLEO													-	M ²
	ÁREA INTERNA E EXTERNA													-	
4	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO													77,00	M ²
	TELHADO													77,0000	
5	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO													94,00	M ²
	TELHADO													94,0000	
6	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)													-	M ²
	ÁREA INTERNA E EXTERNA													0,0000	

Medida

10

✓

0,0000

[illegible]

John




Def

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	7
				Data do relatório	19/03/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA	Prazo a vencer	-19 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS	Em Andamento

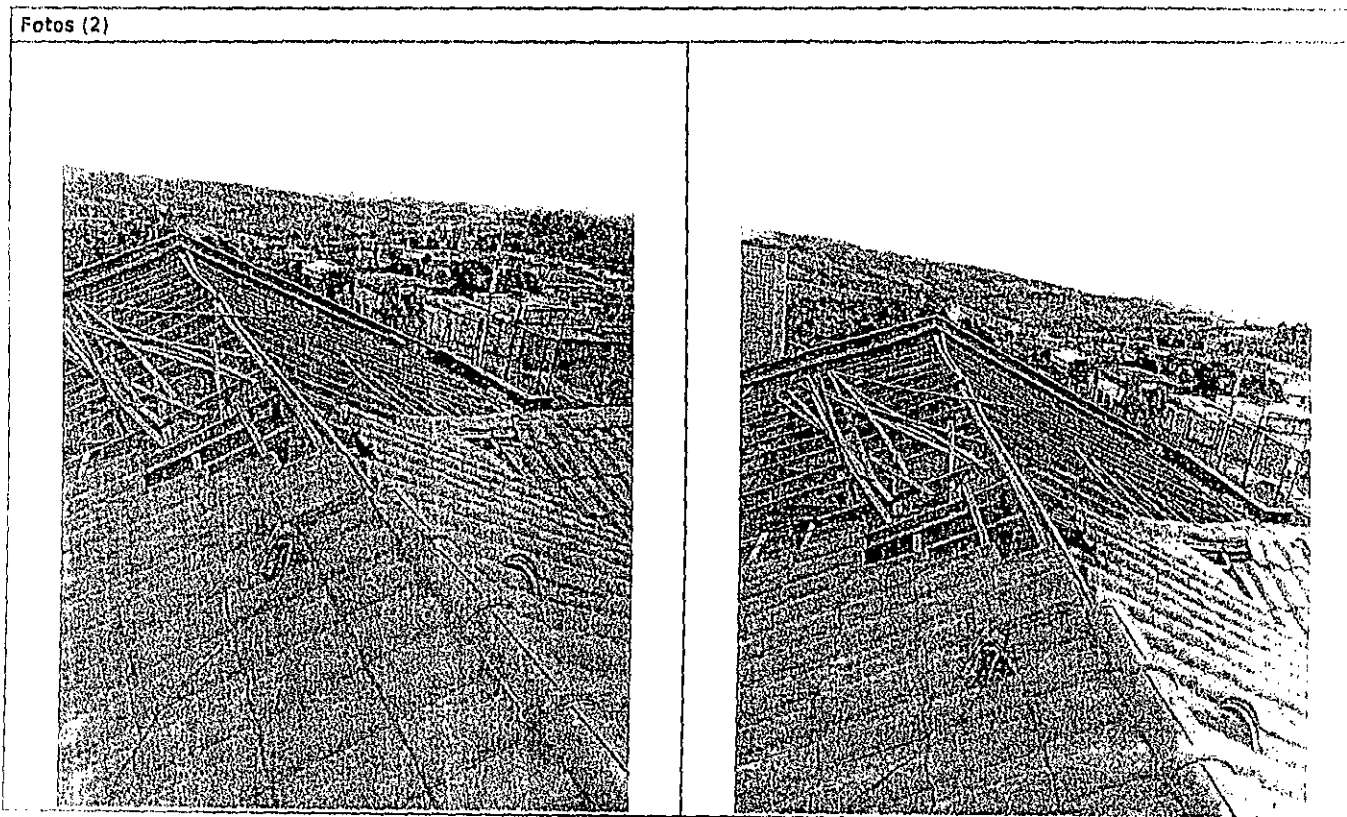

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA				Relatório nº	8	
				Data do relatório	20/03/2024	
				Dia da semana	Quarta-Feira	
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		
Obra	JUQUITA VIEIRA			Prazo contratual	11 dias	
Local	LIMA DIAS			Prazo decorrido	11 dias	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	ENG.DANIELE SILVA		Prazo a vencer	-20 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)

TELHADOS

Em Andamento

Fotos (2)

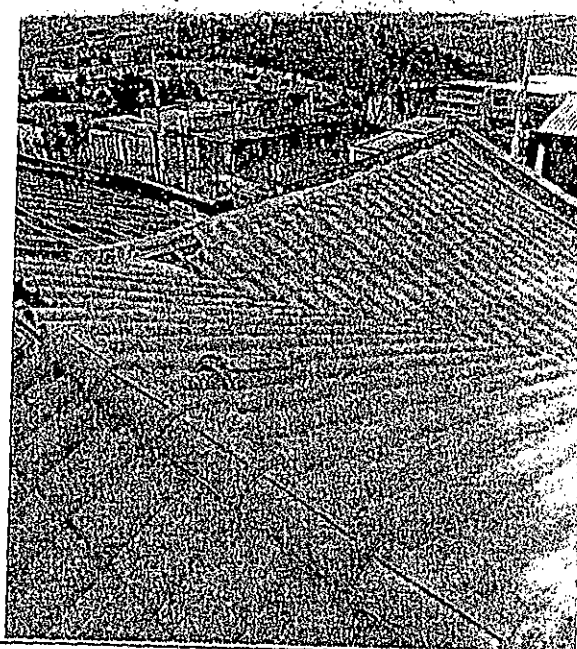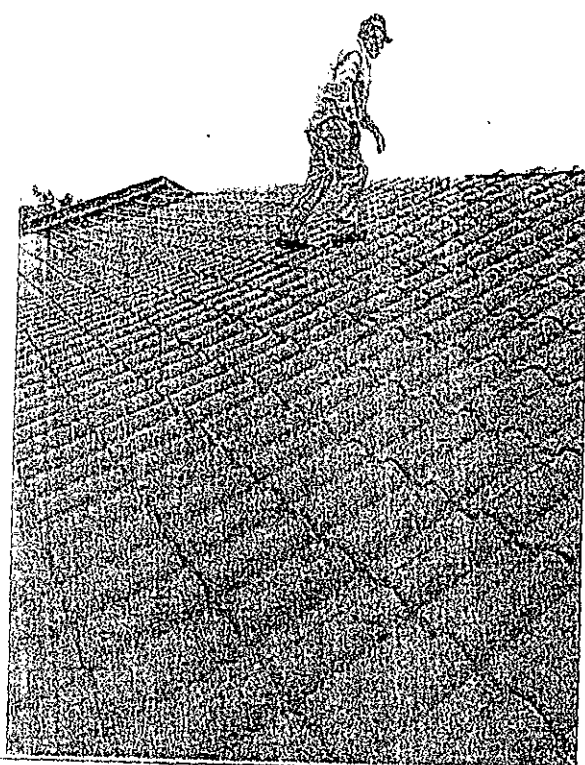

Q

[Handwritten signature]

Assinatura

Assinatura

ARROJADO LISBOA

Relatório nº 9
Data do relatório 21/03/2024
Dia da semana Quinta-Feira

Relatório Diário de Obra (RDO)

Obra	JUQUITA VIEIRA	Contrato	
Local	LIMA DIAS	Prazo contratual	11 dias
Contratante	PREFEITURA	Prazo decorrido	11 dias
Responsável	ENG.DANIELE SILVA	Prazo a vencer	21 dias



Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	* Claro	Praticável
Tarde	* Claro	Praticável

Atividades (1)

TELHADOS

Em Andamento

Fotos (2)

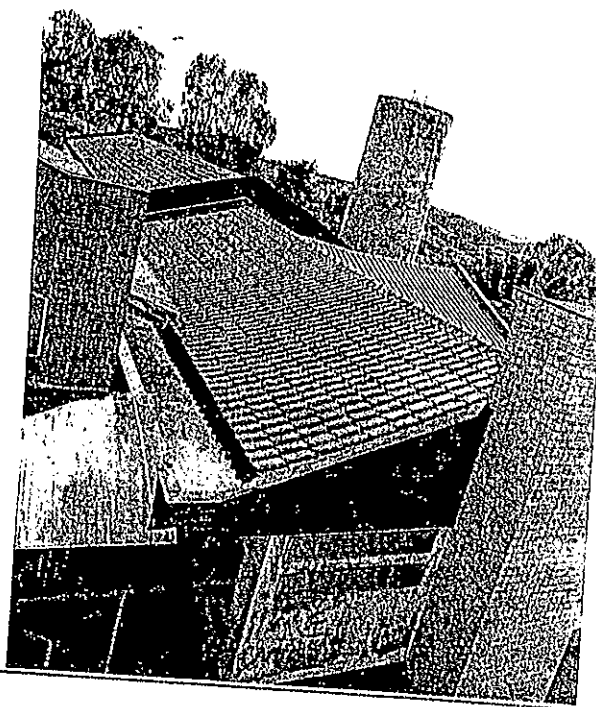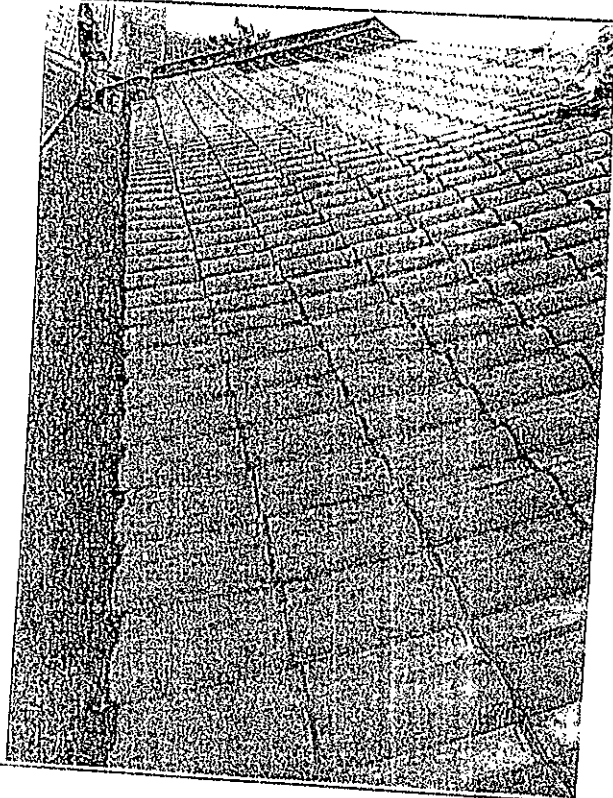

[Handwritten signature]

Assinatura

[Handwritten signature]

Assinatura

Prefeitura Municipal de Jeceaba
Departamento de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
2024000000000006
Emissão
28/02/2024 09:03:41
Código de Verificação
A12F-CF08

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA LTDA LTDA
CPF/CNPJ: 50.361.051/0001-17
Endereço: ENTRE RIOS DE MINAS 617 - CENTRO - CEP: 35498000
Município: 3135407 - JECEABA/MG

Inscrição Municipal: 0000000000000004547
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
CPF/CNPJ: 19.718.360/0001-51
Endereço: AV. PREF. MÁRIO RODRIGUES PEREIRA 10 - CENTRO
CEP: 36400026
Município: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
e-mail:

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE EMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PORCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE - DESONERADA) E TABELA DE PREÇOS INAPI (BASE MINAS GERAIS - DESONERADA).

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS.

REPARO ESCOLA MUNICIPAL RANCHO NOVO

VALOR DE CÁLCULO MÃO DE OBRA: 10.486,47
VALOR DE CÁLCULO MATERIAIS: 24.468,40

Depósitos Bancários
Conta: 3116
C/C: 39.069-0
2000

Declaro que os materiais/serviços foram
recebidos, conferidos e aceitos, estando em
condições satisfatórias para o Município

Data 29/02/2024
Assinatura Legível: Ruiza Silva Doc. Identidade: MG166.304.28
Assinatura Legível: [Assinatura] Doc. Identidade: 57485

Serviço Prestado

Cód. no Município: 1950 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

LC 116/2003: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

CNAE: 4120400 - Construção de edifícios

Município de Prestação do Serviço: 3118304 - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
34.954,87	34.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0,00	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,87
Totalidade do ISS Exigível					Valor do ISS
					0,00

Informações Adicionais

Contribuinte optante pelo simples nacional.
Retido na Fonte pelo tomador.
Em 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que incidem no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 0,00 = ISS: R\$ 0,00(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Kelly 04/03/24


68079934



PLANILHA RESUMO DE MEDIÇÃO

SETOR RESPONSÁVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DATA:	27/02/2024
NOME:	ESCOLA RANCHO NOVO		BDI:	25,92%
CONTRATADO:	CONSTRUTORA ARROJADO LISBOA		DESC. SINAPI:	25,45%
ATA REGISTRO DE PREÇO:	029/2023		DESC. SEINFRA:	21,58%
OBJETO:	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO			
Nº AE	264/2024	Nº NE:	589/2024	
REFERÊNCIA:	2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO		ORDEM DE SERVIÇO	04./2024
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS
1	SEINFRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SEINFRA (BASE REGIÃO LESTE – DESONERADA).	1,0000	R\$ 34.954,8720
2	SINAPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA, ADEQUAÇÕES E REPAROS QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS SINAPI (BASE MINAS GERAIS – DESONERADA).	1,0000	R\$ 0,0000
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:				R\$ 34.954,87
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICA:	
 Luísa Silva Engenheira Civil		HUDSON DALMO FARIAS FERNANDES.09252216000 Assinado em 27/02/2024 por 442104 Data de validade 16/07/2024 10:03:12 (UTC-0300) Certificado 32 2648124 09252216-02100	 Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256.530/D	
		SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS:	SECRETÁRIO MUNIC. DE EDUCAÇÃO:	
		 Kildare Bittencourt Dutra	 Albano Tibúrcio	

PLANILHA DE MEDIÇÃO



NOME DA OBRA:		ESCOLA RANCHO NOVO										
SETOR RES PONSÁVEL		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CONTRATADO		ARROJADO LUSBOA										
ATA REGISTRO DE PREÇO:		029/2023										
REFERÊNCIA:		2023/08_SETOP_LESTE_COM_DESONERAÇÃO 2023/11_SINAPI_MG_DESONERADO										
N° AE		264/2024										
		N° ME: 589/2024										
		MEDIÇÕES										
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	VALOR UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
1	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	M2	149,00	108,29	0,00		R\$ 64,07	R\$ 0,00	108,29	72,88%
2	SEINFRA	ED-50659	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	18,50	18,50	0,00		RS 116,69	RS 0,00	18,50	100,00%
3	SEINFRA	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00	0,00		RS 23,95	RS 0,00	8,00	100,00%
4	SEINFRA	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00	0,00		RS 19,77	RS 0,00	8,00	100,00%
5	SEINFRA	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	8,00	0,00		RS 24,43	RS 0,00	8,00	100,00%
6	SEINFRA	ED-48419	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M2	93,80	92,63	0,00		RS 88,56	RS 0,00	92,63	98,75%
7	SEINFRA	ED-48415	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M	300,00	300,00	0,00		RS 9,86	RS 0,00	300,00	100,00%
8	SEINFRA	ED-48412	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	M	127,00	127,00	0,00		RS 37,22	RS 0,00	127,00	100,00%
9	SEINFRA	ED-48414	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM	M	226,00	213,50	0,00		RS 13,70	RS 0,00	213,50	94,47%
10	SEINFRA	ED-50361	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208,00	208,00	0,00		RS 19,28	RS 0,00	208,00	100,00%
11	SEINFRA	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	104,00	0,00		RS 23,54	RS 0,00	104,00	100,00%
12	SEINFRA	ED-48457	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	93,80	92,63	0,00		RS 19,61	RS 0,00	92,63	98,75%
13	SEINFRA	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	93,80	92,63	0,00		RS 21,14	RS 0,00	92,63	98,75%

Handwritten signature and initials.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE LEVANTADA	1ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	2ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	3ª MEDIÇÃO - PERÍODO:	VALOR UNITÁRIO COM IPI E DESCONTO	VALOR TOTAL 1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	EXECUTADO (%)
27	SEINFRA	ED-49664	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	300,00	0,00	300,00		R\$ 25,49	R\$ 7.648,30	300,00	100,00%
28	SEINFRA	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	M2	20,00	20,00	0,00		R\$ 64,07	R\$ 0,00	20,00	100,00%
SUBTOTAL:										R\$ 34.954,87		
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:										R\$ 34.954,87		
PERCENTUAL EXECUTADO:										88,90%		
TOTAL GERAL DO LEVANTAMENTO										R\$ 96.850,68		
SALDO										R\$ 10.746,86		
FISCALIZAÇÃO:				CONTRATADA:				RESPONSÁVEL TÉCNICA:				
Luísa Silva Engenheiro Civil				HUDSON DALMO FARIA FERNANDES092522166 CPF: 02.025.221-66 Cadastrado em 21/09/2004 Cadastrado em 21/09/2004				Daniel de Oliveira Silva Eng. Civil / CREA: 256530/D				
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS:				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				27/02/2024				
Kildare Bittencourt Dutra				Prof. Albano								

ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	COMP. / PERIMETRO	LAGURA	ALTURA	DESCONTO VÃO	AREA	VOLUME	PESO	DENSIDADE	DMT	QUANTIDADE	PERCENTUAL / EMPOLAMENTO	TOTAL GERAL	UNIDADE
			(m)	(m)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(kg)	(kg/m3)	(KM)	(unh)	%		
1	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA													-	
	Sala 9		5,86	5,8500											
	Sala 7		5,86	5,8500			34,28							34,2810	
	Sala 8		5,86	5,8500			34,28							34,2810	
	Creche		5,86	5,8500			34,28							34,2810	
2	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL		1,00	5,4500			5,45							5,4500	
	TELHADO													-	
3	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													18,5900	
	REPARO JANELAS													-	
4	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													8,0000	
	REPARO JANELAS													-	
5	DESMONTAGEM ELETRIA													8,0000	
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES													-	
	DESMONTAGEM ELETRIA													8,0000	
6	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA													8,0000	
	TELHADO													-	
7	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM		3,25	28,5000			92,63							92,6250	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													-	
8	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM													0,0000	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													-	
9	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM													127,0000	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													-	
10	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		3,50									61,00		213,5000	
	AJUDANTES (2)													-	
11	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES											13,00		208,0000	
	REPARO ESCOLA RANCHO NOVO													-	
												13,00		104,0000	

10/10/2024

10/10/2024

10/10/2024

[illegible]

[illegible]


مکتبہ اسلامیہ







ARROJADO LISBOA				Relatório n°	12
				Data do relatório	30/01/2024
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	
Obra	ESCOLA RANCHO NOVO			Prazo contratual	19 dias
Local				Prazo decorrido	16 dias
Contratante		Responsável	ENG. DANIELE SILVA	Prazo a vencer	3 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Atividades (1)	
TELHADOS FINALIZADOS	Em Andamento

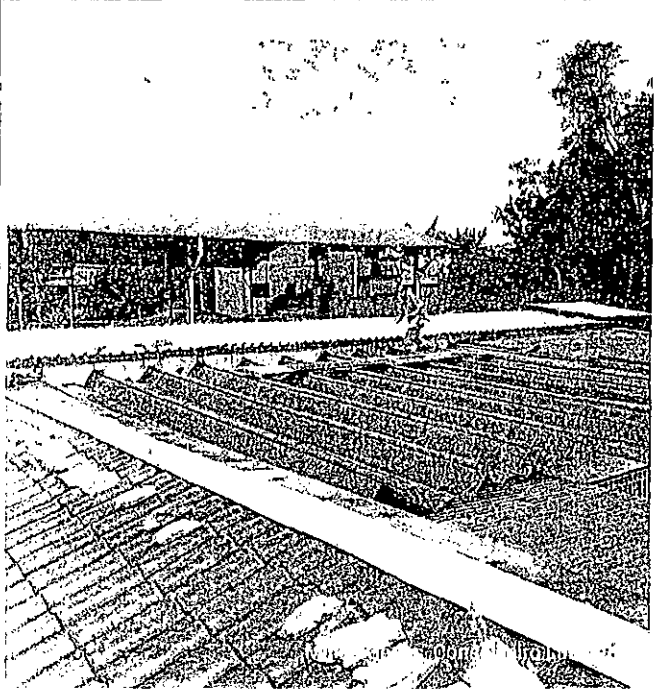Fotos (6)	
	

[Handwritten signature]

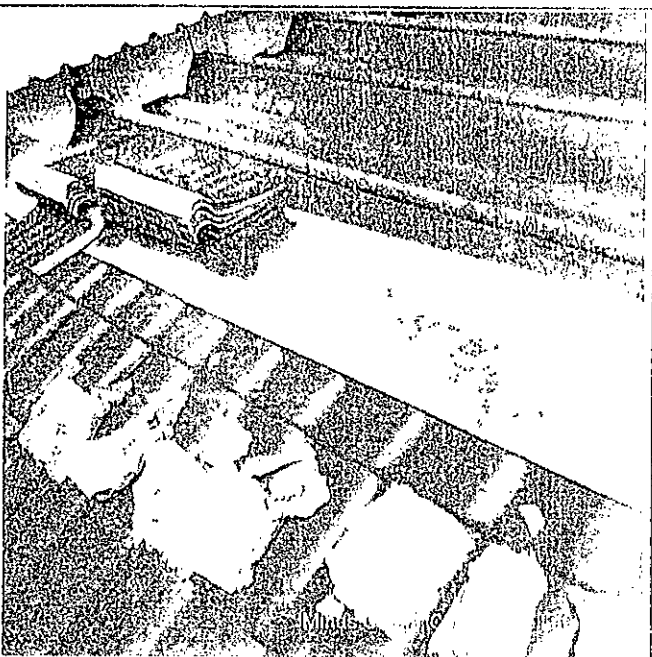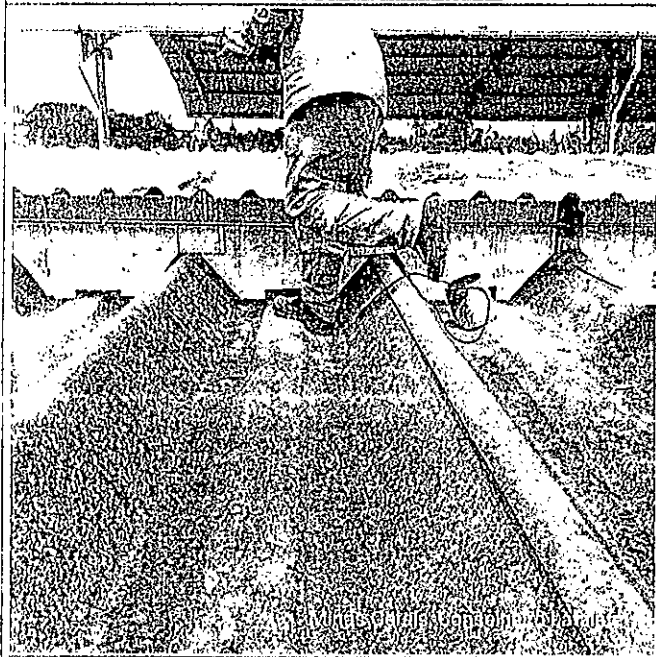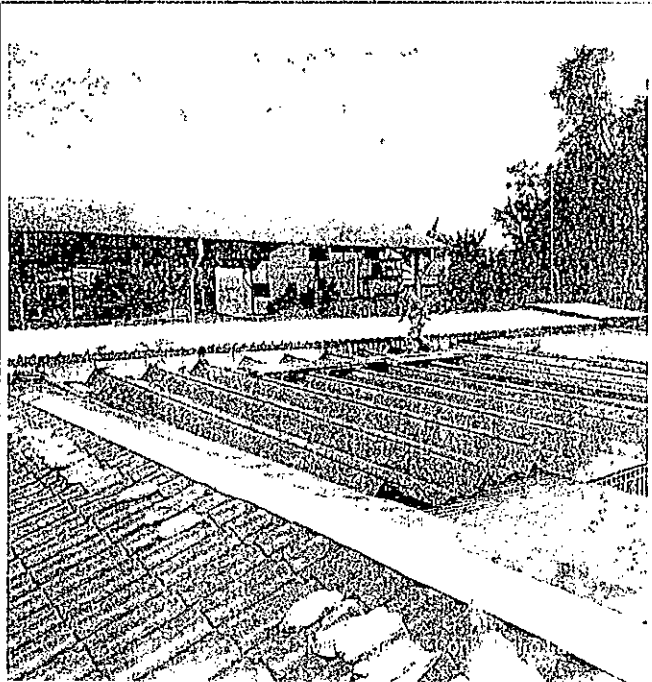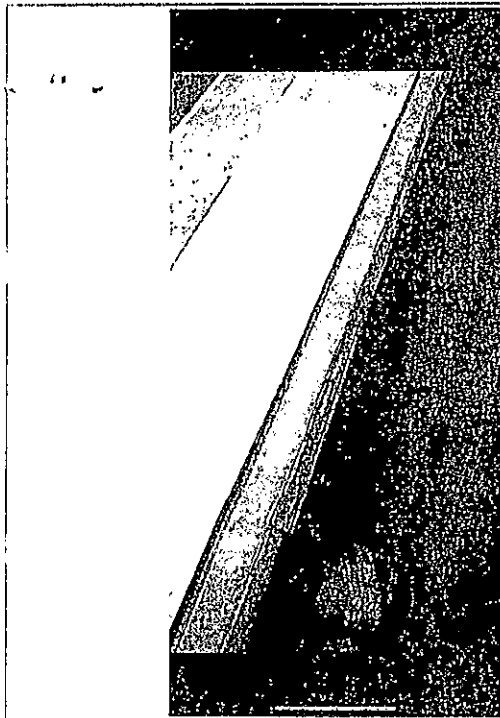

Handwritten signature
